



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
(1º Grupamento de Engenharia/1955)
GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES**



4ª MEDIÇÃO

Contratada Razão Social / CNPJ		Endereço completo – Dados de contato	
PLANENG ENGENHARIA LTDA. CNPJ 27.700.986/0001-69		Rua Jornalista Laurenio Firmeza, 82 - Centro, São José do Rio Peixe/PB	
Modalidade	Nº/Ano	NUP	
Tomada de Preços	1/2022	64278. 009322/2022-61	
Objeto		OM Beneficiária – Endereço – Localidade – UF	
REFORMA DO PAVILHÃO HAITI DO PARA RECEBER O GOI DO CMDO DO 1º GPT E		Cmdo 1ª Gpt E - Av. Eptácio Pessoa, 2205 - Tambauzinho, João Pessoa/PB	
Contrato nº / Ano / Data	Execução (90 dias) Conforme Ordem de Serviço nº 1/2022	Vigência (270 dias)	
12/2022	10/10/2022 até 07/01/2023	27/09/2022 até 24/06/2023	
Aditivo nº / Ano / Data	Prazo / Valor	Aditivo nº / Ano / Data	Prazo / Valor
01/2022	R\$61.724,55	-	-

2. DADOS DO PAGAMENTO


JNSC GEN
IM070M484

a) VALOR CONTRATADO: R\$	R\$ 175.667,97	DATA	21/09/2022
b) NOTA DE EMPENHO:	2022NE002854		
c) VALOR ADITIVO: R\$	R\$61.724,55		
d) VALOR EMPENHADO: R\$	R\$61.724,55		
e) NOTA DE EMPENHO ADITIVO:	2023NE000646		
e) NOTA FISCAL Nº 254	DATA DA EMISSÃO:	09/03/2023	
f) VALOR: R\$	68.886,47		

3. DADOS BANCÁRIOS

BANCO: 001	AGÊNCIA: 3165-8	C/C No: 25990-x
VALOR DA ETAPA: R\$68.886,47	ACUMULADO CONTRATADO: R\$175.667,97	SALDO CONTRATADO: R\$0,00
	ACUMULADO ADITIVO: R\$44.054,59	SALDO DO ADITIVO: R\$17.669,96


Aprovado - SOM/Comdo 1º Gpt E



Chefe da Seção de Obras Militares do Comandante do 1º Grupamento de Engenharia


Autorizo o pagamento:

10 de Setembro de 2022



Ordenador de Despesas do Comandante do 1º Grupamento de Engenharia

EM BRANCO



Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	4ª MEDIÇÃO	Quant. Medida	Rubrica	Custo Total
					com BDI	Total				
1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									412,42
1.1	TAXAS E IMPOSTOS									412,42
1.1.1	ART CONTRATO SUPERIOR A R\$ 15.000,00	UND	1	161,84	161,84	197,02				R\$0,00
1.1.2	ART SUPERIOR A R\$15.000,00	UN	3	58,98	176,94	197,02				R\$0,00
2	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS									20.337,11
2.1	PESSOAL									15.143,00
2.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	COT	100	124,39	12.439,00	151,43		20,00		R\$3.028,60
2.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									1.194,12
2.2.1	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS)	MXM ES	108	5,54	598,32	6,74				0,00
2.2.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF 11/2017	M	36	10,64	383,16	12,95				R\$0,00
2.3	TRANSPORTES									3.999,99
2.3.1	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO	UN	1	3.285,69	3.285,69	3.999,99		0,50		R\$2.000,00
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES									5.823,28
3.1	ENSAIOS E TESTES									695,22
3.1.1	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	UN	6	95,18	571,08	115,87				R\$0,00
3.2	LIMPEZA DE OBRAS									961,84
3.2.1	ALUGUEL DE CACAMBA 48 HORAS COM RETIRADA	UN	4	197,52	790,08	240,46				R\$0,00
3.3	COMO CONSTRUÍDO (AS BUILT)									4.078,20
3.3.1	PROJETO "AS BUILT" ARQUITETURA	m²	200,7	6,07	1.217,85	7,38				R\$0,00
3.3.2	PROJETO "AS BUILT" DE INSTALACOES ELETRICAS	m²	200,7	5,89	1.182,11	7,17				R\$0,00
3.3.3	PROJETO "AS BUILT" DE INSTALACOES HIDRAULICAS	m²	200,7	4,74	951,24	5,77				R\$0,00
3.4	REPROGRAFIA									88,00
3.4.1	COPIAS DE PROJETOS POR PLOTAGEM ELETRONICA	UN	10	7,23	72,30	8,80				R\$0,00
4	SERVIÇOS PRELIMINARES									2.280,64
4.1	DEMOLIÇÕES / RETIRADAS									2.280,64
4.1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m³	3,41	32,65	111,44	39,74				R\$0,00
4.1.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	26,29	7,01	184,39	8,53				R\$0,00
4.1.3	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	21,05	13,08	275,19	15,92				R\$0,00
4.1.4	Demolição de concreto com martelo e compressor	m²	2,22	40,05	88,91	48,75				R\$0,00
4.1.5	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	127,71	0,91	116,21	1,10				R\$0,00
4.1.6	REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	2,88	12,71	36,63	15,47				R\$0,00
4.1.7	REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO OU SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INCLUSIVE AFASTAMENTO	m²	6,39	5,55	35,56	6,75				R\$0,00
4.1.8	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	21,06	1,91	40,22	2,32				R\$0,00
4.1.9	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	1	0,86	0,86	1,04		1,04		R\$0,00
4.1.10	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	2	7,08	14,16	8,61				R\$0,00
4.1.11	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	3	5,16	15,48	6,28				R\$0,00
4.1.12	REMOÇÃO DE PONTOS DE INSTALACOES HIDROSANITARIAS	UN	4	48,96	195,84	58,60				R\$0,00
4.1.13	REMOÇÃO DE PORTA BOX-SANITARIOS-COM REAPROVEITAMENTO	UN	1	81,43	81,43	99,13				R\$0,00
4.1.14	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³. CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	14,07	5,69	80,16	6,92				R\$0,00
4.1.15	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	140,7	1,44	202,60	1,75				R\$0,00
4.1.16	REMOÇÃO DE CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO (MO)	UN	2	181,12	362,24	220,49				R\$0,00
4.1.17	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	17,09	1,99	34,01	2,42				R\$0,00
5	SERVIÇOS DIVERSOS									1.971,85
5.1	LIMPEZA E ARREMATAS FINAIS									1.971,85
5.1.1	LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/ PVC. AF 04/2019	m²	119,04	2,01	239,27	2,44				R\$0,00
5.1.2	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF 04/2019	m²	106,32	1,69	179,78	2,05				R\$0,00
5.1.3	LIMPEZA REVESTIMENTOS EM GERAL	m²	203,9	5,16	1.052,12	6,28				R\$0,00
5.1.4	Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários	m	25	1,15	28,75	1,40				R\$0,00
5.1.5	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	31,49	1,25	39,36	1,52				R\$0,00
5.1.6	Limpeza de reservatório	m²	10	8,23	82,30	10,01				R\$0,00
6	CANTEIRO DE OBRAS									6.688,72
6.1	PLACA DE OBRAS									1.811,40
6.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6	247,99	1.487,94	301,90				R\$0,00
6.2	CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO									1.618,28
6.2.1	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	12	72,46	869,52	88,21				R\$0,00
6.2.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	1	196,66	196,66	239,41				R\$0,00
6.2.3	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 P	UN	1	283,13	283,13	320,33				R\$0,00
6.3	OUTRAS DESPESAS									3.237,06
6.3.1	CONSUMO AGUA E ESGOTO OBRAS ATE 1.500m2	MES	3	62,74	188,22	76,37				R\$0,00
6.3.2	CONSUMO DE ENERGIA (LUZ E FORÇA) EM SERVICOS DE OBRAS	MES	3	823,60	2.470,80	1.002,65				R\$0,00
7	MOVIMENTO DE TERRA									2.248,77

EM BRANCO



7.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVACÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF 06/2017	m³	18,47	75,25	91,60	1.691,85		R\$0,00
7.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	m³	2,3	19,56	23,81	54,76		R\$0,00
7.3	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).	m³	21,02	5,25	6,39	134,31		R\$0,00
7.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3X KM	210,2	1,44	1,75	367,85		R\$0,00
8	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS					21.966,00		R\$7.416,94
8.1	FUNDAÇÕES					12.090,58		R\$0,00
8.1.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM. 4	m²	18,56	122,51	149,14	2.768,03		R\$0,00
8.1.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM.	m²	12,8	56,66	68,97	882,81		R\$0,00
8.1.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. ESPESSURA DE 5 CM. AF 08/2017	m²	3,6	19,42	23,64	85,10		R\$0,00
8.1.4	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF 05/2021	m³	2,56	346,96	422,38	1.081,29		R\$0,00
8.1.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM. - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	345	11,15	13,57	4.681,65		R\$0,00
8.1.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM. - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	69	13,83	16,83	1.161,27		R\$0,00
8.1.7	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA. LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017	m³	3,45	340,58	414,62	1.430,43		R\$0,00
8.2	ESTRUTURA DE CONCRETO					2.825,93		R\$367,44
8.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	6,4	50,11	61,00	390,40		R\$0,00
8.2.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m²	9,8	30,63	37,28	365,34	5,57	R\$207,65
8.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO	KG	77,6	10,95	13,33	1.034,40		R\$0,00
8.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO	KG	38,8	13,91	16,93	656,88		R\$0,00
8.2.5	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M²	m³	0,59	326,27	397,20	234,34		R\$0,00
8.2.6	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA	m³	0,38	312,52	380,46	144,57	0,42	R\$159,79
8.3	ESTRUTURA METÁLICA					7.049,49		R\$7.049,50
8.3.1	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA.	KG	381,26	15,19	18,49	7.049,49	381,26	R\$7.049,50
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					9.272,98		R\$1.630,48
9.1	APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS E OUTROS					1.044,96		R\$834,14
9.1.1	INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO REAPROVEITADO	UN	1	95,01	115,66	115,66		R\$0,00
9.1.2	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1	78,17	95,16	95,16		R\$0,00
9.1.3	REINSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE BOX	m²	3,64	188,24	229,16	834,14	3,64	R\$834,14
9.2	RALOS / CAIXA SIFONADA					58,08		R\$0,00
9.2.1	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	2	23,86	29,04	58,08		R\$0,00
9.3	RESERVATÓRIO					592,36		R\$0,00
9.3.1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UN	2	243,29	296,18	592,36		R\$0,00
9.4	SERVIÇOS DIVERSOS HIDRÁULICOS					529,55		R\$0,00
9.4.1	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	5	87,00	105,91	529,55		R\$0,00
9.5	SERVIÇOS DIVERSOS ÁGUAS PLUVIAIS					7.048,03		R\$696,34
9.5.1	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020	UN	2	286,00	348,17	696,34	2,00	R\$696,34
9.5.2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	12,8	121,64	148,08	1.895,42		R\$0,00
9.5.3	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM. INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	M	8,35	42,84	52,15	435,45		R\$0,00
9.5.4	Chapim de concreto pré-moldado	m	76,64	38,12	46,40	3.556,09		R\$0,00
9.5.5	Rufo em placa de concreto l = 0,34 m	m	7	54,54	66,39	464,73		R\$0,00
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					3.049,46		R\$0,00
10.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	60	5,65	6,87	412,20		R\$0,00
10.2	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2	24,06	29,29	58,58		R\$0,00
10.3	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	16	26,11	31,78	508,48		R\$0,00
10.4	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	3	18,59	22,63	67,89		R\$0,00
10.5	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M	60	3,91	4,76	285,60		R\$0,00
10.6	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M	60	8,05	9,80	588,00		R\$0,00
10.7	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1	16,21	19,73	19,73		R\$0,00
10.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	250	2,74	3,33	832,50		R\$0,00
10.9	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	4	16,99	20,68	82,72		R\$0,00
10.10	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	16	6,50	7,91	126,56		R\$0,00
10.11	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	6	9,20	11,20	67,20		R\$0,00
11	INSTALAÇÕES ESPECIAIS					27.910,48		R\$545,46
11.1	REDE DE LÓGICA					27.910,48		R\$545,46
11.1.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	170	10,29	12,52	2.128,40		R\$0,00

AA

EM BRANCO



11.1.2	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	50	25,95	31,59	1.579,50		R\$0,00
11.1.3	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20	10,55	12,84	256,80		R\$0,00
11.1.4	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20	6,20	7,54	150,80		R\$0,00
11.1.5	Fornecimento e instalação de Switch 24 portas Gerenciável POE 10/100/1000 + 4SFP	un	2	2.436,17	2.965,79	5.931,58		R\$0,00
11.1.6	Unidade gerenciadora digital de vídeo em rede (NVR) de até 16 câmeras IP, armazenamento de 12 TB, 1 interface de rede Gigabit Ethernet e 4 entradas de alarme	UN	1	1.177,05	1.432,94	1.432,94		R\$0,00
11.1.7	Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 8u x 450mm	un	1	510,13	621,03	621,03		R\$0,00
11.1.8	Abraçadeira metálica tipo "D" de 1"	un	170	3,74	4,55	773,50		R\$0,00
11.1.9	CONJUNTO PARA CONDULETE DE 1" (25MM) COM UMA (1) TOMADA DE DADOS OU TELEFONIA (CONECTOR RJ45 CAT.6E OU RJ11) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE	un	30	25,30	30,80	924,00		R\$0,00
11.1.10	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	1000	1,77	2,15	2.150,00		R\$0,00
11.1.11	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1	448,05	545,45	545,45	1,00	R\$545,45
11.1.12	Fornecimento e instalação de patch cords cat.5e, conector rj-45 macho, c/1,50m - Rev 01	un	50	11,85	14,42	721,00		R\$0,00
11.1.13	Câmera fixa colorida compacta com domo, para áreas internas e externas - 1,3 MP	UN	12	732,13	891,29	10.695,48		R\$0,00
12	PAREDES / PAINÉIS					2.399,91		R\$560,58
12.1	ALVENARIA					2.399,91		R\$560,58
12.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	35,63	46,23	56,28	2.005,25	9,96	R\$560,58
12.1.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	10	23,18	28,21	282,10		R\$0,00
12.1.3	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	3	30,82	37,52	112,56		R\$0,00
13	COBERTURA					5.353,82		R\$4.696,73
13.1	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	63,05	42,96	52,29	3.296,88	52,86	R\$2.764,26
13.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	9,2	11,12	13,53	124,47		R\$0,00
13.3	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	36,76	43,19	52,57	1.932,47	36,76	R\$1.932,47
14	ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS					4.975,15		-R\$737,97
14.1	PORTAS DE MADEIRA					551,85		R\$0,00
14.1.1	REPARO E MANUTENÇÃO DE FERRAGENS DE PORTA DE MADEIRA	UN	13	34,87	42,45	551,85		R\$0,00
14.2	PORTA DE ALUMÍNIO					605,35		R\$534,68
14.2.1	REPARO E MANUTENÇÃO DE PORTA EM ALUMÍNIO	m²	6	9,68	11,78	70,68		R\$0,00
14.2.2	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	0,72	610,00	742,61	534,67	0,72	R\$534,68
14.3	PORTA DE FERRO					3.817,95		-R\$1.272,65
14.3.1	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	7,56	414,84	505,02	3.817,95	-2,52	-R\$1.272,65
14.4	FERRAGENS					0,00		0,00
15	IMPERMEABILIZAÇÃO					1.445,67		R\$0,00
15.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	m²	21,4	18,85	22,70	485,78		R\$0,00
15.2	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	m²	9,2	30,67	37,33	343,43		R\$0,00
15.3	TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018	UN	2	5,47	6,65	13,30		R\$0,00
15.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	16	31,02	37,76	604,16		R\$0,00
16	REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS					18.189,98		R\$3.716,66
16.1	PAREDES					5.433,34		R\$2.793,46
16.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	102,51	4,04	4,91	503,32		R\$0,00
16.1.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	102,51	22,96	27,95	2.865,15		R\$0,00
16.1.3	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Eliane, linha cargo plus white ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	18,68	45,24	55,07	1.028,70	30,86	R\$1.688,45
16.1.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	18,68	2,51	3,05	56,97	19,92	R\$60,76

EM BRANCO

Ministério da Defesa - Exército
 Finº 135
 Rubrica
 Cmd do 18.82

16.1.5	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURACÃO. AF_06/2014	m²	18,68	43,06	52,42	979,28	R\$1.44,25
16.2	FORRO					9.886,34	R\$922,20
16.2.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	127,71	54,42	66,25	8.460,78	R\$922,20
16.2.2	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	147,88	7,92	9,64	1.425,56	R\$0,00
16.3	RECUPERAÇÃO DE FISSURAS					2.840,30	R\$0,00
16.3.1	REPARO ALV INT+TELAFIX 10cm C/ SIKADUR	M	10	233,31	284,03	2.840,30	R\$0,00
17	PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉS					10.536,05	R\$0,00
17.1	PISOS					9.873,70	R\$0,00
17.1.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	m²	41,94	2,26	2,75	115,33	R\$0,00
17.1.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	64,2	63,87	77,75	4.991,55	R\$0,00
17.1.3	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	m³	1,12	346,96	422,38	473,06	R\$0,00
17.1.4	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	26,29	33,66	40,97	1.077,10	R\$0,00
17.1.5	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, Eliane, linha blanco plus po ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	26,29	64,63	78,68	2.068,49	R\$0,00
17.1.6	Rodapé cerâmico 10 x 50,0 cm, porcelanato, Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado	m	12,34	5,54	6,74	83,17	R\$0,00
17.1.7	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	m³	3,2	100,94	122,88	383,21	R\$0,00
17.1.8	Colchão de areia	m²	1,14	81,48	99,19	113,07	R\$0,00
17.1.9	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	11,44	40,12	48,84	558,72	R\$0,00
17.2	SOLEIRA					114,74	R\$0,00
17.2.1	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	2	47,13	57,37	114,74	R\$0,00
17.3	RECUPERAÇÃO DE RECALQUE DA ESTRUTURA					547,61	R\$0,00
17.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	2	55,85	67,99	135,98	R\$0,00
17.3.2	Reatero manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	m²	2	13,44	16,36	32,72	R\$0,00
17.3.3	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	m²	22,26	2,26	2,75	61,21	R\$0,00
17.3.4	Injeção de calda de cimento, admitindo uma produção média bruta de 2 sacos/h, inclusive fornecimento dos materiais, medido por saco de 50kg	saco	5	52,20	63,54	317,70	R\$0,00
18	PINTURAS					30.656,70	R\$6.013,69
18.1	PAREDES INTERNAS					10.660,27	R\$6.013,69
18.1.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	420,69	9,55	11,62	4.888,41	R\$2.757,66
18.1.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	420,69	1,78	2,16	908,69	R\$512,61
18.1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	420,69	9,50	11,56	4.863,17	R\$2.743,42
18.2	PAREDES EXTERNAS					11.039,58	R\$0,00
18.2.1	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	m²	486,54	5,87	7,14	3.473,89	R\$0,00
18.2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014	m²	486,54	12,78	15,55	7.565,69	R\$0,00
18.3	FORRO					1.792,32	R\$0,00
18.3.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	47,58	17,95	21,85	1.039,62	R\$0,00
18.3.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	47,58	2,00	2,43	115,61	R\$0,00
18.3.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	47,58	11,00	13,39	637,09	R\$0,00
18.4	MADEIRA					1.111,96	R\$0,00
18.4.1	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	63,18	1,18	1,43	90,34	R\$0,00
18.4.2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	63,18	13,29	16,17	1.021,62	R\$0,00
18.5	METAL					6.252,57	R\$0,00
18.5.1	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	156,51	5,60	6,81	1.065,83	R\$0,00

18

EM BRANCO



18.5.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	156,51	27,23	33,14	5.186,73		
--------	---	----	--------	-------	-------	----------	--	--

175.667,97

19	ADITIVO					68.593,23		R\$58.457,58
19.1	Remoção de impermeabilização com manta asfáltica ADAPT	m²	60,05	6,71	8,17	490,49	60,05	R\$490,49
19.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_08/2018	m²	60,05	100,08	121,84	7.315,73	60,05	R\$7.315,73
19.3	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	90,61	110,31	110,31	1,00	R\$110,31
19.4	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido roscável Ø 3/4" ADAPT	UN	1,00	206,13	250,94	250,94	1,00	R\$250,94
19.5	GRADIL EXTERNO EM BARRAS AÇO 3/8" COM FIXAÇÃO EM ALVENARIA	m²	29,09	703,42	856,34	24.911,03	29,09	R\$24.911,03
19.6	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,52	893,11	1.087,27	2.739,93	2,52	R\$2.741,01
19.7	DIVISORIA LAMINADO 36mm 1.2x2.11m-VIDRO/EUCATEX C/COLOCACAO	m²	38,26	466,71	568,17	21.738,29	38,26	R\$21.740,56
19.8	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4". FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019 P	m	13,06	637,71	776,35	10.139,11		R\$0,00
19.9	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	40,50	12,63	15,38	622,72	40,50	R\$622,75
19.10	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	13,64	16,54	20,14	274,68	13,65	R\$274,75

								R\$87.227,73
								R\$18.341,26
								R\$68.886,47

2001

EM BRANCO

MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO Comando da 7ª Região Militar	
1º Grupamento de Engenharia	
OBRA:	REFORMA DO PAVILHÃO HAITI PARA RECEBER O GRUPO DE OPERAÇÕES DE INTELIGÊNCIA DO COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
LOCAL:	1º Grupamento de Engenharia, João Pessoa – PB
CONTRATO:	Contrato nº 12/2022
CONTRATANTE:	1º Grupamento de Engenharia
CONTRATADA:	PLANENG ENGENHARIA LTDA - ME
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	

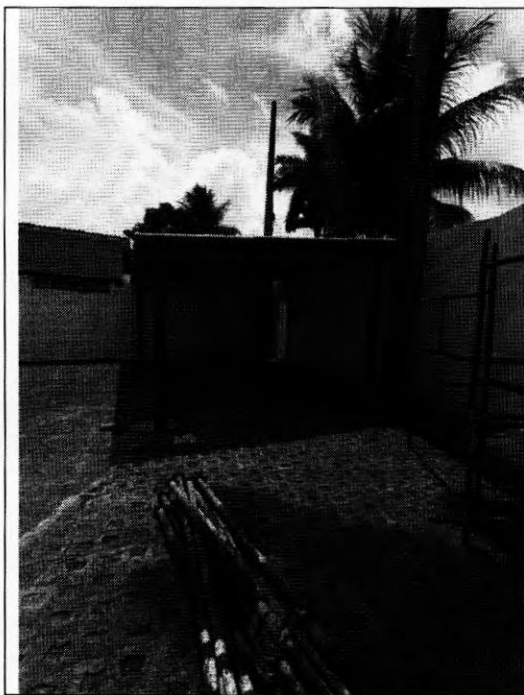


Fig.1




Fig.2

PLANENG
ENGENHARIA
LTDA:27700986000169

Assinado de forma digital por
PLANENG ENGENHARIA
LTDA:27700986000169
Dados: 2023.03.09 11:50:23 -03'00'


EM BRANCO




Fig.3



Fig.4

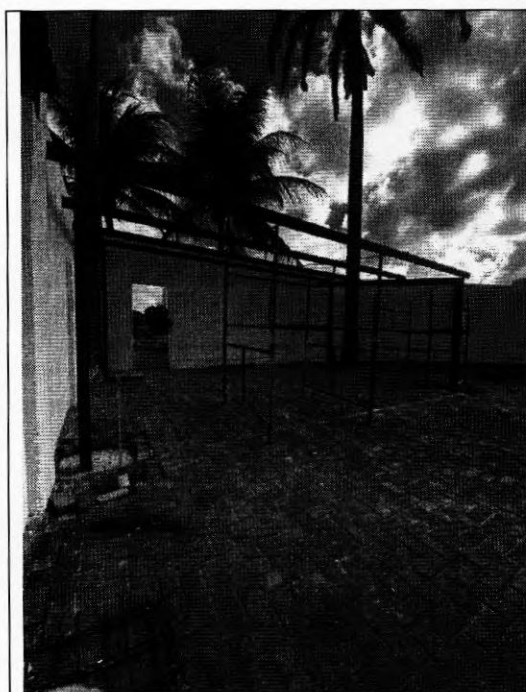

EM BRANCO



PLANENG ENGENHARIA Assinado de forma digital por PLANENG
ENGENHARIA LTDA:27700986000169
LTDA:27700986000169 Dados: 2023.03.09 11:51:28 -03'00'



EM BRANCO

Ministerio da Defesa - Exercício
Fl nº 1357
Assessoria
C. A. L.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

CNPJ 08.924.029/0001-71

Rua José Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - CEP 58.910-000 - São João do Rio do Peixe - PB
(83) 9678-7922 ouvidoria@sjrp.pb.gov.br www.sjrp.pb.gov.br



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 6068/2023 **Liberada:** 07/02/2023 **Validade:** 08/04/2023 **Processo:** Não informado

Dados do contribuinte:

Nome: PLANENG ENGENHARIA LTDA - ME

CPF/CNPJ: 27.700.986/0001-69

Endereço: Rua Jornalista Laurenio Firmeza, nº 82 Centro - São João Do Rio Do Peixe - Paraíba - CEP 58910-000

Na forma dos dispositivos regulamentares vigentes, certificamos para que produza os jurídicos e legais efeitos, por **NÃO** constar lançamentos pendentes de baixa em nossos registros, de natureza tributária ou não tributária, inscritos ou não na Dívida ativa do município.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Municipal constituir novos créditos tributários provenientes de impostos, taxas, contribuições, tarifas, infrações, encargos e outras importâncias que venham a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos períodos abrangidos nesta certidão.

Este documento refere-se exclusivamente ao sujeito passivo supracitado, a fim de prova de situação e regularidade fiscal, e sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade e qualquer rasura ou emenda o invalidará.



A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na internet com QRcode ou no endereço:

<https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sjrp/#autenticidade>

Tipo de documento: Certidão

Código do documento: 430810214

EM BRANCO

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.700.986/0001-69
Razão Social: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME
Endereço: RUA JORNALISTA LAURENIO FIRMEZA 82 / CENTRO / SAO JOAO DO RIO DO PEIXE / PB / 58910-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.


Validade: 27/02/2023 a 28/03/2023

Certificação Número: 2023022701574597730597

Informação obtida em 01/03/2023 07:58:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

EM BRANCO



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)
Telefone: (83) 3216-1440



CERTIDÃO NEGATIVA

FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 27.700.986/0001-69

Razão Social: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME

Nome Fantasia: PLANENG ENGENHARIA

Certidão emitida às 08:01 de 01/03/2023.

Validade 30 dias

-
1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
 2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
 3. Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais.
 4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
 5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: PJE1G, SISCOMW.
-

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: **exej.fZps**. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.

EM BRANCO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: PLANENG ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 27.700.986/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:43:22 do dia 20/01/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/07/2023.


Código de controle da certidão: **3C9E.48B4.C8D6.E42F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

EM BRANCO



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PLANENG ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.700.986/0001-69
Certidão nº: 8854656/2023
Expedição: 01/03/2023, às 07:59:56
Validade: 28/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PLANENG ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.700.986/0001-69**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

EM BRANCO



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ



CERTIDÃO

CÓDIGO: **AFB4.5FFE.DE63.454A**

Emitida no dia 23/01/2023 às 08:28:45

Identificação do requerente:

CNPJ/CPF: **27.700.986/0001-69**

R.G. :

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o requerente supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, **com relação a débitos fiscais administrativos e inscritos em Dívida Ativa.** A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado da Paraíba.

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida **por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página www.sefaz.pb.gov.br.

OBS: Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado no estado da Paraíba, ressalvada quando a licitação se referir à prestação de serviço de transporte entre municípios com características urbanas no âmbito das regiões metropolitanas no estado da Paraíba, reconhecida por Lei específica.

Válida com a apresentação conjunta do cartão de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
Certidão de Débito emitida via 'Internet'.

EM BRANCO



Simple Serviços

SimeI Serviços

Início Voltar A+

>Consulta Optantes

Data da consulta: 13/03/2023 15:35:57

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz
CNPJ: 27.700.986/0001-69
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa
Nome Empresarial: PLANENG ENGENHARIA LTDA

Situação Atual
Situação no Simples Nacional: NÃO optante pelo Simples Nacional
Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

+ Mais informações



Voltar (/consultaoptantes)

Gerar PDF

Política de Privacidade e Condições de Uso



EM BRANCO



Consultar Documento Hábil - CONDH: Detalhar

*Código da UG Emitente: 50176 Nome da UG Emitente: COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA Moeda: REAL (R\$) Ano: 2023 *Tipo de Documento: NP
 tulo: OTA DE PAGAMENTO Número DH: 223

*Código da UG Pagadora: 160176 Nome da UG Pagadora: COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA Sistema de Origem: CPR-STN *Data de Emissão Contábil: 13/03/2023
 Data de Vencimento: 28/04/2023 Taxa de Câmbio: 0,0000 Processo: 64278.009322/2022-61 Ateste: 09/03/2023 *Valor do Documento: 68.886,47
 *Código do Credor: 27700986000169 Nome do Credor: PLANENG ENGENHARIA LTDA

* Dados de Documentos de Origem

<input type="checkbox"/>	Emitente	Data de Emissão	Número Doc. Origem	Valor
<input type="checkbox"/>	27700986000169	09/03/2023	254	68.886,47

Documentos Hábeis Relacionados

<input type="checkbox"/>	UG	Número Doc. Háb. Relacionado
<input type="checkbox"/>		

*Observação

LIQUIDAÇÃO REF NFS-E NR 254 de 09/03/2023 - 4 MEDIÇÃO TP 1/2022 CONTRATO NR 12/2022 - REF REFORMA DO PAVILHÃO HAITI - VALOR DO CONTRATO R\$ 175.667,97 - VALOR DA ETAPA R\$ 68.886,47 - ACUMULADO R\$ 175667,97 ACUMULADO ADITIVO R\$44.054,59 - SALDO ADITIVO R\$ 17669,96 - PI FJA192XARES R\$24.831,88 E FJA192XLUCE R\$ 44.054,59

Informações Adicionais

EMPRESA NÃO OPTANTE SIMPLES

Alterado por [REDACTED] UG 160176 | Data 13/03/2023 15:38:04

EM BRANCO

EM BRANCO
