



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA  
(1º Grupo de Engenharia/1955)  
GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES**

## 4ª MEDIÇÃO

<b>Contratada Razão Social/ CNPJ</b>		<b>Endereço completo – Dados de contato</b>	
<b>R&amp;M CONSTRUTORA EIRELI. CNPJ 18.914.388/0001-00</b>		<b>Av. Duque De Caxias, 76 – Alto da Bela Vista, Abreu e Lima/PE</b>	
<b>Modalidade</b>	<b>Nº/Ano</b>	<b>NUP</b>	
<b>Concorrência Eletrônica</b>	<b>1/2023</b>	<b>64278.013784/2023-63</b>	
<b>Objeto</b>		<b>OM Beneficiária – Endereço – Localidade – UF</b>	
<b>CONSTRUÇÃO DO RANCHO DO COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA</b>		<b>Comd 1ª Gpt E - Av. Epitácio Pessoa, 2205 - Tambauzinho, João Pessoa/PB</b>	
<b>Contrato nº / Ano / Data</b>	<b>Execução (960 dias) Conforme Ordem de Serviço nº 1/2023</b>	<b>Vigência (1020 dias)</b>	
<b>22/2023</b>	<b>29/11/2023 até 16/07/2026</b>	<b>14/11/2023 até 30/08/2026</b>	
<b>Aditivo nº / Ano / Data</b>	<b>Prazo / Valor</b>	<b>Aditivo nº / Ano / Data</b>	<b>Prazo / Valor</b>
<b>1º TA / 2024 / 12/08/24</b>	<b>Valor (-R\$ 8.391,20)</b>	-	-

### 2. DADOS DO PAGAMENTO

a) INSCRIÇÃO GENÉRICA:	IM07OM490		
b) VALOR CONTRATADO: R\$	R\$ 7.013.910,00		
c) NOTA DE EMPENHO:	2023NE001634 2024NE000080	DATA	30/10/2023 09/02/2024
d) VALOR ADITIVO: R\$	- R\$ 8.391,20		
e) VALOR EMPENHADO: R\$	R\$ 1.314.337,42		
f) NOTA DE EMPENHO ADITIVO:	-		
g) NOTA FISCAL Nº 565	DATA DA EMISSÃO:	10/09/2024	
h) VALOR: R\$	48.485,03		

### 3. DADOS BANCÁRIOS

BANCO: [REDACTED]	AGÊNCIA: [REDACTED]	C/CNº: [REDACTED]
VALOR DA ETAPA: R\$ 48.485,03	ACUMULADO: R\$ 386.079,01	SALDO EMPENHADO: R\$ 928.258,41

Aprovado - SOM/Comd 1º Gpt E

[REDACTED]

Resp. como Chefe da Seção de Obras Militares do Comando do 1º Grupo de Engenharia

Autorizo o pagamento:

[REDACTED]

12 de setembro de 2024.

[REDACTED]

Ordenador de Despesas do Comando do 1º Grupo de Engenharia



MEDIÇÃO DE  
OBRA  
(CONTRATUAL)

Nº 4  
DATA 10/09/24



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO RANCHO COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - OBRA

CONTRATO:	22/2023	EMPRESA:	R&M CONSTRUTORA LTDA
RM:	7ª RM	CNPJ:	18.914.388/0001-00
OM:	COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	BDI OBRAS (%):	21,66%
LOCAL:	JOÃO PESSOA/PB	BDI EQUIPAMENTOS (%):	15,28%
ÁREA CONSTRU	1882,86 M2	Encargos Sociais:	Não Desonerado

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI		4ª MEDIÇÃO - 10/09/2024			QUANT. ACUMULADA	CUSTO TOTAL (R\$)	PESO FÍSICO (%)	SALDO DE QUANT	SALDO PARCIAL (R\$)	PESO FÍSICO (%)
							Total	Total	Quant.	Custo Total	Peso Físico						
1			SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS				172.901,80		0,00	0,00%		172.901,80	78,12%		17.828,28	21,88%	
2			SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS				403.443,32		9.461,67	2,35%		19.136,76	4,74%		364.906,55	95,26%	
2.2			MÃO DE OBRA INDIRETA				355.702,00		9.461,67	2,66%		19.136,76	5,38%		336.565,23	94,62%	
2.2.1	00003643	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL ADAPT (MET_DPE)	COTA	100,00	2.923,74	3.557,02	355.702,00	2,66	9.461,67	2,66%	5,38	19.136,76	5,38%	94,62	336.565,23	94,62%
3			SERVIÇOS COMPLEMENTARES				20.538,07		0,00	0,00%		0,00	0,00%		20.538,07	100,00%	
4			SERVIÇOS PRELIMINARES				43.301,71		967,12	2,23%		42.302,69	98,15%		798,02	1,85%	
4.1			TAXAS, IMPOSTOS E LICENÇAS				1.141,65		0,00	0,00%		342,63	30,01%		798,02	69,99%	
4.2			SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENO E OUTROS				42.160,06		967,12	2,29%		42.160,06	100,00%		0,00	0,00%	
4.2.1	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	m²	4.812,58	0,27	0,32	1.540,02	114,63	36,68	2,38%	4.812,58	1.540,02	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.2	100979	SINAPI	CARGA, MANOBRÁ E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	1.251,27	4,51	5,48	6.856,95	31,27	171,35	2,50%	1.251,27	6.856,95	100,00%	0,00	0,00	0,00%
4.2.3	93591	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	15.140,40	1,84	2,23	33.763,09	340,40	759,09	2,25%	15.140,40	33.763,09	100,00%	0,00	0,00	0,00%
5			SERVIÇOS TÉCNICOS (LOCAÇÃO)				15.381,73		0,00	0,00%		0,00	0,00%		15.381,73	100,00%	
6			CANTEIRO DE OBRAS				54.971,69		451,60	0,82%		6.480,26	11,81%		48.491,41	88,19%	
6.1			PLACA DE OBRA				1.093,53		0,00	0,00%		1.093,53	100,00%		0,00	0,00%	
6.2			CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS				29.191,15		0,00	0,00%		0,00	0,00%		29.191,15	100,00%	
6.3			REDE PROVISÓRIA DE ESGOTO				12.881,62		0,00	0,00%		1.642,33	12,75%		11.239,29	87,25%	
6.4			REDE PROVISÓRIA DE ÁGUA				7.755,16		0,00	0,00%		389,09	5,02%		7.366,07	94,98%	
6.5			REDE PROVISÓRIA ELÉTRICA				4.050,23		451,60	11,15%		3.364,73	83,06%		685,50	16,94%	
6.5.1	0002797	Próprio	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA - ADAPT (SINAPI41598)	UND	1,00	1.646,69	2.003,36	2.003,36	0,00	0,00%	1,00	2.003,36	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
6.5.2	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	265,47	322,97	322,97	0,00	0,00%	1,00	322,97	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
6.5.3	101562	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	20,00	18,56	22,58	451,60	20,00	451,60	100,00%	20,00	451,60	100,00%	0,00	0,00	0,00%
6.5.4	92982	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,00	12,06	14,67	586,80	0,00	0,00%	40,00	586,80	100,00%	0,00	0,00	0,00%	
6.5.5	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00	11,27	13,71	685,50	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	50,00	685,50	100,00%	
7			ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS				208.255,98		0,00	0,00%		0,00	0,00%		208.255,98	100,00%	
8			FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				1.145.026,87		0,00	0,00%		0,00	0,00%		1.145.026,87	100,00%	
9			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				297.282,57		0,00	0,00%		0,00	0,00%		297.282,57	100,00%	
10			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA				346.689,52		0,00	0,00%		0,00	0,00%		346.689,52	100,00%	
11			INSTALAÇÕES ESPECIAIS				307.211,58		0,00	0,00%		0,00	0,00%		307.211,58	100,00%	
12			PAREDES E PAINÉIS				244.905,56		0,00	0,00%		0,00	0,00%		244.905,56	100,00%	

*Handwritten signature*



				<b>MEDIÇÃO DE OBRA (CONTRATUAL)</b>		<b>Nº 4</b>	
				<b>DATA</b>		<b>10/09/24</b>	

13			COBERTURA				496.247,78	0,00	0,00%		0,00	0,00%		496.247,78	100,00%	
14			IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS				56.071,60	0,00	0,00%		0,00	0,00%		56.071,60	100,00%	
15			ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS				311.995,16	0,00	0,00%		0,00	0,00%		311.995,16	100,00%	
16			REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS				411.076,33	0,00	0,00%		0,00	0,00%		411.076,33	100,00%	
17			PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉS				651.619,24	0,00	0,00%		0,00	0,00%		651.619,24	100,00%	
18			PINTURAS				198.108,42	0,00	0,00%		0,00	0,00%		198.108,42	100,00%	
19			TERRAPLENAGEM				67.811,52	22.387,39	33,01%		22.387,39	33,01%		45.424,12	66,99%	
19.1			ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA				33.732,54	22.387,39	66,37%		22.387,39	66,37%		11.345,14	33,63%	
19.1.1	101117	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020	m³	962,52	2,17	2.541,05	609,23	1.608,36	63,30%	609,23	1.608,36	63,30%	353,29	932,68	36,70%
19.1.2	93591	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XK	11.646,50	1,84	25.971,69	7.371,69	16.438,87	63,30%	7.371,69	16.438,87	63,30%	4.274,81	9.532,82	36,70%
19.1.3	100979	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	952,52	4,51	5.219,80	792,00	4.340,16	83,15%	792,00	4.340,16	83,15%	160,52	879,64	16,85%
19.2			COMPACTAÇÃO DE ATERROS COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA				34.078,98	0,00	0,00%		0,00	0,00%		34.078,98	100,00%	
20			PAVIMENTAÇÃO				59.938,82	0,00	0,00%		0,00	0,00%		59.938,82	100,00%	
21			URBANIZAÇÃO				24.420,60	0,00	0,00%		0,00	0,00%		24.420,60	100,00%	
22			AR CONDICIONADO/EXAUSTÃO - EQUIPAMENTOS				305.151,35	0,00	0,00%		0,00	0,00%		305.151,35	100,00%	
23			CÂMARA FRIA				292.316,50	0,00	0,00%		0,00	0,00%		292.316,50	100,00%	
24			AR CONDICIONADO - EQUIPAMENTOS				356.932,34	0,00	0,00%		0,00	0,00%		356.932,34	100,00%	
25			CALDEIRÕES/ BALCÕES/FOGÃO INDUSTRIAL/FORNO INDUSTRIAL				210.081,40	0,00	0,00%		0,00	0,00%		210.081,40	100,00%	
26			RESERVATORIO TERMICO - EQUIPAMENTOS				75.309,93	0,00	0,00%		0,00	0,00%		75.309,93	100,00%	
27			DIVISORIA RETRÁTIL				132.450,47	0,00	0,00%		0,00	0,00%		132.450,47	100,00%	
28			GERADOR				32.364,07	0,00	0,00%		0,00	0,00%		32.364,07	100,00%	
29			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				72.104,07	0,00	0,00%		0,00	0,00%		72.104,07	100,00%	
							<b>Valor Total com BDI (R\$)</b>	<b>R\$33.267,78</b>	<b>0,47%</b>							
							<b>Valor Total Acumulado com BDI (R\$)</b>	<b>R\$ 7.013.910,00</b>	<b>3,22%</b>	<b>R\$225.590,64</b>	<b>3,22%</b>	<b>R\$6.788.319,34</b>	<b>96,78%</b>			
							<b>Saldo Total Acumulado com BDI (R\$)</b>	<b>R\$6.788.319,36</b>	<b>96,78%</b>							

10/09/24  


Contratante:  Contratada: 

**MEDIÇÃO DE OBRA (ADITIVO) Nº 4**

DATA: 10/09/2024



**OBJETO: CONSTRUÇÃO DO RANCHO COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - OBRA**

CONTRATO:	22/2023	EMPRESA:	R&M CONSTRUTORA LTDA
RM:	7º RM	CNPJ:	18.914.388/0001-00
OME:	COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	BDI OBRAS (%):	21,66%
LOCAL:	JOÃO PESSOA/PB	BDI:	15,28%
ÁREA CONSTRUI:	1882,86 M2	Encargos Sociais:	Não Desonerado

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant. (TA-01)	Custo Unit (R\$) sem BDI	Custo Parcial (R\$)	4ª MEDIÇÃO (2ª TA) - 10/09/24			QUANT. ACUMULADA	CUSTO TOTAL (R\$)	PESO FÍSICO (%)	CÁLCULO DE QUANT.	VALOR PARCIAL (R\$)	PESO FÍSICO (%)
								Quant. (TA-01)	Custo Total	Peso Físico (%)						
6			CANTEIRO DE OBRAS				2.720,77	0,00	0,00%		2.720,77	100,00%		0,00	0,00%	
6.1			PLACA DE OBRA				0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	
6.2			CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS				0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	
6.3			REDE PROVISÓRIA DE ESGOTO				1.887,98	0,00	0,00%		1.887,98	100,00%		0,00	0,00%	
6.4			REDE PROVISÓRIA DE ÁGUA				832,79	0,00	0,00%		832,79	100,00%		0,00	0,00%	
6.5			REDE PROVISÓRIA ELÉTRICA				0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%	
8			FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				25.223,64	0,00	0,00%		0,00	0,00%		25.223,64	100,00%	
30			NOVOS ITENS				176.573,01	15.620,50	8,85%		162.000,52	91,78%		14.552,49	8,24%	
30.8			CANTEIRO DE OBRAS				148.433,57	0,00	0,00%		148.400,02	99,63%		2.033,55	1,37%	
30.8			FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				28.139,44	15.620,50	55,81%		15.620,50	100,00%		12.518,93	44,49%	
30.8.1			FUNDAÇÃO				15.620,50	15.620,50	100,00%		15.620,50	100,00%		0,00	0,00%	
30.8.1.1			SAPATA				15.620,50	15.620,50	100,00%		15.620,50	100,00%		0,00	0,00%	
30.8.1.1.1	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	48,18	17,22	829,66	48,18	829,66	100,00%	48,18	829,66	100,00%	0,00	0,00	0,00%
30.8.1.1.2	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	846,36	13,69	11.586,67	846,36	11.586,67	100,00%	846,36	11.586,67	100,00%	0,00	0,00	0,00%
30.8.1.1.3	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	223,64	11,60	2.594,22	223,64	2.594,22	100,00%	223,64	2.594,22	100,00%	0,00	0,00	0,00%
30.8.1.1.4	96548	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	55,45	11,00	609,95	55,45	609,95	100,00%	55,45	609,95	100,00%	0,00	0,00	0,00%
30.8.2			ESTRUTURA DE CONCRETO				12.518,93	0,00	0,00%		0,00	0,00%		12.518,93	100,00%	
							Custo Total sem BDI (R\$)	R\$ 204.517,43	R\$15.620,50		164.741,30			99.776,13		
							BDI (R\$)	R\$ 44.298,47	R\$3.383,40	7,64%	35.082,06			8.615,51	19,45%	
							Desconto complementar (R\$)	-R\$ 49.573,24	-R\$3.786,66		-38.935,88			-9.642,36		
							Valor Total com BDI (R\$)	R\$ 199.237,66	R\$18.217,25		160.486,38			88.748,28		

10/09/24  
R



**Memória de Cálculo 1º JTA**  
**OBJETO:** CONSTRUÇÃO DO RANCHO DO COMANDO 1º GDE  
**CONTRATO:** 2/2013  
**BN:** 7º RM  
**OM:** COMANDO DO 1º GRUPO MILITAR DE ENGEMARIA  
**LOCAL:** JOÃO PESSOA/PB

**EMPRESA:** W&M CONSTRUÇÃO LTDA  
**CNPJ:** 18.911.881/0001-00  
**DATA:** 11/07/2014  
**BDI:** 11,84%

**BANCO:**  
**SINASC:** 12/2002 Per. Alça  
**SICAD:** 1.072.012- Per. Alça  
**CISE:** 11/2003 Per. Alça  
**SEINFRA:** 123 - 1º Grau  
**SETOP:** 10/0002 - Minas Gerais

**Encargos Sociais:**  
 Não Desonerado: embutido nos preços unitários dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - PCVA**

Item	Código	Banco	Descrição	Unid.	QUANT.	Comp.	Leitura	Alça	Área	Volume	Taxa	Total	AUS. DENEGATIVA
28.8			<b>FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS</b>										
28.8.1			<b>FUNDAÇÃO</b>										
28.8.1.1			<b>SAPATA</b>										
30.8.1.1.1	98543	SI/PA/PI	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8 MM - MONTAGEM AF. 08/2017. <i>De acordo com o resumo de aço da planilha 18</i>	KG								48,18	Acréscimo de 48,18 Kg, Conforme projeto executivo de fundações elaborado pela contratada.
30.8.1.1.2	98546	SI/PA/PI	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF. 09/2017. <i>De acordo com o resumo de aço da planilha 19</i>	KG								848,36	Acréscimo de 848,36 Kg, Conforme projeto executivo de fundações elaborado pela contratada.
30.8.1.1.3	98547	SI/PA/PI	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF. 08/2017. <i>De acordo com o resumo de aço da planilha 18</i>	KG								223,64	Acréscimo de 223,64 Kg, Conforme projeto executivo de fundações elaborado pela contratada.
30.8.1.1.4	98548	SI/PA/PI	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM AF. 08/2017. <i>De acordo com o resumo de aço da planilha 19</i>	KG								56,46	Acréscimo de 56,46 Kg, Conforme projeto executivo de fundações elaborado pela contratada.

10/10/2014




03 Memória de Cálculo 14 JTA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO RANCHO DO CMD DO 1º GPT E  
CONTRAT 22/2023  
RM: 79 RM  
OM: COMANDO DO 1º GRUPO DE ENGENHARIA  
LOCAL: JOÃO PESSOA/PB

EMPRESA: R&M CONSTRUTORA LTDA  
CNPJ: 18.814.388/0001-00  
DATA: 2/8/2024  
DOI: 21.864

BANCOS:  
SINAPI - 12/2023 - Paraíba  
SICRO3 - 10/2023 - Paraíba  
CREE - 12/2022 - Paraíba  
SEINFRA - 027 - Ceará  
SETOP - 10/2023 - Minas Gerais

Encargos Sociais:  
Não Desonerado: embutido nos preços unitários dos insumos da mão de obra, de acordo com as bases.



MEMÓRIA DE CÁLCULO - 4 BM

Item	Código	Banco	Descrição	Und	QUANT	Comp	Largura	Altura	Área	Volume	Taxa	Total	JUSTIFICATIVA
3.3			<b>MÃO DE OBRA INDIRETA</b>										
3.3.1	00003643	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL ADAPT (MET_OPE)	COTA								2,86	
4			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>										
4.1			<b>TAXAS, IMPOSTOS E LICENÇAS</b>										
4.1.1	00003695	Próprio	RR1 - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE ARQUITETURA - CAUPB - ADAPT (COT_OPE 10/2022)	UND									
4.1.3	00003696	Próprio	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA EXECUÇÃO - CREAFB - ADAPT (COT_OPE 10/2022)	UND									
4.2			<b>SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERREIRO E OUTROS</b>										
4.2.1	88525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL VEGETAÇÃO E PEQUENOS ARVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_04/2018	m²								114,88	CONCLUSÃO REFERENTE LIMPEZA DO TERREIRO
4.2.2	9087	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BARRILANTE 14 MP, CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CARGA MÁX 20 MP) 155 MP) E DESCARGA LIVRE (QUANTIDADE: M³) AF_07/2020	m³								31,37	CONCLUSÃO REFERENTE LIMPEZA DO TERREIRO
4.2.3	9259	SINAPI	TRANSPORTE LOCAL (CAMINHÃO BARRILANTE DE 14 MP, EM VIA URBANA EM LÍTO NATURAL (UNIDADE: M³XKM)) AF_07/2020	M³XK								340,40	CONCLUSÃO REFERENTE LIMPEZA DO TERREIRO
4.3			<b>CANTEROS DE OBRAS</b>										
4.3.1	101982	SINAPI	REDE FONEMÁTICA ELÉTRICA CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 25MM² 0,80 Ø 90% PARA REDE DE ABREIA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO FORNECIMENTO INSTALAÇÃO AF_07/2020	M	20,00							20,00	
4.4			<b>TRANSPORTE</b>										
4.4.1	10111	SINAPI	DESCARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 0,47 MP ALA MENA 3 TOMAS AF_07/2020	m³								608,23	842,52 M³- SERÁ MEDIDO PARCIALMENTE
4.4.2	9089	SINAPI	TRANSPORTE LOCAL (CAMINHÃO BARRILANTE DE 14 MP, EM VIA URBANA EM LÍTO NATURAL (UNIDADE: M³XKM)) AF_07/2020	M³XK								7.371,89	11846,50 M³XKM- SERÁ MEDIDO PARCIALMENTE
4.4.3	100979	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BARRILANTE 14 MP, CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CARGA MÁX 20 MP) 155 MP) E DESCARGA LIVRE (QUANTIDADE: M³) AF_07/2020	m³								792,00	842,52 M³- SERÁ MEDIDO PARCIALMENTE

16/09/24



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: R&M CONSTRUTORA LTDA**  
**CNPJ: 18.914.388/0001-00**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 06:42:06 do dia 30/07/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/01/2025.

Código de controle da certidão: **94EF.8F15.440E.4CDC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2024.000007912664-15

Data de Emissão: 08/09/2024

## DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 18.914.388/0001-00

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **06/12/2024** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página [www.sefaz.pe.gov.br](http://www.sefaz.pe.gov.br).

**Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.**

OBSERVAÇÕES: NÃO INFORMADO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ABREU E LIMA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

**CENTRO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE**

Endereço: AV. DUQUE DE CAXIAS, 924-CENTRO Telefone: (81) 3541.4715 CNPJ: 08.637.373/0001-80



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS**

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO Nº \*\*\*\*\* e com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com os tributos do cadastro mercantil até a presente data: 02/09/2024

Contribuinte: R&M CONSTRUTORA LTDA EPP		Inscrição Mercantil: 99006206
Localização: AV DUQUE DE CAXIAS - ALTO BELA VISTA, 76., ALTO DA BELA VISTA		Sequencial: 48358
Natureza: Tributos Mercantis		Referência Loteamento:
Razão Social: R&M CONSTRUTORA LTDA EPP		Cadastro Imobiliário: 2.4145.054.0191.000
		Inscrição Imobiliária: 19312
CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Mercantil
18.914.388/0001-00		99006206
Atividade Principal:		
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS		
Atividades Secundárias		
2330-3/02 - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO		
4213-8/00- OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS		
4291-0/00 - OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS		
4311-8/01- DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS		
Início Atividade:	05/03/2020	Validade: 01/11/2024
Observações: Válido por 59 dias.		
<b>VIA INTERNET</b>		

Para validar a autenticidade desse documento acesse o Portal do Contribuinte.

<https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/abreuellima//views/publico/portaldotribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml>

026F1642B6C5B6869CF2219E152F942D262C3C1B



Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS- CRF

**Inscrição:** 18.914.388/0001-00  
**Razão Social:** R E M CONSTRUTORA LTDA EPP  
**Endereço:** AV SEVERINO PEREIRA DE OLIVEIRA 1391 / PAU AMARELO / PAULISTA / PE/ 53433-240

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 24/08/2024 a 22/09/2024

**Certificação Número:** 2024082403152101710411

Informação obtida em 04/09/2024 06:18:59

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página



**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: R&M CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 18.914.388/0001-00

Certidão nº: 48899576/2024

Expedição: 14/07/2024, às 07:50:40

Validade: 10/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **R&M CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.914.388/0001-00**, CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

**0000520-57.2021.5.06.0122 - TRT 06ª Região \* (2ª VARA DO TRABALHO DE PAULISTA)**

\* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

**Total de processos: 1.**

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário, penhora de bens suficientes ou, ainda, tenha sido deferida, no caso de empresa, a sua recuperação judicial, de acordo com a Lei 11.101/2005.



<b>DIÁRIO DE OBRAS</b>	<b>45</b> <b>15/08/24</b> <b>quinta-feira</b>
------------------------	---

<b>Contratante:</b> 	<b>Contratada:</b> 	<b>INÍCIO DO PRAZO DE EXECUÇÃO</b>	29/11/2023
		<b>INÍCIO DA OBRA</b>	01/07/2024
		<b>PRAZO CONTRATUAL (DIAS)</b>	870
		<b>ADITIVO DE PRAZO (DIAS)</b>	
		<b>PARALIZAÇÃO CONTRATUAL (DIAS)</b>	64
		<b>FIM DA EXECUÇÃO</b>	20/06/2026
		<b>SALDO DO PRAZO (DIAS)</b>	674

**OBJETO: CONSTRUÇÃO DO RANCHO COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - OBRA**

MÃO-DE-OBRA INDIRETA		MÃO-DE-OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Armador/montador	1	Betoneira	1
Mestre de obras	0	Betoneiro	0	Motor vibrador	0
Encarregado	1	Carpinteiro	0	Serra circular de bancada	1
Chefe de escritório	0	Eletricista	0	Martellete rompedor	0
Almoxarife	0	Encanador	0	Serra Circular manual	0
Cozinheiro	0	Pedreiro	1	Andaimes	0
Vigia	0	Servente	3	Furadeira/parafusadeira	0
Estagiário	0	Caçambeiro	0	Esmerilhadeira	0
Técnico de Edificações	0	Operador	0	maquina de solda	0
<b>TOTAL:</b>	<b>2</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>5</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>2</b>

SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos	
EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT



<b>Paralisação contratual 01:</b>	27/04/2024	30/06/2024	<b>TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA</b>	7
			<b>TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS</b>	2

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS		
Manhã	Sol	<b>OBSERVAÇÕES:</b>
Tarde	Sol	
Noite		
<b>Total de dias de chuva no mês:</b>	3	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/OBSERVAÇÕES
Carpintaria - Fechamento superior em tapumes;
Piso cimentado -calçada de contorno;
Montagem das Sapatas 0,80x0,80 cm

FOTOS

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO
A empresa deve corrigir as ARTs dos projetos executivos, conforme Ofício Nº 04/2024 enviado em 08/07/2024.
A empresa deve fornecer a documentação para ao 2º TA, conforme informações passadas na reunião Nº 04/2024.
Deve-se revisar o projeto de drenagem de águas pluviais.

<b>Assinatura Contratada:</b> Eng. Civil Daniel Jorge Vanderlei de Moraes	<b>Assinatura Fiscalização:</b>
	



DIÁRIO DE OBRAS	46 16/08/24 sexta-feira
-----------------	-------------------------------

Contratante:	Contratada:	INÍCIO DO PRAZO DE EXECUÇÃO: 29/11/2023	INÍCIO DA OBRA: 01/07/2024
		PRAZO CONTRATUAL (DIAS): 870	ADITIVO DE PRAZO (DIAS):
		PARALIZAÇÃO CONTRATUAL (DIAS): 64	FIM DA EXECUÇÃO: 20/06/2026
		SALDO DO PRAZO (DIAS): 673	

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO RANCHO COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - OBRA

MÃO-DE-OBRA INDIRETA		MÃO-DE-OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Armador/montador	1	Betoneira	1
Mestre de obras	0	Betoneiro	0	Motor vibrador	0
Encarregado	1	Carpinteiro	0	Serra circular de bancada	1
Chefe de escritório	0	Eletricista	0	Martelete rompedor	0
Almoxarife	0	Encanador	0	Serra Circular manual	0
Cozinheiro	0	Pedreiro	1	Andaimes	0
Vigia	0	Servente	3	Furadeira/parafusadeira	0
Estagiário	0	Caçambeiro	0	Esmerilhadeira	0
Técnico de Edificações	0	Operador	0	Moto Serra	0
<b>TOTAL:</b>	<b>2</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>5</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>2</b>

SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos	
EMPRESA	QUANT.	EMPRESA	QUANT.
JARDIM VERDE	6	JARDIM VERDE	2

Paralisação contratual 01:	27/04/2024	30/06/2024	TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	13
				TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS
				4

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS		
Manhã	Sol	OBSERVAÇÕES:
Tarde	Sol	
Noite		
Total de dias de chuva no mês:	3	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/OBSERVAÇÕES
Remoção das árvores de grande porte;
Piso cimentado -calçada de contorno;
Montagem das Sapatas 0,80x0,80 cm



FOTOS



COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO


A empresa deve corrigir as ARTs dos projetos executivos, conforme Ofício Nº 04/2024 enviado em 08/07/2024.

A empresa deve fornecer a documentação para ao 2º TA, conforme informações passadas na reunião Nº 04/2024.

Deve-se revisar o projeto de drenagem de águas pluviais.

Assinatura Contratada: Eng. Civil Daniel Jorge Vanderlei de Moraes

Assinatura Fiscalização:





# DIÁRIO DE OBRAS

47  
17/08/24  
sábado

Contratante:		Contratada:		INÍCIO DO PRAZO DE EXECUÇÃO:	29/11/2023
				INÍCIO DA OBRA:	01/07/2024
				PRAZO CONTRATUAL (DIAS):	870
				ADITIVO DE PRAZO (DIAS):	
				PARALIZAÇÃO CONTRATUAL (DIAS):	64
				FM DA EXECUÇÃO:	20/06/2026
				SALDO DO PRAZO (DIAS):	672

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO RANCHO COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - OBRA

MÃO-DE-OBRA INDRETA		MÃO-DE-OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	0	Armador/montador	0	Betoneira	0
Mestre de obras	0	Betoneiro	0	Motor vibrador	0
Encarregado	0	Carpinteiro	0	Serra circular de bancada	0
Chefe de escritório	0	Eletricista	0	Martelete rompedor	0
Almoxarife	0	Encanador	0	Serra Circular manual	0
Cozinheiro	0	Pedreiro	0	Andaimes	0
Vigia	0	Servente	0	Furadeira/parafusadeira	0
Estagiário	0	Caçambeiro	0	Esmerilhadeira	0
Técnico de Edificações	0	Operador	0	Moto Serra	0
<b>TOTAL:</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>0</b>

SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos	
EMPRESA	QUANT.	EMPRESA	QUANT.
0			0

Paralisação contratual 01:	27/04/2024	30/06/2024	<b>TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA</b>	0
			<b>TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS</b>	0

### CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

Manhã	Sol	OBSERVAÇÕES:
Tarde	Sol	
Noite		
Total de dias de chuva no mês:	3	

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/OBSERVAÇÕES:

Não haviam serviços em execução

### FOTOS

### COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

A empresa deve corrigir as ARTs dos projetos executivos, conforme Ofício Nº 04/2024 enviado em 08/07/2024.  
A empresa deve fornecer a documentação para ao 2º TA, conforme informações passadas na reunião Nº 04/2024.  
Deve-se revisar o projeto de drenagem de águas pluviais.

Assinatura Contratada: Eng. Civil Daniel Jorge Vanderlei de Moraes

Assinatura Fiscalização:





<b>DIÁRIO DE OBRAS</b>	<b>48</b>
	<b>18/08/24</b>
	<b>domingo</b>

<b>Contratante:</b> 	<b>Contratada:</b> 	<b>INÍCIO DO PRAZO DE EXECUÇÃO</b>	<b>29/11/2023</b>
		<b>INÍCIO DA OBRA</b>	<b>01/07/2024</b>
		<b>PRAZO CONTRATUAL (DIAS)</b>	<b>870</b>
		<b>ADITIVO DE PRAZO (DIAS)</b>	
		<b>PARALIZAÇÃO CONTRATUAL (DIAS)</b>	<b>64</b>
		<b>FIM DA EXECUÇÃO</b>	<b>20/06/2026</b>
		<b>SALDO DO PRAZO (DIAS)</b>	<b>671</b>

**OBJETO: CONSTRUÇÃO DO RANCHO COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - OBRA**

MÃO-DE-OBRA ÍNDIRETA		MÃO-DE-OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	0	Armador/montador	0	Betoneira	0
Mestre de obras	0	Betoneiro	0	Motor vibrador	0
Encarregado	0	Carpinteiro	0	Serra circular de bancada	0
Chefe de escritório	0	Eletricista	0	Martelete rompedor	0
Almoxarife	0	Encanador	0	Serra Circular manual	0
Cozinheiro	0	Pedreiro	0	Andaimes	0
Vigia	0	Servente	0	Furadeira/parafusadeira	0
Estagiário	0	Caçambelro	0	Esmerilhadeira	0
Técnico de Edificações	0	Operador	0	Moto Serra	0
<b>TOTAL:</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>0</b>

SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos	
EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
0			0

<b>Paralisação contratual 01:</b>	27/04/2024	30/06/2024	<b>TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0</b>
			<b>TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS</b>	<b>0</b>

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS		
Manhã	Sol	<b>OBSERVAÇÕES:</b>
Tarde	Sol	
Noite		
<b>Total de dias de chuva no mês:</b>	<b>3</b>	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/OBSERVAÇÕES
Não haviam serviços em execução

FOTOS

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO
A empresa deve corrigir as ARTs dos projetos executivos, conforme Ofício Nº 04/2024 enviado em 08/07/2024.
A empresa deve fornecer a documentação para ao 2º TA, conforme informações passadas na reunião Nº 04/2024.
Deve-se revisar o projeto de drenagem de águas pluviais.

<b>Assinatura Contratada:</b> Eng. Civil Daniel Jorge Vanderlei de Moraes	<b>Assinatura Fiscalização:</b>



# DIÁRIO DE OBRAS

49  
19/08/24  
segunda-feira

Contratante: 	Contratada: 	INÍCIO DO PRAZO DE EXECUÇÃO	29/11/2023
		INÍCIO DA OBRA	01/07/2024
		PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	870
		ADITIVO DE PRAZO (DIAS)	
		PARALIZAÇÃO CONTRATUAL (DIAS)	64
		FIM DA EXECUÇÃO	20/06/2026
		SALDO DO PRAZO (DIAS)	670

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO RANCHO COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - OBRA

MÃO-DE-OBRA INDIRECTA		MÃO-DE-OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Armador/montador	1	Betoneira	1
Mestre de obras	0	Betoneiro	0	Motor vibrador	0
Encarregado	1	Carpinteiro	0	Serra circular de bancada	1
Chefe de escritório	0	Eletricista	0	Martelete rompedor	0
Almoxarife	0	Encanador	0	Serra Circular manual	0
Cozinheiro	0	Pedreiro	1	Andaimos	0
Vigia	0	Servente	3	Furadeira/parafusadeira	0
Estagiário	0	Çaçambeiro	0	Esmerilhadeira	0
Técnico de Edificações	0	Operador	0	Moto Serra	0
<b>TOTAL:</b>	<b>2</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>5</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>2</b>

SUBEMPREENHEITOS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEITOS - Equipamentos	
EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
jardim verde	6	jardim verde	2

Paralisação contratual 01:	27/04/2024	30/06/2024	<b>TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA</b>	<b>13</b>	
				<b>TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS</b>	<b>4</b>

### CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

Manhã	Sol	OBSERVAÇÕES:
Tarde	Sol	
Noite		
Total de dias de chuva no mês:	3	

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/OBSERVAÇÕES

Montagem das sapatas ;  
Prateleiras para o escritório;  
Remoção das raízes das plantas;  
Limpeza do terreno;

### FOTOS



### COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

A empresa deve corrigir as ARTs dos projetos executivos, conforme Ofício Nº 04/2024 enviado em 08/07/2024.  
A empresa deve fornecer a documentação para o 2º TA, conforme informações passadas na reunião Nº 04/2024.  
Deve-se revisar o projeto de drenagem de águas pluviais.

Assinatura Contratada: Eng. Civil Daniel Jorge Vanderlei de Morais  
Assinatura Fiscalização: \_\_\_\_\_  
Documento assinado digitalmente



<b>DIÁRIO DE OBRAS</b>		<b>50</b>
		<b>20/08/24</b>
		<b>terça-feira</b>

<b>Contratante:</b> 	<b>Contratada:</b> 	<b>INÍCIO DO PRAZO DE EXECUÇÃO</b>	<b>29/11/2023</b>
		<b>INÍCIO DA OBRA</b>	<b>01/07/2024</b>
		<b>PRAZO CONTRATUAL (DIAS)</b>	<b>870</b>
		<b>ADITIVO DE PRAZO (DIAS)</b>	
		<b>PARALIZAÇÃO CONTRATUAL (DIAS)</b>	<b>64</b>
		<b>FIM DA EXECUÇÃO</b>	<b>20/06/2026</b>
		<b>SALDO DO PRAZO (DIAS)</b>	<b>669</b>

**OBJETO: CONSTRUÇÃO DO RANCHO COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - OBRA**

MÃO-DE-OBRA INDIRETA		MÃO-DE-OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Armador /montador	1	Betoneira	1
Mestre de obras	0	Betoneiro	0	Motor vibrador	0
Encarregado	1	Carpinteiro	0	Serra circular de bancada	1
Chefe de escritório	0	Eletricista	0	Martelete rompedor	0
Almoxarife	0	Encanador	0	Serra Circular manual	0
Cozinheiro	0	Pedreiro	1	Andaimes	0
Vigia	0	Servente	3	Furadeira/parafusadeira	0
Estagiário	0	Caçambeiro	0	Esmerilhadeira	0
Técnico de Edificações	0	Operador	0	Moto Serra	0
<b>TOTAL:</b>	<b>2</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>5</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>2</b>

SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos	
EMPRESA	QUANT.	EMPRESA	QUANT.
jardim verde	6	jardim verde	2


<b>Paralisação contratual 01:</b>	27/04/2024	30/06/2024	<b>TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA</b>	<b>13</b>
			<b>TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS</b>	<b>4</b>

CONDICÕES METEOROLÓGICAS	
Manhã	Sol
Tarde	Sol
Noite	
<b>Total de dias de chuva no mês:</b>	<b>3</b>

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/OBSERVAÇÕES
Montagem das sapatas;
Prateleiras para o escritório;
Remoção das raízes das plantas;
Limpeza do terreno;

FOTOS

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

<b>Assinatura Contratada:</b> Eng. Civil Daniel Jorge Vanderlei de Moraes	<b>Assinatura Fiscalização:</b>
	



<b>DIÁRIO DE OBRAS</b>		<b>51</b>
		<b>21/08/24</b>
		<b>quarta-feira</b>

Contratante:		Contratada:		INÍCIO DO PRAZO DE EXECUÇÃO	29/11/2023
				INÍCIO DA OBRA	01/07/2024
				PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	870
				ADITIVO DE PRAZO (DIAS)	
				PARALIZAÇÃO CONTRATUAL (DIAS)	64
				FIM DA EXECUÇÃO	20/06/2026
				SALDO DO PRAZO (DIAS)	668

**OBJETO: CONSTRUÇÃO DO RANCHO COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - OBRA**

MÃO-DE-OBRA INDRETA		MÃO-DE-OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Armador/montador	1	Betoneira	1
Mestre de obras	0	Betoneiro	0	Motor vibrador	0
Encarregado	1	Carpinteiro	0	Serra circular de bancada	1
Chefe de escritório	0	Eletricista	0	Martelete rompedor	0
Almoxarife	0	Encanador	0	Serra Circular manual	0
Cozinheiro	0	Pedreiro	1	Andaimes	0
Vigia	0	Servente	3	Furadeira/parafusadeira	0
Estagiário	0	Caçambeiro	0	Esmerilhadeira	0
Técnico de Edificações	0	Operador	0	Moto Serra	0
<b>TOTAL:</b>	<b>2</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>5</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>2</b>

SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos	
EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
	3		3

Paralisação contratual 01:	27/04/2024	30/06/2024	TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	10
			TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	5

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS		
Manhã	Sol	OBSERVAÇÕES:
Tarde	Sol	
Noite		
Total de dias de chuva no mês:	3	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/OBSERVAÇÕES
Montagem das sapatas;
Limpeza mecânica do terreno;
Execução do gabarito;



COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

Assinatura Contratada: Eng. Civil Daniel Jorge Vanderlei de Moraes	Assinatura Fiscalização:

Documento assinado digitalmente



# DIÁRIO DE OBRAS

52  
22/08/24  
quinta-feira

Contratante:		Contratada:		INÍCIO DO PRAZO DE EXECUÇÃO	29/11/2023
				INÍCIO DA OBRA	01/07/2024
				PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	870
				ADITIVO DE PRAZO (DIAS)	
				PARALIZAÇÃO CONTRATUAL (DIAS)	64
				FIM DA EXECUÇÃO	20/06/2026
				SALDO DO PRAZO (DIAS)	667

**OBJETO: CONSTRUÇÃO DO RANCHO COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - OBRA**

MÃO-DE-OBRA INDIRETA		MÃO-DE-OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Armador/montador	1	Betoneira	1
Mestre de obras	0	Betoneiro	0	Motor vibrador	0
Encarregado	1	Carpinteiro	0	Serra circular de bancada	1
Chefe de escritório	0	Eletricista	0	Martelo roedor	0
Almoxarife	0	Encanador	0	Serra Circular manual	0
Cozinheiro	0	Pedreiro	1	Andaimes	0
Vigia	0	Servente	3	Furadeira/parafusadeira	0
Estagiário	0	Cajambeiro	0	Esmerilhadeira	0
Técnico de Edificações	0	Operador	0	Moto Serra	0
<b>TOTAL:</b>	<b>2</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>5</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>2</b>

SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos	
EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
	3		3

Paralisação contratual 01:	27/04/2024	30/06/2024	<b>TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA</b>	<b>10</b>
			<b>TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS</b>	<b>5</b>

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS	
Manhã Sol	OBSERVAÇÕES:
Tarde Sol	
Noite	
Total de dias de chuva no mês: 3	

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/OBSERVAÇÕES**

Montagem das sapatas;  
Conclusão da limpeza mecânica do terreno;  
Execução do gabarito;



**COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO**

A empresa deve corrigir as ART's dos projetos executivos, conforme Ofício Nº 04/2024 enviado em 08/07/2024.  
A empresa deve fornecer a documentação para ao 2º TA, conforme informações passadas na reunião Nº 04/2024.  
Deve-se revisar o projeto de drenagem de águas pluviais.

Assinatura Contratada: Eng. Civil Daniel Jorge Vanderlei de Moraes      Assinatura Fiscalização: \_\_\_\_\_



<b>DIÁRIO DE OBRAS</b>	<b>53</b>
	<b>23/08/24</b>
	<b>sexta-feira</b>

<b>Contratante:</b> 	<b>Contratada:</b> 	<b>INÍCIO DO PRAZO DE EXECUÇÃO</b>	<b>29/11/2023</b>
		<b>INÍCIO DA OBRA</b>	<b>01/07/2024</b>
		<b>PRAZO CONTRATUAL (DIAS)</b>	<b>870</b>
		<b>ADITIVO DE PRAZO (DIAS)</b>	
		<b>PARALIZAÇÃO CONTRATUAL (DIAS)</b>	<b>64</b>
		<b>FIM DA EXECUÇÃO</b>	<b>20/06/2025</b>
		<b>SALDO DO PRAZO (DIAS)</b>	<b>666</b>

**OBJETO: CONSTRUÇÃO DO RANCHO COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - OBRA**

MÃO-DE-OBRA INDIRETA		MÃO-DE-OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Armador/montador	1	Betoneira	1
Mestre de obras	0	Betoneiro	0	Motor vibrador	0
Encarregado	1	Carpinteiro	0	Serra circular de bancada	1
Chefe de escritório	0	Eletricista	0	Martelete rompedor	0
Almoxarife	0	Encanador	0	Serra Circular manual	0
Cozinheiro	0	Pedreiro	1	Andaimes	0
Vigia	0	Servente	3	Furadeira/parafusadeira	0
Estagiário	0	Caçambeiro	0	Esmerilhadeira	0
Técnico de Edificações	0	Operador	0	Moto Serra	0
<b>TOTAL:</b>	<b>2</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>5</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>2</b>

SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos	
EMPRESA	QUANT.	EMPRESA	QUANT.
	3		3

<b>Paralisação contratual 01:</b>	27/04/2024	30/06/2024	<b>TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA</b>	10
			<b>TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS</b>	5

**CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS**

<b>Manhã</b>	Sol	<b>OBSERVAÇÕES:</b>
<b>Tarde</b>	Sol	
<b>Noite</b>		
<b>Total de dias de chuva no mês:</b>	3	

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/OBSERVAÇÕES**

Montagem das sapatas;  
Execução do gabarito;

**FOTOS**

**COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO**

A empresa deve corrigir as ARTs dos projetos executivos, conforme Ofício Nº 04/2024 enviado em 08/07/2024.  
A empresa deve fornecer a documentação para ao 2º TA, conforme informações passadas na reunião Nº 04/2024.  
Deve-se revisar o projeto de drenagem de águas pluviais.

Assinatura Contratada: Eng. Civil Daniel Jorge Vanderlei de Moraes | Assinatura Fiscalização:



DIÁRIO DE OBRAS	54 24/08/24 sábado
-----------------	--------------------------

Contratante:	Contratada:	INÍCIO DO PRAZO DE EXECUÇÃO: 29/11/2023 INÍCIO DA OBRA: 01/07/2024 PRAZO CONTRATUAL (DIAS): 870 ADITIVO DE PRAZO (DIAS): PARALIZAÇÃO CONTRATUAL (DIAS): 64 FIM DA EXECUÇÃO: 20/06/2026 SALDO DO PRAZO (DIAS): 665	
--------------	-------------	---	--

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO RANCHO COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - OBRA

MÃO-DE-OBRA INDIRETA		MÃO-DE-OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	0	Armador/montador	0	Betoneira	0
Mestre de obras	0	Betoneiro	0	Motor vibrador	0
Encarregado	0	Carpinteiro	0	Serra circular de bancada	0
Chefe de escritório	0	Eletricista	0	Martelete rompedor	0
Almoxarife	0	Encanador	0	Serra Circular manual	0
Cozinheiro	0	Pedreiro	0	Andaimes	0
Vigia	0	Servente	0	Furadeira/parafusadeira	0
Estagiário	0	Caçambreiro	0	Esmerilhadeira	0
Técnico de Edificações	0	Operador	0	Moto Serra	0
<b>TOTAL:</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>0</b>

SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS-Equipamentos	
EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
	0		0

Paralisação contratual 01:	27/04/2024	30/06/2024	TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	0
			TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	0

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS		
Manhã	Sol	OBSERVAÇÕES:
Tarde	Sol	
Noite		
Total de dias de chuva no mês:	3	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/OBSERVAÇÕES
Não há serviços em execução

FOTOS

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

Assinatura Contratada: Eng. Civil Daniel Jorge Vanderlei de Moraes      Assinatura Fiscalização: [REDACTED]



DIÁRIO DE OBRAS	55 25/08/24 domingo
-----------------	---------------------------

<b>Contratante:</b> 	<b>Contratada:</b> 	<b>INÍCIO DA OBRA</b> 29/11/2023 <b>PRAZO CONTRATUAL (DIAS)</b> 870 <b>ADITIVO DE PRAZO (DIAS)</b> <b>PARAUZAÇÃO CONTRATUAL (DIAS)</b> 64 <b>FIM DA EXECUÇÃO</b> 20/06/2026 <b>SALDO DO PRAZO (DIAS)</b> 664
--	---	---

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO RANCHO COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - OBRA

MAO-DE-OBRA INDIRETA		MAO-DE-OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	0	Armador /montador	0	Betoneira	0
Mestre de obras	0	Betoneiro	0	Motor vibrador	0
Encarregado	0	Carpinteiro	0	Serra circular de bancada	0
Chefe de escritório	0	Eletricista	0	Martelete rompedor	0
Almoxarife	0	Encanador	0	Serra Circular manual	0
Cozinheiro	0	Pedreiro	0	Andaimes	0
Vigia	0	Servente	0	Furadeira/parafusadeira	0
Estagiário	0	Caçambreiro	0	Esmerilhadeira	0
Técnico de Edificações	0	Operador	0	Moto Serra	0
<b>TOTAL:</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>0</b>

SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos	
EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
	0		0

<b>Paralisação contratual DI:</b>	27/04/2024	30/06/2024	<b>TOTAL GERAL MAO-DE-OBRA</b>	<b>0</b>
			<b>TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS</b>	<b>0</b>

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS		
Manhã	Sol	<b>OBSERVAÇÕES:</b>
Tarde	Sol	
Noite		
<b>Total de dias de chuva no mês:</b>	<b>3</b>	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/OBSERVAÇÕES
Não há serviços em execução

FOTOS

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

Assinatura Contratada: Eng. Civil Daniel Jo [REDACTED]



DIÁRIO DE OBRAS	56
	26/08/24
	segunda-feira

Contratante:		Contratada:		INÍCIO DO PRAZO DE EXECUÇÃO	29/11/2023
				INÍCIO DA OBRA	01/07/2024
				PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	870
				ADITIVO DE PRAZO (DIAS)	
				PARALIZAÇÃO CONTRATUAL (DIAS)	64
				FIM DA EXECUÇÃO	20/06/2026
				SALDO DO PRAZO (DIAS)	663

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO RANCHO COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - OBRA

MÃO-DE-OBRA INDIRETA		MÃO-DE-OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Armador/montador	1	Betoneira	1
Mestre de obras	0	Betoneiro	0	Motor vibrador	0
Encarregado	1	Carpinteiro	0	Serra circular de bancada	1
Chefe de escritório	0	Eletricista	0	Martelete rompedor	0
Almoxarife	0	Encanador	0	Serra Circular manual	0
Cozinheiro	0	Pedreiro	1	Andaimes	0
Vigia	0	Servente	3	Furadeira /parafusadeira a	0
Estagiário	0	Caçambelo	0	Esmerilhadeira	0
Técnico de Edificações	0	Operador	0	Moto Serra	0
<b>TOTAL:</b>	<b>2</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>5</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>2</b>

SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos	
EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
	0		0

Paralisação contratual 01:	27/04/2024	30/06/2024	<b>TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA</b>	<b>7</b>
			<b>TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS</b>	<b>2</b>

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS		
Manhã	Sol	OBSERVAÇÕES:
Tarde	Sol	
Noite		
Total de dias de chuva no mês:	3	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/OBSERVAÇÕES

Montagem do gabarito;  
 Conclusão das montagens - base das sapatas;  
 Montagem da armadura - arraque dos pilares;

FOTOS



COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

A empresa deve corrigir as ARTs dos projetos executivos, conforme Ofício Nº 04/2024 enviado em 08/07/2024.  
 A empresa deve fornecer a documentação para ao 2º TA, conforme informações passadas na reunião Nº 04/2024.  
 Deve-se revisar o projeto de drenagem de águas pluviais.

Assinatura Contratada: Eng. Civil Daniel Jorge Vanderlei de Moraes      Assinatura Fiscalização: \_\_\_\_\_





<b>DIÁRIO DE OBRAS</b>	<b>58</b> <b>28/08/24</b> <b>quarta-feira</b>
------------------------	---

Contratante:		Contratada:		INÍCIO DO PRAZO DE EXECUÇÃO	29/11/2023
				INÍCIO DA OBRA	01/07/2024
				PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	870
				ADITIVO DE PRAZO (DIAS)	
				PARALIZAÇÃO CONTRATUAL (DIAS)	64
				FIM DA EXECUÇÃO	20/06/2026
				SALDO DO PRAZO (DIAS)	661

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO RANCHO COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - OBRA

MÃO-DE-OBRA INDIRETA		MÃO-DE-OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Armador/montador	1	Betoneira	1
Mestre de obras	0	Betoneiro	0	Motor vibrador	0
Encarregado	1	Carpinteiro	0	Serra circular de bancada	1
Chefe de escritório	0	Eletricista	0	Martelete rompedor	0
Almoxarife	0	Encanador	0	Serra Circular manual	0
Cozinheiro	0	Pedreiro	1	Andalimes	0
Vigia	0	Servente	2	Furadeira/parafusadeira	0
Estagiário	0	Caçambeiro	0	Esmerilhadeira	0
Técnico de Edificações	0	Operador	0	Moto Serra	0
<b>TOTAL:</b>	<b>2</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>4</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>2</b>

SUBEMPREENHEITORES - Mão de Obra		SUBEMPREENHEITORES - Equipamentos	
EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
	0		0

Paralisação contratual 01:	27/04/2024	30/06/2024	TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	6
			TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	2

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

Manhã	Sol	OBSERVAÇÕES:
Tarde	Sol	
Noite		
Total de dias de chuva no mês:	3	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/OBSERVAÇÕES

Montagem do gabarito;  
Montagem da armadura - arraque dos pilares;

FOTOS

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

A empresa deve corrigir as ARTs dos projetos executivos, conforme Ofício Nº 04/2024 enviado em 08/07/2024.  
A empresa deve fornecer a documentação para o 2º TA, conforme informações passadas na reunião Nº 04/2024.  
Deve-se revisar o projeto de drenagem de águas pluviais.

Assinatura Contratada: Eng. Civil Daniel Jorge Vanderlei de Moraes      Assinatura Fiscalização:



# DIÁRIO DE OBRAS

**59**  
**29/08/24**  
**quinta-feira**

Contratante: 	Contratada: 	INÍCIO DO PRAZO DE EXECUÇÃO	29/11/2023
		INÍCIO DA OBRA	01/07/2024
		PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	870
		ADITIVO DE PRAZO (DIAS)	
		PARALIZAÇÃO CONTRATUAL (DIAS)	64
		FIM DA EXECUÇÃO	20/06/2026
		SALDO DO PRAZO (DIAS)	660

**OBJETO: CONSTRUÇÃO DO RANCHO COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - OBRA**

MÃO-DE-OBRA INDIRETA		MÃO-DE-OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Armador/montador	1	Betoneira	1
Mestre de obras	0	Betoneiro	0	Motor vibrador	0
Encarregado	1	Carpinteiro	0	Serra circular de bancada	1
Chefe de escritório	0	Eletricista	0	Martelete rompedor	0
Almoxarife	0	Encanador	0	Serra Circular manual	0
Cozinheiro	0	Pedreiro	1	Andaimes	0
Vigia	0	Servente	2	Furadeira/parafusadeira	0
Estajário	0	Caçambelero	0	Esmerilhadeira	0
Técnico de Edificações	0	Operador	0	Moto Serra	0
<b>TOTAL:</b>	<b>2</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>4</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>2</b>

SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos	
EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
	0		0

Paralisação contratual 01:	27/04/2024	30/06/2024	<b>TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA</b>	<b>6</b>	
				<b>TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS</b>	<b>2</b>

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS		
Manhã	Sol	OBSERVAÇÕES:
Tarde	Sol	
Noite		
Total de dias de chuva no mês	3	

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/OBSERVAÇÕES**


Montagem do gabarito;  
Locação da obra  
Montagem da armadura - arraque dos pilares;

**FOTOS**



**COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO**

A empresa deve corrigir as ARTs dos projetos executivos, conforme Ofício Nº 04/2024 enviado em 08/07/2024.  
A empresa deve fornecer a documentação para ao 2º TA, conforme informações passadas na reunião Nº 04/2024.  
Deve-se revisar o projeto de drenagem de águas pluviais.

Assinatura Contratada: Eng. Civil Daniel Jorge Vanderlei de Moraes      Assinatura Fiscalização:  






# DIÁRIO DE OBRAS

**61**  
**31/08/24**  
**sábado**

Contratante: 	Contratada: 	INÍCIO DO PRAZO DE EXECUÇÃO	29/11/2023
		INÍCIO DA OBRA	01/07/2024
		PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	870
		ADITIVO DE PRAZO (DIAS)	
		PARALIZAÇÃO CONTRATUAL (DIAS)	64
		FIM DA EXECUÇÃO	20/06/2026
		SALDO DO PRAZO (DIAS)	658

**OBJETO: CONSTRUÇÃO DO RANCHO COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - OBRA**

MÃO-DE-OBRA INDIRETA		MÃO-DE-OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	0	Armador/montador	0	Betoneira	0
Mestre de obras	0	Betoneiro	0	Motor vibrador	0
Encarregado	0	Carpinteiro	0	Serra circular de bancada	0
Chefe de escritório	0	Eletricista	0	Martelete rompedor	0
Almoxarife	0	Encanador	0	Serra Circular manual	0
Cozinheiro	0	Pedreiro	0	Andaimes	0
Vigia	0	Servente	0	Furadeira/parafusadeira	0
Estagiário	0	Caçambeiro	0	Esmerilhadeira	0
Técnico de Edificações	0	Operador	0	Moto Serra	0
<b>TOTAL:</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>0</b>

SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos	
EMPRESA	QUANT.	EMPRESA	QUANT.
	0		0

Paralisação contratual 01:	27/04/2024	30/06/2024	TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	0
			TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	0

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS			
Manhã	Sol	OBSERVAÇÕES:	
Tarde	Sol		
Noite			
Total de dias de chuva no mês:	3		

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/OBSERVAÇÕES**

Não há serviços em execução

**FOTOS**

**COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO**

Assinatura Contratada: Eng. Civil Daniel Jorge Vanderlei de Morais

Assinatura Fiscalização:

Documento assinado eletronicamente



<b>DIÁRIO DE OBRAS</b>		<b>62</b> <b>01/09/24</b> <b>domingo</b>
------------------------	--	--

Contratante: 	Contratada: 	INÍCIO DO PRAZO DE EXECUÇÃO	29/11/2023
		INÍCIO DA OBRA	01/07/2024
		PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	730
		ADITIVO DE PRAZO (DIAS)	
		PARALIZAÇÃO CONTRATUAL (DIAS)	64
		FIM DA EXECUÇÃO	31/01/2026
		SALDO DO PRAZO (DIAS)	517

**OBJETO: CONSTRUÇÃO DO RANCHO COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - OBRA**

MÃO-DE-OBRA INDIRETA		MÃO-DE-OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	0	Armador/montador	0	Betoneira	0
Mestre de obras	0	Betoneiro	0	Motor vibrador	0
Encarregado	0	Carpinteiro	0	Serra circular de bancada	0
Chefe de escritório	0	Eletricista	0	Martelete rompedor	0
Almoxarife	0	Encanador	0	Serra Circular manual	0
Cozinheiro	0	Pedreiro	0	Andaimes	0
Vigia	0	Servente	0	Furadeira/parafusadeira	0
Estagiário	0	Caçambeiro	0	Esmerilhadeira	0
Técnico de Edificações	0	Operador	0	maquina de solda	0
<b>TOTAL:</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>0</b>

SUBEMPREENHEITORES - Mão de Obra		SUBEMPREENHEITORES - Equipamentos	
EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT

Paralisação contratual 01:	27/04/2024	30/06/2024	TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	0
			TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	0

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS		
Manhã	Sol	OBSERVAÇÕES:
Tarde	Sol	
Noite		
Total de dias de chuva no mês:	3	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/OBSERVAÇÕES
<i>não há serviços em execução</i>

FOTOS

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

Assinatura Contratada: Eng. Civil Daniel Jorge Vanderlei de Moraes DANIEL JORGE <small>Assinado de forma</small>	Assinatura Fiscalização: <small>Documento assinado digitalmente</small>
---	--



# DIÁRIO DE OBRAS

63  
02/09/24  
segunda-feira

Contratante:		Contratada:		INÍCIO DO PRAZO DE EXECUÇÃO	29/11/2023
				INÍCIO DA OBRA	01/07/2024
				PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	730
				ADITIVO DE PRAZO (DIAS)	
				PARALIZAÇÃO CONTRATUAL (DIAS)	64
				FIM DA EXECUÇÃO	31/01/2026
				SALDO DO PRAZO (DIAS)	516

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO RANCHO COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - OBRA

MÃO-DE-OBRA INDIRETA		MÃO-DE-OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Armador/montador	1	Betoneira	1
Mestre de obras	0	Betoneiro	0	Motor vibrador	0
Encarregado	1	Carpinteiro	1	Serra circular de bancada	1
Chefe de escritório	0	Eletricista	0	Martelete rompedor	0
Almoxarife	0	Encanador	0	Serra Circular manual	0
Cozinheiro	0	Pedreiro	1	Andaimes	0
Vigia	0	Servente	2	Furadeira/parafusadeira	0
Estagiário	0	Caçambeiro	0	Esmerilhadeira	0
Técnico de Edificações	0	Operador	0	maquina de solda	0
<b>TOTAL:</b>	<b>2</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>5</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>2</b>

SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos	
EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT

Paralisação contratual 01:	27/04/2024	30/06/2024	TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	7
			TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	2

### CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

Manhã	Sol	OBSERVAÇÕES:
Tarde	Sol	
Noite		
Total de dias de chuva no mês:	3	

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/OBSERVAÇÕES

gabarito da obra;  
Corte e Montagem das armaduras - sapatas e arranque dos pilares

### FOTOS

### COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

O Gabarito da obra que havia sido executado foi removido para a execução da terraplenagem. A empresa tinha inicialmente o planejamento de executar primeiramente as fundações, mas mudou a sequencia das atividades e optou por executar a terraplenagem primeiro.

A empresa deve corrigir as ART:s dos projetos executivos, conforme Ofício Nº 04/2024 enviado em 08/07/2024.

A empresa deve fornecer a documentação para ao 2º TA, conforme informações passadas na reunião Nº 04/2024.

Deve-se revisar o projeto de drenagem de águas pluviais.

Assinatura Contratada: Eng. Civil Daniel Jorge Vanderlei de Moraes	Assinatura Fiscalização:



DIÁRIO DE OBRAS	64 03/09/24 terça-feira
-----------------	-------------------------------

<b>Contratante:</b> 	<b>Contratada:</b> 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>INÍCIO DO PRAZO DE EXECUÇÃO</td><td style="text-align: right;">29/11/2023</td></tr> <tr><td>INÍCIO DA OBRA</td><td style="text-align: right;">01/07/2024</td></tr> <tr><td>PRAZO CONTRATUAL (DIAS)</td><td style="text-align: right;">730</td></tr> <tr><td>ADITIVO DE PRAZO (DIAS)</td><td style="text-align: right;"></td></tr> <tr><td>PARALIZAÇÃO CONTRATUAL (DIAS)</td><td style="text-align: right;">64</td></tr> <tr><td>FIM DA EXECUÇÃO</td><td style="text-align: right;">31/01/2026</td></tr> <tr><td>SALDO DO PRAZO (DIAS)</td><td style="text-align: right;">515</td></tr> </table>	INÍCIO DO PRAZO DE EXECUÇÃO	29/11/2023	INÍCIO DA OBRA	01/07/2024	PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	730	ADITIVO DE PRAZO (DIAS)		PARALIZAÇÃO CONTRATUAL (DIAS)	64	FIM DA EXECUÇÃO	31/01/2026	SALDO DO PRAZO (DIAS)	515
INÍCIO DO PRAZO DE EXECUÇÃO	29/11/2023															
INÍCIO DA OBRA	01/07/2024															
PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	730															
ADITIVO DE PRAZO (DIAS)																
PARALIZAÇÃO CONTRATUAL (DIAS)	64															
FIM DA EXECUÇÃO	31/01/2026															
SALDO DO PRAZO (DIAS)	515															

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO RANCHO COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - OBRA

MÃO-DE-OBRA INDIRETA		MÃO-DE-OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Armador/montador	1	Betoneira	1
Mestre de obras	0	Betoneiro	0	Motor vibrador	0
Encarregado	1	Carpinteiro	1	Serra circular de bancada	1
Chefe de escritório	0	Eletricista	0	Martelete rompedor	0
Almoxarife	0	Encanador	0	Serra Circular manual	0
Cozinheiro	0	Pedreiro	1	Andaimes	0
Vigia	0	Servente	2	Furadeira/parafusadeira	0
Estagiário	0	Capombeiro	0	Esmerilhadeira	0
Técnico de Edificações	0	Operador	0	maquina de solda	0
<b>TOTAL:</b>	<b>2</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>5</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>2</b>

SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos	
EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
RB NIVELAR	3	RB NIVELAR	3

<b>Paralização contratual 01:</b>	27/04/2024	30/06/2024	<b>TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA</b>	<b>10</b>
			<b>TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS</b>	<b>5</b>

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Manhã</td><td style="text-align: center;">Sol</td></tr> <tr><td>Tarde</td><td style="text-align: center;">Sol</td></tr> <tr><td>Noite</td><td style="text-align: center;"></td></tr> <tr><td>Total de dias de chuva no mês:</td><td style="text-align: center;">3</td></tr> </table>	Manhã	Sol	Tarde	Sol	Noite		Total de dias de chuva no mês:	3	OBSERVAÇÕES:
Manhã	Sol								
Tarde	Sol								
Noite									
Total de dias de chuva no mês:	3								


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/OBSERVAÇÕES

Corte e Montagem das armaduras - sapatas e arranque dos pilares;  
 Pintura do barracão - faixa azul;  
 Serviços de Terraplanagem;



COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

Houve o recebimento de 22 carradas de aterro, 264,00 m³  
 A empresa deve corrigir as ARTs dos projetos executivos, conforme Ofício Nº 04/2024 enviado em 08/07/2024.  
 A empresa deve fornecer a documentação para ao 2º TA, conforme informações passadas na reunião Nº 04/2024.  
 Deve-se revisar o projeto de drenagem de águas pluviais.

Assinatura Contratada: Eng. Civil Daniel Jorge Vanderlei de Moraes	Assinatura Fiscalização:
	



<b>DIÁRIO DE OBRAS</b>		<b>64</b>
		<b>04/09/24</b>
		<b>quarta-feira</b>

Contratante: 	Contratada: 	NÍCIO DO PRAZO DE EXECUÇÃO	29/11/2023
		NÍCIO DA OBRA	01/07/2024
		PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	730
		ADITIVO DE PRAZO (DIAS)	
		PARALIZAÇÃO CONTRATUAL (DIAS)	64
		FIM DA EXECUÇÃO	31/01/2026
		SALDO DO PRAZO (DIAS)	5 1 4

**OBJETO: CONSTRUÇÃO DO RANCHO COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - OBRA**

MÃO-DE-OBRA INDIRETA		MÃO-DE-OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Armador /montador	1	Betoneira	1
Mestre de obras	0	Betoneiro	0	Motor vibrador	0
Encarregado	1	Carpinteiro	1	Serra circular de bancada	1
Chefe de escritório	0	Eletricista	0	Martelete rompedor	0
Almoxarife	0	Encanador	0	Serra Circular manual	0
Cozinheiro	0	Pedreiro	1	Andaimes	0
Vigia	0	Servente	2	Furadeira/parafusadeira	0
Estagiário	0	Caçambeiro	0	Esmerilhadeira	0
Técnico de Edificações	0	Operador	0	maquina de solda	0
<b>TOTAL:</b>	<b>2</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>5</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>2</b>

SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS -Equipamentos	
EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
RB NIVELAR	3	RB NIVELAR	3

Paralisação contratual 01:	27/04/2024	30/06/2024	<b>TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA</b>	<b>10</b>
			<b>TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS</b>	<b>5</b>

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS		
Manhã	Sol	OBSERVAÇÕES:
Tarde	Sol	
Noite		
Total de dias de chuva no mês:	3	


**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/OBSERVAÇÕES**

Corte e Montagem das armaduras -sapatas e arranque dos pilares;  
Recebimento do material terraplenagem

**FOTOS**

**COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO**

Houve o recebimento de 22 carradas de aterro, 264,00 m<sup>3</sup>  
A fiscalização observou a retroscavadeira espalhando o material de aterro. Foi indicada a paralisação do serviço, uma vez que a compactação do subleito precede a compactação das camadas. Deve-se ainda realizar uma raspagem com a motoniveladora do material arenoso existente.  
A empresa deve corrigir as ARTs dos projetos executivos, conforme Ofício Nº 04/2024 enviado em 08/07/2024.  
A empresa deve fornecer a documentação para o 2º TA, conforme informações passadas na reunião Nº 04/2024.  
Deve-se revisar o projeto de drenagem de águas pluviais.

Assinatura Contratada: Eng. Civil Daniel Jorge Vanderlei de Moraes	Assinatura Fiscalização:
	



DIÁRIO DE OBRAS	64 05/09/24 quinta-feira
-----------------	--------------------------------

<b>Contratante:</b> 	<b>Contratada:</b> 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>INÍCIO DO PRAZO DE EXECUÇÃO</td><td style="text-align: right;">29/11/2023</td></tr> <tr><td>INÍCIO DA OBRA</td><td style="text-align: right;">01/07/2024</td></tr> <tr><td>PRAZO CONTRATUAL (DIAS)</td><td style="text-align: right;">730</td></tr> <tr><td>ADITIVO DE PRAZO (DIAS)</td><td style="text-align: right;"></td></tr> <tr><td>PARALIZAÇÃO CONTRATUAL (DIAS)</td><td style="text-align: right;">64</td></tr> <tr><td>FIM DA EXECUÇÃO</td><td style="text-align: right;">31/01/2026</td></tr> <tr><td>SALDO DO PRAZO (DIAS)</td><td style="text-align: right;">513</td></tr> </table>	INÍCIO DO PRAZO DE EXECUÇÃO	29/11/2023	INÍCIO DA OBRA	01/07/2024	PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	730	ADITIVO DE PRAZO (DIAS)		PARALIZAÇÃO CONTRATUAL (DIAS)	64	FIM DA EXECUÇÃO	31/01/2026	SALDO DO PRAZO (DIAS)	513
INÍCIO DO PRAZO DE EXECUÇÃO	29/11/2023															
INÍCIO DA OBRA	01/07/2024															
PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	730															
ADITIVO DE PRAZO (DIAS)																
PARALIZAÇÃO CONTRATUAL (DIAS)	64															
FIM DA EXECUÇÃO	31/01/2026															
SALDO DO PRAZO (DIAS)	513															

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO RANCHO COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - OBRA

MÃO-DE-OBRA INDIRETA		MÃO-DE-OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Armador/montador	1	Betoneira	1
Mestre de obras	0	Betoneiro	0	Motor vibrador	0
Encarregado	1	Carpinteiro	1	Serra circular de bancada	1
Chefe de escritório	0	Eletricista	0	Martelete rompedor	0
Almoxarife	0	Encanador	0	Serra Circular manual	0
Cozinheiro	0	Pedreiro	1	Andaimes	0
Vigia	0	Servente	2	Furadeira/parafusadeira	0
Estagiário	0	Caçambreiro	0	Esmerilhadeira	0
Técnico de Edificações	0	Operador	0	maquina de solda	0
<b>TOTAL:</b>	<b>2</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>5</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>2</b>


SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos	
EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
RB NIVELAR	3		

<b>Paralização contratual 01:</b>	27/04/2024	30/06/2024	<b>TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA</b>	<b>10</b>
			<b>TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS</b>	<b>2</b>

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS	
Manhã	Sol
Tarde	Sol
Noite	
Total de dias de chuva no mês:	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/OBSERVAÇÕES

Corte e Montagem das armaduras - sapatas e arranque dos pilares;  
 Recebimento do material terraplenagem

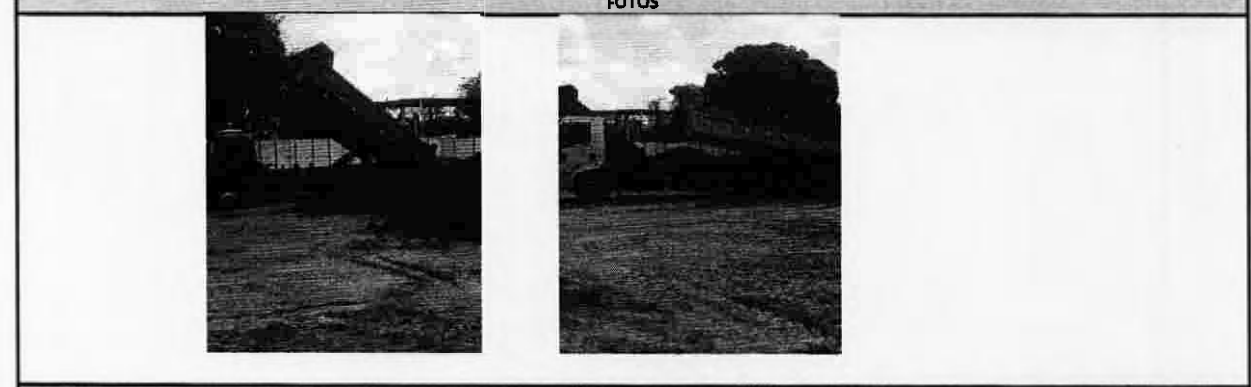

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

Houve o recebimento de 15 carradas de aterro, 180,00 m<sup>3</sup>  
 A empresa deve corrigir as ARTs dos projetos executivos, conforme Ofício Nº 04/2024 enviado em 08/07/2024.  
 A empresa deve fornecer a documentação para ao 2º TA, conforme informações passadas na reunião Nº 04/2024.  
 Deve-se revisar o projeto de drenagem de águas pluviais.

Assinatura Contratada: Eng. Civil Daniel Jorge Vanderlei de Moraes	Assinatura Fiscalização:



# DIÁRIO DE OBRAS

**65**  
**06/09/24**  
**sexta-feira**

<b>Contratante:</b> 	<b>Contratada:</b> 	<b>INÍCIO DO PRAZO DE EXECUÇÃO</b>	<b>29/11/2023</b>
		<b>INÍCIO DA OBRA</b>	<b>01/07/2024</b>
		<b>PRAZO CONTRATUAL (DIAS)</b>	<b>730</b>
		<b>ADITIVO DE PRAZO (DIAS)</b>	
		<b>PARALIZAÇÃO CONTRATUAL (DIAS)</b>	<b>64</b>
		<b>FIM DA EXECUÇÃO</b>	<b>31/01/2026</b>
		<b>SALDO DO PRAZO (DIAS)</b>	<b>512</b>

**OBJETO: CONSTRUÇÃO DO RANCHO COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - OBRA**

MÃO-DE-OBRA INDIRETA		MÃO-DE-OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Armador/montador	1	Betoneira	1
Mestre de obras	0	Betoneiro	0	Motor vibrador	0
Encarregado	1	Carpinteiro	1	Serra circular de bancada	1
Chefe de escritório	0	Eletricista	0	Martelete rompedor	0
Almoxarife	0	Encanador	0	Serra Circular manual	0
Cozinheiro	0	Pedreiro	1	Andaimes	0
Vigia	0	Servente	2	Furadeira/parafusadeira	0
Estagiário	0	Caçambeiro	0	Esmerilhadeira	0
Técnico de Edificações	0	Operador	0	maquina de solda	0
<b>TOTAL:</b>	<b>2</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>5</b>	<b>T O T A L:</b>	<b>2</b>

SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos	
EMPRESA	QUANT.	EMPRESA	QUANT.
RB NIVELAR	3		

<b>Paralisação contratual 01:</b>	27/04/2024	30/06/2024	<b>TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA</b>	<b>10</b>
			<b>TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS</b>	<b>2</b>

**CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS**

Manhã	Sol	<b>OBSERVAÇÕES:</b>
Tarde	Sol	
Noite		
<b>Total de dias de chuva no mês:</b>		


**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/OBSERVAÇÕES**

Corte e Montagem das armaduras - sapatas e arranque dos pilares;  
Recebimento do material terraplenagem

**FOTOS**

**COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO**

Houve o recebimento de 7 carradas de aterro, 84,00 m<sup>3</sup>  
A empresa deve corrigir as ARTs dos projetos executivos, conforme Ofício Nº 04/2024 enviado em 08/07/2024.  
A empresa deve fornecer a documentação para ao 2º TA, conforme informações passadas na reunião Nº 04/2024.  
Deve-se revisar o projeto de drenagem de águas pluviais.

<b>Assinatura Contratada:</b> Eng. Civil Daniel Jorge Vanderlei de Moraes	<b>Assinatura Fiscalização:</b>
	



DIÁRIO DE OBRAS	66
	07/09/24
	sábado

Contratante:	Contratada:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>INÍCIO DO PRAZO DE EXECUÇÃO</td><td style="text-align: right;">29/11/2023</td></tr> <tr><td>INÍCIO DA OBRA</td><td style="text-align: right;">01/07/2024</td></tr> <tr><td>PRAZO CONTRATUAL (DIAS)</td><td style="text-align: right;">730</td></tr> <tr><td>ADITIVO DE PRAZO (DIAS)</td><td></td></tr> <tr><td>PARALIZAÇÃO CONTRATUAL (DIAS)</td><td style="text-align: right;">64</td></tr> <tr><td>FIM DA EXECUÇÃO</td><td style="text-align: right;">31/01/2026</td></tr> <tr><td>SALDO DO PRAZO (DIAS)</td><td style="text-align: right;">511</td></tr> </table>	INÍCIO DO PRAZO DE EXECUÇÃO	29/11/2023	INÍCIO DA OBRA	01/07/2024	PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	730	ADITIVO DE PRAZO (DIAS)		PARALIZAÇÃO CONTRATUAL (DIAS)	64	FIM DA EXECUÇÃO	31/01/2026	SALDO DO PRAZO (DIAS)	511
INÍCIO DO PRAZO DE EXECUÇÃO	29/11/2023															
INÍCIO DA OBRA	01/07/2024															
PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	730															
ADITIVO DE PRAZO (DIAS)																
PARALIZAÇÃO CONTRATUAL (DIAS)	64															
FIM DA EXECUÇÃO	31/01/2026															
SALDO DO PRAZO (DIAS)	511															

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO RANCHO COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - OBRA

MÃO-DE-OBRA INDIRETA		MÃO-DE-OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	0	Armador/montador	0	Betoneira	0
Mestre de obras	0	Betoneiro	0	Motor vibrador	0
Encarregado	0	Carpinteiro	0	Serra circular de bancada	0
Chefe de escritório	0	Eletricista	0	Martelete rompedor	0
Almoxarife	0	Encanador	0	Serra Circular manual	0
Cozinheiro	0	Pedreiro	0	Andaimes	0
Vigia	0	Servente	0	Furadeira/parafusadeira	0
Estagiário	0	Caçambeiro	0	Esmerilhadeira	0
Técnico de Edificações	0	Operador	0	maquina de solda	0
<b>TOTAL:</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>0</b>

SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos	
EMPRESA	QUANT.	EMPRESA	QUANT.
0	0		

Paralisação contratual 01:	27/04/2024	30/06/2024	TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	0
			TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	0

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS		
Manhã	Sol	OBSERVAÇÕES:
Tarde	Sol	
Noite		
Total de dias de chuva no mês:		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/OBSERVAÇÕES
Não há serviços em execução

FOTOS

COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

Assinatura Contratada: Eng. Civil Daniel Jorge [REDACTED]





# DIÁRIO DE OBRAS

68  
09/09/24  
segunda-feira

Contratante: 	Contratada: 	INÍCIO DO PRAZO DE EXECUÇÃO	29/11/2023
		INÍCIO DA OBRA	01/07/2024
		PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	730
		ADITIVO DE PRAZO (DIAS)	
		PARALIZAÇÃO CONTRATUAL (DIAS)	64
		FIM DA EXECUÇÃO	31/01/2026
		SALDO DO PRAZO (DIAS)	509

## OBJETO: CONSTRUÇÃO DO RANCHO COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - OBRA

MÃO-DE-OBRA INDIRETA		MÃO-DE-OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Armador/montador	1	Betoneira	1
Mestre de obras	0	Betoneiro	0	Motor vibrador	0
Encarregado	1	Carjiteiro	1	Serra circular de bancada	1
Chefe de escritório	0	Eletricista	0	Martelete rompedor	0
Almoxarife	0	Encanador	0	Serra Circular manual	0
Cozinheiro	0	Pedreiro	0	Andaimes	0
Vigia	0	Servente	2	Furadeira/parafusadeira	0
Estagiário	0	Caçambreiro	0	Esmerilhadeira	0
Técnico de Edificações	0	Operador	0	maquina de solda	0
<b>TOTAL:</b>	<b>2</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>4</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>2</b>

SUBEMPREENHEITOS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEITOS - Equipamentos	
EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT


Paralisação contratual 01:	27/04/2024	30/06/2024	TOTAL GERAL MÃO-DE-OBRA	6
			TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	2

### CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS

Manhã	Sol	OBSERVAÇÕES:
Tarde	Sol	
Noite		
Total de dias de chuva no mês:	3	


### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/OBSERVAÇÕES

Montagem das armaduras - Vigas baldrame;  
Fôrmas das sapatas;

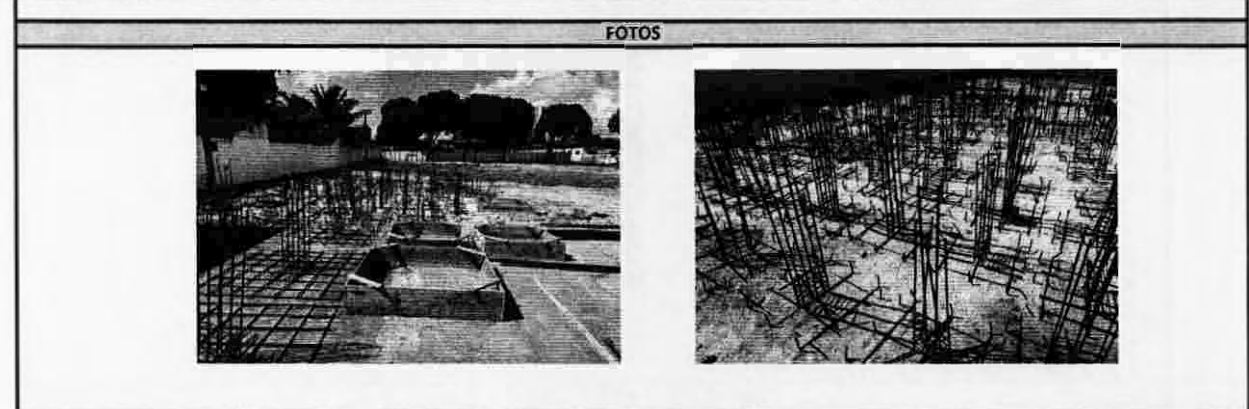

### COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

Não houve recebimento do material de terraplenagem.  
Foi enviada planilha de quantitativos para aprovação da 4ª Medição dos serviços.  
A empresa deve corrigir as ARTs dos projetos executivos, conforme Ofício Nº 04/2024 enviado em 08/07/2024.  
A empresa deve fornecer a documentação para ao 2º TA, conforme informações passadas na reunião Nº 04/2024.  
Deve-se revisar o projeto de drenagem de águas pluviais.

Assinatura Contratada: Eng. Civil Daniel Jorge Vanderlei de Moraes	Assinatura Fiscalização:	<small>Documento assinado digitalmente</small>
		



DIÁRIO DE OBRAS	69
	10/09/24
	terça-feira

Contratante:	Contratada:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>INÍCIO DO PRAZO DE EXECUÇÃO</td> <td style="text-align: right;">29/11/2023</td> </tr> <tr> <td>INÍCIO DA OBRA</td> <td style="text-align: right;">01/07/2024</td> </tr> <tr> <td>PRAZO CONTRATUAL (DIAS)</td> <td style="text-align: right;">730</td> </tr> <tr> <td>ADITIVO DE PRAZO (DIAS)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PARALIZAÇÃO CONTRATUAL (DIAS)</td> <td style="text-align: right;">64</td> </tr> <tr> <td>FIM DA EXECUÇÃO</td> <td style="text-align: right;">31/01/2026</td> </tr> <tr> <td>SALDO DO PRAZO (DIAS)</td> <td style="text-align: right;">508</td> </tr> </table>	INÍCIO DO PRAZO DE EXECUÇÃO	29/11/2023	INÍCIO DA OBRA	01/07/2024	PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	730	ADITIVO DE PRAZO (DIAS)		PARALIZAÇÃO CONTRATUAL (DIAS)	64	FIM DA EXECUÇÃO	31/01/2026	SALDO DO PRAZO (DIAS)	508
INÍCIO DO PRAZO DE EXECUÇÃO	29/11/2023															
INÍCIO DA OBRA	01/07/2024															
PRAZO CONTRATUAL (DIAS)	730															
ADITIVO DE PRAZO (DIAS)																
PARALIZAÇÃO CONTRATUAL (DIAS)	64															
FIM DA EXECUÇÃO	31/01/2026															
SALDO DO PRAZO (DIAS)	508															

OBJETO: RECONSTRUÇÃO DO RANCHO COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA - OBRA

MÃO-DE-OBRA INDIRETA		MÃO-DE-OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.	DESCRIÇÃO	QUANT.
Engenheiro Civil	1	Armador/montador	1	Betoneira	1
Mestre de obras	0	Betoneiro	0	Motor vibrador	0
Encarregado	1	Carpinteiro	1	Serra circular de bancada	1
Chefe de escritório	0	Eletricista	0	Martelete rompedor	0
Almoxarife	0	Encanador	0	Serra Circular manual	0
Cozinheiro	0	Pedreiro	1	Andaimes	0
Vigia	0	Servente	2	Furadeira/parafusadeira	0
Estajário	0	Caçambeiro	0	Esmerilhadeira	0
Técnico de Edificações	0	Operador	0	maquina de solda	0
<b>TOTAL:</b>	<b>2</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>5</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>2</b>

SUBEMPREENHEIROS - Mão de Obra		SUBEMPREENHEIROS - Equipamentos	
EMPRESA	QUANT	EMPRESA	QUANT
RB NIVELAR	3		

Paralisação contratual 01:	27/04/2024	30/06/2024	TOTAL GERAL MÃO -DE-OBRA	10
			TOTAL GERAL EQUIPAMENTOS	2

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS		
Manhã	Sol	OBSERVAÇÕES:
Tarde	Sol	
Noite		
Total de dias de chuva no mês:	3	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/OBSERVAÇÕES

Montagem das armaduras - Vigas baldrame;  
Fôrmas das sapatas;



COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO

Não houve recebimento do material de terraplenagem.  
A empresa deve corrigir as ARTs dos projetos executivos, conforme Ofício Nº 04/2024 enviado em 08/07/2024.  
A empresa deve fornecer a documentação para ao 2º TA, conforme informações passadas na reunião Nº 04/2024.  
Deve-se revisar o projeto de drenagem de águas pluviais.

Assinatura Contratada: Eng. Civil Daniel Jorge Vanderlei de Moraes	Assinatura Fiscalização:

Data da consulta: 12/09/2024 11:24:14



## Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **18.914.388/0001-00**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **R&M CONSTRUTORA LTDA**

## Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2015**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)
