



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS (POR ANEXAÇÃO)

Aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro, faço anexar aos autos do processo nº **64278.014857/2022-80**, referente a **Tomada de Preços nº 5/2022**, do Comando do 1º Grupamento de Engenharia, conforme os documentos abaixo descritos:

- 1) 17ª Medição, de 14 de outubro de 2024FL 3422 a 3471
- 2) Nota Fiscal nº 357Fl 3472

Quartel em João Pessoa, PB, 29 de outubro de 2024.

Adjunto da Seção de Fiscaliz[REDACTED]amento de Engenharia



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
(1º Grupamento de Engenharia/1955)
GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES

17ª MEDIÇÃO

Contratada Razão Social/ CNPJ		Endereço completo – Dados de contato	
G2 CONSTRUTORA EIRELLI CNPJ 09.145.367/0001-78		RUA VISCONDE DE JEQUITINHONHA 3732, LOJA 002, BOA VIAGEM/RECIFE	
Modalidade	Nº/Ano	NUP	
TOMADA DE PREÇO	005/2022		
Objeto		OM Beneficiária – Endereço – Localidade – UF	
Reforma das Instalações Hidrossanitárias do Ed. Villagran Cabrita		COMANDO DA 10ª REGIÃO MILITAR- FOTALEZA/CE	
Contrato nº / Ano / Data	Execução (330 dias) Conforme Ordem de Serviço nº 13/2020	Vigência (510 dias)	
001/2023	16Jan23 a 19Nov23	16Jan23 a 16Jan24	
Aditivo nº / Ano / Data	Prazo/ Valor	Aditivo nº / Ano / Data	Prazo / Valor
-	-	-	-

2. DADOS DO PAGAMENTO

a) VALOR CONTRATADO: R\$	3.144.483,73	IM: IM07OM488
b) NOTA DE EMPENHO	2022NE004085/ 2023NE000736/ 2024NE000046 / 167176	29/12/2022 e DATA 29/03/2023 18 /04/2024
c) VALOR ADITIVO: R\$	-	
d) VALOR EMPENHADO: R\$	3.144.483,73	
e) NOTA FISCAL Nº 357	DATA DA EMISSÃO: 11Out24	
f) VALOR: R\$ 156.505,42		

3. DADOS BANCÁRIOS

BANCO: [REDACTED]	AGÊNCIA: [REDACTED]	C/CNo: [REDACTED]
VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 156.505,42	ACUMULADO: R\$ 1.490.695,51	SALDO: R\$ 1.653.787,22

Aprovado - SOM/Cmdo 1º Gpt E

Chefe da


nharia

Autorizo o pagamento:

19 de outubro de 2024

Ordenador de

engenharia

**Redesim - Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios****Dados da Pessoa Jurídica**

NOME EMPRESARIAL

G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA

PORTE

EPP

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

09.145.367/0001-78

ESTABELECIMENTO

Matriz

DATA DE ABERTURA

23/10/2007

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

G2 MERCANTIL

SITUAÇÃO CADASTRAL

Ativa

DATA SITUAÇÃO CADASTRAL

23/10/2007

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA SITUAÇÃO ESPECIAL

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

ENDEREÇO

RUA VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732 LOJA 0002, BOA VIAGEM, CEP 51130-020, 2531-PE

ENDEREÇO ELETRÔNICO

G2SERVI@GMAIL.COM

TELEFONE

34612957

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

4321-5/00- Instalação e manutenção elétrica

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

4120-4/00 - Construção de edifícios**4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos****4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas****4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica****4221-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações****4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação****4292-8/02 - Obras de montagem industrial****4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás****4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração****4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil****4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material****4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque****4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral**Emitido por **POLIANNE KARINE SOARES SANTANA (05160252444)** no dia **02/05/2024** às **20:08:50** (data e hora de Brasília).

Fonte: Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220611434/2024

Emissão: 07/10/2024

Validade: 31/10/2024

Chave: 3A37d

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco



CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - CREA-PE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA

CNPJ: 09.145.367/0001-78

Registro: 0000051127

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 280.000,00

Data do Capital: 22/07/2010

Faixa: 3

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANTÁRIAS E DE GÁS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: AS ATIVIDADES DA EMPRESA FICAM RESTRITAS AS ATRIBUIÇÕES DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Endereço Matriz: AVENIDA VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 3732, LOJA 0002, BOA VIAGEM, RECIFE, PE, 51130020

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 10/09/2009

Data Final: Indefinido

Registro Regional: PE013602

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de AUTO em Aberto 8306402751. Data de vencimento do boleto: 31/10/2024
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (6/6)

Autos de Infração

9900047535/2020

Quantidade de Parcelas Pagas: 6/72

9900047531/2020

Quantidade de Parcelas Pagas: 6/72

Responsáveis Técnicos

Profissional: [REDACTED]

Registro: [REDACTED]

CPF: [REDACTED]

Data Início: 05/05/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGO 33 DO DECRETO Nº 23.569/33.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: [REDACTED]

Registro: [REDACTED]

CPF: [REDACTED]

Data Início: 27/12/2016

Data Fim: Indefinido





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220611434/2024

Emissão: 07/10/2024

Validade: 31/10/2024

Chave: 3A37d



Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA LEI Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS
NO ARTIGO 28, EXCETO ALÍNEA 9ª DO DECRETO 23.569/33 E ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA, EXCETO
PORTOS, RIOS, CANAIS, BARRAGENS, DIQUES E AEROPORTOS.

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA
CNPJ: 09.145.367/0001-78

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 07:40:21 do dia 25/04/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/10/2024.

Código de controle da certidão: **9C7C.9911.8180.7883**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - EPP**

CPF/CNPJ: **09.145.367/0001-78**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 13:51:28 do dia 08/10/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 8L70081024135128

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO
Pernambuco

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2024.000007867668-04

Data de Emissão: 05/09/2024

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 09.145.367/0001-78

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **03/12/2024** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.

OBSERVAÇÕES: NÃO INFORMADO



SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO

Pernambuco

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Número: 2024.000007791309-32

Data de Emissão: 02/09/2024

DADOS DO CONTRIBUINTE

Nome/ Razão Social: G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA -EPP

Endereço: RUA VISCONDE DE JEQUITINHONHA 3732 LOJA 0002, s/n

Bairro: BOA VIAGEM

Município: RECIFE

Inscrição Estadual: 0359105-00

CNPJ: 09.145.367/0001-78

CNAE Principal: 4321-5/00

CEP: 51.130-020

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o contribuinte supra identificado não possui débitos em situação irregular inscritos na Dívida Ativa do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido contribuinte.

Esta Certidão é válida até 30/11/2024, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" do Site www.sefaz.pe.gov.br.

OBS: Inválida para Licitação Pública. A certidão válida para Licitação Pública, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, é a Certidão de Regularidade Fiscal.



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
Secretaria Executiva de Tributação

Nº da Certidão
141620622



Certidão Negativa **Débitos Fiscais**

1. Denominação Social/Nome

G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA

2 CMC

751.120-5

3. Endereço

Rua Visconde de Jequitinhonha, 3732 LOJA 0002LOJA 0002
BAIRRO Boa Viagem, CEP 51130-020, RECIFE-PE

4. CNPJ/CPF

09.145.367/0001-78

5. Atividade Econômica

4120-40-0 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211-10-2 PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4213-80-0 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221-90-3 MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4221-90-4 CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES
4222-70-1 CONST DE REDES DE ABAST DE ÁGUA, COL DE ESGOT E CONST CORREL, EXC OBRAS DE IRRIGA
4292-80-2 OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
4321-50-0 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322-30-2 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SIST CENTRAIS DE AR CONDIC, DE VENTIL E REFRIGERAÇÃO
4330-40-1 IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330-40-2 INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁR EMBUT DE QUALQ MATERIAL
4330-40-3 OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
4330-40-4 SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4322-30-1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS

6. Descrição

Certifico, de acordo com a legislação em vigor e em conformidade com os registros cadastrais / fiscais, nesta data, que o contribuinte de que trata a presente certidão está regularizado com o erário municipal no que concerne aos lançamentos relativos aos tributos municipais.

7. Ressalva

* * * * *

8. Validade/Autenticidade

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de sua expedição e sua autenticidade deverá ser confirmada na página <http://recifeemdia.recife.pe.gov.br/certidoes>

Certidão equivalente ao Certificado de Regularidade Fiscal, nos termos da Lei 8.666/93 e abrange as esferas administrativa e judicial (dívida ativa)

A Prefeitura do Recife poderá cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado, que vierem a ser apuradas.

9. Código de Autenticidade

531.4349.9476

10. Expedida em

Recife, 08 de OUTUBRO de 2024

11. Certidão emitida com base nos pagamentos registrados até

04 de OUTUBRO de 2024



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.145.367/0001-78
Certidão nº: 60197002/2024
Expedição: 02/09/2024, às 17:41:58
Validade: 01/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.145.367/0001-78**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho. No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS-CRF****Inscrição:** 09.145.367/0001-78**Razão**

G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL

Social:**Endereço:**RUA RUA SILVIA FERREIRA 390 SALA 103 664 / PIEDADE / JABOATAO
DOS GUARARAPES / PE / 54400-220

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/09/2024 a 22/10/2024**Certificação Número:** 2024092321171496482304

Informação obtida em 08/10/2024 14:22:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Data da consulta: 15/10/2024 10:28:59



Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 09.145.367/0001-78

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2022**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



DECLARAÇÃO

A empresa **G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ n. 09.145.367/0001-78, declara para os devidos que na folha de pagamento constam os nomes dos trabalhadores atualizados direta e indiretamente na execução dos serviços do contrato 01-2023 (**EXECUÇÃO DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA, EM FORTALEZA/ CE**)

Assinatura

G2 Construção e Manutenção Industrial LTDA



RG: [REDACTED] Qualificação : Sócia



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDL LTDA EPP
Folha de Pagamento

Folha Mensal

Página: 1
Data: 05/09/2024
Hora: 17:04:46

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 08/2024

Funcionário: 3 [REDACTED]			Adm: 09/10/2013		Função: ENCARREGADO DE O			
DEPARTAMENTO: GERAL								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001	SALARIO NORMAL	31/31	3.331,55	00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0,49	
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,43	00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO		1.332,62	
00943	ABONO SALARIAL		158,62	00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		199,89	
				00080	DESCONTO INSS		298,60	
Salário Base:		3.331,55	Base de INSS Funcionário:		3.331,55	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		1.998,93	Base INSS Empresa:		3.331,55	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		564,80	Base Terceiros:		3.331,55	Base de FGTS:		3.331,55
Base de Líquida de IRRF:		1.434,13	Base RAT:		3.331,55	Valor do FGTS:		266,52
Total de Vencimentos:		3.490,60	Total de Descontos:		1.831,60	Líquido a Receber:		1.659,00

Funcionário: 28 [REDACTED]			Adm: 02/01/2020		Função: AJUDANTE DE PEDR			
DEPARTAMENTO: GERAL								
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001	SALARIO NORMAL	31/31	1.623,60	00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		1,14	
00020	SALARIO FAMÍLIA	1	62,04	00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO		649,44	
00023	ARREDONDAMENTO DO MES		0,29	00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		97,41	
00943	ABONO SALARIAL		77,00	00080	DESCONTO INSS		124,94	
Salário Base:		1.623,60	Base de INSS Funcionário:		1.623,60	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		974,16	Base INSS Empresa:		1.623,60	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		564,80	Base Terceiros:		1.623,60	Base de FGTS:		1.623,60
Base de Líquida de IRRF:		409,36	Base RAT:		1.623,60	Valor do FGTS:		129,88
Total de Vencimentos:		1.762,93	Total de Descontos:		872,93	Líquido a Receber:		890,00

Funcionário: 63 - ███		
---	--	--

Funcionário: 65 [REDACTED]			Adm: 22/05/2023		Dem: 16/08/2024		Função: OPERAD DE GUINDA	
DEPARTAMENTO: GERAL								
Vencimentos			Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00150 AVISO PREVIO INDENIZADO			33/33	1.716,00	00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			0,51
00152 13 SAL PROPORCIONAL			08/12	1.040,00	00027 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO			624,00
00160 FERIAS VENCIDAS NORMAL			12/12	1.560,00	00080 DESCONTO INSS			62,40
00167 FERIAS PROPORCIONAIS			03/12	390,00	00180 LIQUIDO RESCISÃO			5.716,67
00175 SÁLDO DE SÁLARIOS			16/30	832,00	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO			87,75
00190 13 SALARIO INDENIZADO			01/12	130,00				
00979 FÉRIAS INDENIZADAS			01/12	130,00				
00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP.			33,3333%	173,33				
00997 ADICIONAL S/ FERIAS VENCIDAS			33,3333%	520,00				
DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO								
Base FGTS sem 13º		2.678,00	Base FGTS do 13º:		1.040,00	Multa Rescisória:		118,97
Valor FGTS sem 13º:		214,24	Valor FGTS do 13º:		83,20			
Base FGTS mês:		0,00	Base FGTS mês anterior:		0,00			
Valor FGTS mês:		0,00	Valor FGTS mês anterior:		0,00			
Salário Base:		1.560,00	Base de INSS Funcionário:		2.002,00	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		208,00	Base INSS Empresa:		2.002,00	Horas Semanais:		44
Dedução Simplificada IRRF:		564,80	Base Terceiros:		2.002,00	Base de FGTS:		0,00
Base de Liquida de IRRF:		0,00	Base RAT:		2.002,00	Valor do FGTS:		0,00
Total de Vencimentos:		6.491,33	Total de Descontos:		6.491,33	Líquido a Receber:		0,00

Funcionário: 14 [REDACTED]			Adm: 09/04/2019		Função: AJUDANTE DE PEDR		
DEPARTAMENTO:GERAL							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDL LTDA EPP
Folha de Pagamento

Folha Mensal

Página: 2
Data: 05/09/2024
Hora: 17:04:48

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 08/2024

00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.623,60	00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	1,43
00023 ARREDONDAMENTO DO MES		0,62	00027 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO	649,44
00943 ABONO SALARIAL		77,00	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	97,41
			00080 DESCONTO INSS	124,94

Salário Base:	1.623,60	Base de INSS Funcionário:	1.623,60	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	974,16	Base INSS Empresa:	1.623,60	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.623,60	Base de FGTS:	1.623,60
Base de Líquida de IRRF:	409,36	Base RAT:	1.623,60	Valor do FGTS:	129,88
Total de Vencimentos:	1.701,22	Total de Descontos:	873,22	Líquido a Receber:	828,00

Funcionário: 17 - DEPARTAMENTO: GERAL Adm: 01/07/2019 Função: AJUDANTE DE PEDR

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.623,60	00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		1,49
00020 SALARIO FAMILIA	1	62,04	00027 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO		649,44
00023 ARREDONDAMENTO DO MES		0,19	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		96,96
00943 ABONO SALARIAL		77,00	00080 DESCONTO INSS		124,94

Salário Base:	1.623,60	Base de INSS Funcionário:	1.623,60	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	974,16	Base INSS Empresa:	1.623,60	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.623,60	Base de FGTS:	1.623,60
Base de Líquida de IRRF:	409,36	Base RAT:	1.623,60	Valor do FGTS:	129,88
Total de Vencimentos:	1.762,83	Total de Descontos:	872,83	Líquido a Receber:	890,00

Funcionário: 85 - DEPARTAMENTO: GERAL Adm: 01/08/2024 Função: SERVENTE DE OBRA

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.428,00	00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0,80
00023 ARREDONDAMENTO DO MES		0,34	00027 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO		571,20
			00080 DESCONTO INSS		107,34

Salário Base:	1.428,00	Base de INSS Funcionário:	1.428,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	856,80	Base INSS Empresa:	1.428,00	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.428,00	Base de FGTS:	1.428,00
Base de Líquida de IRRF:	292,00	Base RAT:	1.428,00	Valor do FGTS:	114,24
Total de Vencimentos:	1.428,34	Total de Descontos:	679,34	Líquido a Receber:	749,00

Funcionário: 86 - DEPARTAMENTO: GERAL Adm: 01/08/2024 Função: SERVENTE DE OBRA

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.428,00	00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0,80
00020 SALARIO FAMILIA	2	124,08	00027 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO		571,20
00023 ARREDONDAMENTO DO MES		0,26	00080 DESCONTO INSS		107,34

Salário Base:	1.428,00	Base de INSS Funcionário:	1.428,00	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	856,80	Base INSS Empresa:	1.428,00	Horas Semanais:	44
Deduções Legais IRRF (03 dep.):	676,11	Base Terceiros:	1.428,00	Base de FGTS:	1.428,00
Base de Líquida de IRRF:	180,69	Base RAT:	1.428,00	Valor do FGTS:	114,24
Total de Vencimentos:	1.552,34	Total de Descontos:	679,34	Líquido a Receber:	873,00

Funcionário: 76 - DEPARTAMENTO: GERAL Adm: 01/10/2023 Função: PEDREIRO

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	2.095,00	00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0,55
00004 DIFERENÇA DE SALARIO	09:00	107,13	00027 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO		838,00
00023 ARREDONDAMENTO DO MES		0,75	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		125,70
			00078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	32:00	380,90
			00080 DESCONTO INSS		142,73

Salário Base:	2.095,00	Base de INSS Funcionário:	1.821,23	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	983,23	Base INSS Empresa:	1.821,23	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.821,23	Base de FGTS:	1.821,23
Base de Líquida de IRRF:	418,43	Base RAT:	1.821,23	Valor do FGTS:	145,69
Total de Vencimentos:	2.202,88	Total de Descontos:	1.487,88	Líquido a Receber:	715,00

Funcionário: 79 - DEPARTAMENTO: E Adm: 01/04/2024 Dem: 01/08/2024 Função: PEDREIRO

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00152 13 SAL. PROPORCIONAL	04/12	698,33	00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0,58
00167 FERIAS PROPORCIONAIS	04/12	558,67	00080 DESCONTO INSS		5,23



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDL LTDA EPP
Folha de Pagamento

Folha Mensal

Página: 3
Data: 05/09/2024
Hora: 17:04:49

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 08/2024

00175 SALDO DE SALARIOS	01/30	69,83	00180 LIQUIDO RESCISAO	1.454,87
00996 ADICIONAL S/ FERIÁS PROP.	33,3333%	186,22	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	52,37

Salário Base:	2.095,00	Base de INSS Funcionário:	768,16	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	69,83	Base INSS Empresa:	768,16	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	768,16	Base de FGTS:	768,16
Base de Líquida de IRRF:	0,00	Base RAT:	768,16	Valor do FGTS:	61,44
Total de Vencimentos:	1.513,05	Total de Descontos:	1.513,05	Líquido a Receber:	0,00

Funcionário: 9 - DEPARTAMENTO: GERAL Adm: 01/05/2018 Função: PEDREIRO

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	2.152,20	00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0,26
00023 ARREDONDAMENTO DO MES		0,37	00027 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO		860,88
00943 ABONO SALARIAL		97,40	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		129,32
			00080 DESCONTO INSS		172,51

Salário Base:	2.152,20	Base de INSS Funcionário:	2.152,20	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.291,32	Base INSS Empresa:	2.152,20	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.152,20	Base de FGTS:	2.152,20
Base de Líquida de IRRF:	726,52	Base RAT:	2.152,20	Valor do FGTS:	172,17
Total de Vencimentos:	2.249,97	Total de Descontos:	1.162,97	Líquido a Receber:	1.087,00

Funcionário: 87 - DEPARTAMENTO: GERAL Adm: 05/08/2024 Função: ASSI ADMINISTRAT

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	27/31	1.393,55	00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0,58
00020 SALARIO FAMILIA	1	54,03	00027 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO		557,42
00023 ARREDONDAMENTO DO MES		0,93	00080 DESCONTO INSS		104,51

Salário Base:	1.600,00	Base de INSS Funcionário:	1.393,55	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	836,13	Base INSS Empresa:	1.393,55	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.393,55	Base de FGTS:	1.393,55
Base de Líquida de IRRF:	271,33	Base RAT:	1.393,55	Valor do FGTS:	111,48
Total de Vencimentos:	1.448,51	Total de Descontos:	662,51	Líquido a Receber:	786,00

Funcionário: 47 - DEPARTAMENTO: GERAL Adm: 21/05/2021 Função: PEDREIRO

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	2.152,20	00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		1,03
00023 ARREDONDAMENTO DO MES		0,95	00027 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO		860,88
00943 ABONO SALARIAL		97,40	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		129,13
			00080 DESCONTO INSS		172,51

Salário Base:	2.152,20	Base de INSS Funcionário:	2.152,20	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.291,32	Base INSS Empresa:	2.152,20	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.152,20	Base de FGTS:	2.152,20
Base de Líquida de IRRF:	726,52	Base RAT:	2.152,20	Valor do FGTS:	172,17
Total de Vencimentos:	2.250,55	Total de Descontos:	1.163,55	Líquido a Receber:	1.087,00

Funcionário: 2 - DEPARTAMENTO: GERAL Adm: 01/03/2013 Função: AJUDANTE DE PEDR

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.623,60	00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		1,20
00023 ARREDONDAMENTO DO MES		0,98	00027 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO		649,44
00943 ABONO SALARIAL		77,00	00080 DESCONTO INSS		124,94

Salário Base:	1.623,60	Base de INSS Funcionário:	1.623,60	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	974,16	Base INSS Empresa:	1.623,60	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.623,60	Base de FGTS:	1.623,60
Base de Líquida de IRRF:	409,36	Base RAT:	1.623,60	Valor do FGTS:	129,88
Total de Vencimentos:	1.701,58	Total de Descontos:	775,58	Líquido a Receber:	926,00

Funcionário: 51 - DEPARTAMENTO: GERAL Adm: 16/09/2021 Função: PEDREIRO

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	2.152,20	00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0,21
00023 ARREDONDAMENTO DO MES		0,13	00027 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO		860,88
00943 ABONO SALARIAL		97,40	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		129,13
			00080 DESCONTO INSS		172,51

Salário Base:	2.152,20	Base de INSS Funcionário:	2.152,20	Base de INSS Suspensa:	0,00
---------------	----------	---------------------------	----------	------------------------	------



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDL LTDA EPP
Folha de Pagamento

Folha Mensal

Página:
Data: 05/09/2024
Hora: 17:04:51

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 08/2024

Base Bruta de IRRF:	1.291,32	Base INSS Empresa:	2.152,20	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.152,20	Base de FGTS:	2.152,20
Base de Líquida de IRRF:	726,52	Base RAT:	2.152,20	Valor do FGTS:	172,17
Total de Vencimentos:	2.249,73	Total de Descontos:	1.162,73	Líquido a Receber:	1.087,00

Funcionário: 88 DEPARTAMENTO: GERAL Adm: 08/08/2024 Função: AJUDANTE DE PEDR

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	24/31	1.256,98	00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0,21
00020 SALARIO FAMÍLIA	1	46,03	00027 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO		502,79
00023 ARREDONDAMENTO DO MES		0,26	00060 DESCONTO INSS		94,27

Salário Base:	1.623,60	Base de INSS Funcionário:	1.256,98	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	754,19	Base INSS Empresa:	1.256,98	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,60	Base Terceiros:	1.256,96	Base de FGTS:	1.256,98
Base de Líquida de IRRF:	189,39	Base RAT:	1.256,98	Valor do FGTS:	100,55
Total de Vencimentos:	1.305,27	Total de Descontos:	597,27	Líquido a Receber:	708,00

Funcionário: 74 DEPARTAMENTO: GERAL Adm: 21/08/2023 Dem: 01/08/2024 Função: PEDREIRO

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00150 AVISO PREVIO INDENIZADO	30/30	2.095,00	00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0,95
00152 13 SAL. PROPORCIONAL	07/12	1.222,08	00078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	1	69,83
00167 FÉRIAS PROPORCIONAIS	11/12	1.536,33	00180 LIQUIDO RESCISAO		5.667,18
00175 SALDO DE SALARIOS	01/30	69,83	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO		104,74
00190 13 SALARIO INDENIZADO	01/12	174,58			
00979 FÉRIAS INDENIZADAS	01/12	174,58			
00996 ADICIONAL S/ FÉRIAS PROP.	33,3333%	570,30			

DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO					
Base FGTS sem 13º:	2.269,58	Base FGTS do 13º:	1.222,08	Multa Rescisória:	176,10
Valor FGTS sem 13º:	181,57	Valor FGTS do 13º:	97,77		
Base FGTS mês:	0,00	Base FGTS mês anterior:	2.011,66		
Valor FGTS mês:	0,00	Valor FGTS mês anterior:	160,93		

Salário Base:	2.095,00	Base de INSS Funcionário:	1.396,66	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	0,00	Base INSS Empresa:	1.396,66	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.396,66	Base de FGTS:	0,00
Base de Líquida de IRRF:	0,00	Base RAT:	1.396,66	Valor do FGTS:	0,00
Total de Vencimentos:	5.842,70	Total de Descontos:	5.642,70	Líquido a Receber:	0,00

Funcionário: 83 DEPARTAMENTO: GERAL Adm: 01/04/2024 Função: BOMBEIRO HIDRAUL

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	2.095,00	00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0,34
00023 ARREDONDAMENTO DO MES		0,98	00027 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO		636,00
			00078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	40:00	476,13
			00080 DESCONTO INSS		124,51

Salário Base:	2.095,00	Base de INSS Funcionário:	1.618,87	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	780,87	Base INSS Empresa:	1.618,87	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.618,87	Base de FGTS:	1.618,87
Base de Líquida de IRRF:	216,07	Base RAT:	1.618,87	Valor do FGTS:	129,50
Total de Vencimentos:	2.095,98	Total de Descontos:	1.438,98	Líquido a Receber:	657,00

Funcionário: 84 DEPARTAMENTO: GERAL Adm: 18/07/2024 Dem: 07/08/2024 Função: SERVENTE DE OBRA

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00021 SALARIO FAMÍLIA PROPORCIONAL	1/7	14,48	00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0,49
00152 13 SAL. PROPORCIONAL	01/12	119,00	00080 DESCONTO INSS		24,99
00167 FÉRIAS PROPORCIONAIS	01/12	119,00	00160 LIQUIDO RESCISAO		590,95
00175 SÁLDO DE SALARIOS	07/30	333,20	00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO		8,92
00996 ADICIONAL S/ FÉRIAS PROP.	33,3333%	39,67			

DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO					
Base FGTS sem 13º:	333,20	Base FGTS do 13º:	119,00	Multa Rescisória:	0,00
Valor FGTS sem 13º:	26,66	Valor FGTS do 13º:	9,52		
Base FGTS mês:	0,00	Base FGTS mês anterior:	580,00		
Valor FGTS mês:	0,00	Valor FGTS mês anterior:	46,40		

Salário Base:	1.428,00	Base de INSS Funcionário:	452,20	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	333,20	Base INSS Empresa:	452,20	Horas Semanais:	44



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDL LTDA EPP
Folha de Pagamento

Folha Mensal

Página: 5
Data: 05/09/2024
Hora: 17:04:53

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 08/2024

Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	452,20	Base de FGTS:	0,00
Base de Líquida de IRRF:	0,00	Base RAT:	452,20	Valor do FGTS:	0,00
Total de Vencimentos:	625,35	Total de Descontos:	625,35	Líquido a Receber:	0,00

Funcionário: 42 Adm: 18/02/2021 Função: ELETRICISTA

DEPARTAMENTO: GERAL

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	2.152,20	00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		1,00
00023 ARREDONDAMENTO DO MES		0,92	00027 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO		860,88
00943 ABONO SALARIAL		97,40	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		129,13
			00080 DESCONTO INSS		172,51

Salário Base:	2.152,20	Base de INSS Funcionário:	2.152,20	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.291,32	Base INSS Empresa:	2.152,20	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	2.152,20	Base de FGTS:	2.152,20
Base de Líquida de IRRF:	726,52	Base RAT:	2.152,20	Valor do FGTS:	172,17
Total de Vencimentos:	2.250,52	Total de Descontos:	1.163,52	Líquido a Receber:	1.087,00

Funcionário: 69 Adm: 16/06/2023 Função: SERVENTE DE OBRA

DEPARTAMENTO: GERAL

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.428,00	00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		1,82
00004 DIFERENÇA DE SALARIO	05/00	40,57	00027 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO		614,04
00023 ARREDONDAMENTO DO MES		0,29	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		85,66
			00078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	40/00	324,54
			00080 DESCONTO INSS		85,80

Salário Base:	1.428,00	Base de INSS Funcionário:	1.144,03	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	529,99	Base INSS Empresa:	1.144,03	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.144,03	Base de FGTS:	1.144,03
Base de Líquida de IRRF:	0,00	Base RAT:	1.144,03	Valor do FGTS:	91,52
Total de Vencimentos:	1.468,86	Total de Descontos:	1.111,86	Líquido a Receber:	357,00

Funcionário: 54 Adm: 01/04/2022 Função: TEC SEGURANÇA TR

DEPARTAMENTO: GERAL

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.875,90	00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		1,10
00023 ARREDONDAMENTO DO MES		0,76	00027 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO		750,36
			00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		112,55
			00080 DESCONTO INSS		147,65

Salário Base:	1.875,90	Base de INSS Funcionário:	1.875,90	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.125,54	Base INSS Empresa:	1.875,90	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.875,90	Base de FGTS:	1.875,90
Base de Líquida de IRRF:	560,74	Base RAT:	1.875,90	Valor do FGTS:	150,07
Total de Vencimentos:	1.876,66	Total de Descontos:	1.011,66	Líquido a Receber:	865,00

Funcionário: 75 Adm: 11/09/2023 Função: AUXILIAR ALMOXAR

DEPARTAMENTO:

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.560,00	00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0,18
00004 DIFERENÇA DE SALARIO	09/00	79,77	00027 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO		624,00
00020 SALARIO FAMILIA	1	62,04	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		93,60
00023 ARREDONDAMENTO DO MES		0,36	00080 DESCONTO INSS		126,39

Salário Base:	1.560,00	Base de INSS Funcionário:	1.639,77	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.015,77	Base INSS Empresa:	1.639,77	Horas Semanais:	44
Dedução Simplificada IRRF:	564,80	Base Terceiros:	1.639,77	Base de FGTS:	1.639,77
Base de Líquida de IRRF:	450,97	Base RAT:	1.639,77	Valor do FGTS:	131,18
Total de Vencimentos:	1.702,17	Total de Descontos:	844,17	Líquido a Receber:	858,00

Funcionário: 6 Adm: 01/08/2017 Função: AJUDANTE DE PEDR

DEPARTAMENTO: GERAL

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	31/31	1.623,60	00024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		1,20
00023 ARREDONDAMENTO DO MES		0,05	00027 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO		649,44
00943 ABONO SALARIAL		77,00	00032 PENSÃO ALIMENTICIA SALARIO		253,66
			00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		97,41
			00080 DESCONTO INSS		124,94

Salário Base:	1.623,60	Base de INSS Funcionário:	1.623,60	Base de INSS Suspensa:	0,00
---------------	----------	---------------------------	----------	------------------------	------



Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal		Mês/Ano: 08/2024	
Base Bruta de IRRF:	974,16	Base INSS Empresa:	1.623,60	Horas Semanais:	44
Deduções Legais IRRF (01 dep.):	568,19	Base Terceiros:	1.623,60	Base de FGTS:	1.623,60
Base de Líquida de IRRF:	405,97	Base RAT:	1.623,60	Valor do FGTS:	129,88
Total de Vencimentos:	1.700,65	Total de Descontos:	1.126,65	Líquido a Receber:	574,00

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - FUNCIONÁRIOS					
Vencimentos		Valor	Descontos		Valor
00001	SALÁRIO NORMAL	36.178,78	00024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	19,15
00004	DIFERENÇA DE SALARIO	307,24	00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO	15.138,35
00020	SALARIO FAMILIA	412,26	00032	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO	253,66
00021	SALARIO FAMILIA PROPORCIONAL	14,48	00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1.616,90
00023	ARREDONDAMENTO DO MES	10,41	00078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	1.605,94
00150	AVISO PREVIO INDENIZADO	3.811,00	00080	DESCONTO INSS	2.842,89
00152	13 SAL. PROPORCIONAL	3.079,41	00180	LIQUIDO RESCISAO	13.429,67
00160	FERIAS VENCIDAS NORMAL	1.560,00	00197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	253,78
00167	FERIAS PROPORCIONAIS	2.604,00			
00175	SALDO DE SALARIOS	1.304,86			
00190	13 SALARIO INDENIZADO	304,58			
00943	ABONO SALARIAL	933,22			
00979	FÉRIAS INDENIZADAS	304,58			
00996	ADICIONAL S/ FÉRIAS PROP.	969,52			
00997	ADICIONAL S/ FÉRIAS VENCIDAS	520,00			
Total de Vencimentos		52.314,34	Total de Descontos		35.160,34
			Total Líquido		17.154,00

BASES DE CÁLCULO			
BASE DE CÁLCULO DE IRRF	21.046,59	BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	39.568,93
BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00	BASE INSS EMPRESA	39.568,93
BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00	BASE INSS SUSPENSÃO	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	35.718,07	BASE TERCEIROS	39.568,93
BASE DE CÁLCULO DE PIS	0,00	BASE RAT	39.568,93

TRIBUTOS			
VALOR DO FGTS	2.857,32	VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS	3.096,67
VALOR DE IRRF	0,00	VALOR DE INSS-FPAS	0,00
VALOR DE PIS	0,00	VALOR DE INSS - RAT	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	426,74
		VALOR DE INSS - TERCEIROS	0,00

DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO			
VALOR FGTS SEM 13º	422,46	BASE FGTS SEM 13º	5.280,78
VALOR FGTS DO 13º	190,49	BASE FGTS DO 13º	2.381,08
VALOR FGTS MÊS	0,00	BASE FGTS MÊS	0,00
VALOR FGTS MÊS ANTERIOR	207,33	BASE FGTS MÊS ANTERIOR	2.591,68
		MULTA RESCISÓRIA	295,07

TOTAL DE FUNCIONARIOS			
AFASTADOS	0,00	ATIVOS	20,00
		DEMITIDOS	4,00

		TOTAIS	
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	020	TOTAL DE VENCIMENTOS	52.314,34
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	000	TOTAL DE DESCONTOS	35.160,34
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	004	TOTAL LÍQUIDO	17.154,00
NÚMERO DE DIRETORES	000		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 09.145.367/0001-78 DUNS®: 89****94
Razão Social: G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA
Nome Fantasia: G2 MERCANTIL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 08/05/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	22/10/2024	Automática
FGTS	Validade:	22/10/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	05/04/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	30/11/2024
Receita Municipal	Validade:	02/11/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 08/10/2024 15:17

1 de 1

Ass: _____



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 09.145.367 Nome Empregador: G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 21 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

2.857,32

Número da Guia: 0124090627043761-9 Data Emissão: 06/09/2024 13:42:47 (Brasília) Emitida por: 09.145.367/0001-78 - G2 CONSTRUCAO E



Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 09.145.367/0001-78		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Gt	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024					101	20/09/2024	Mensal	3.331,55	52	0,00	0,00	0,00	266,52
08/2024					101	20/09/2024	Mensal	1.623,60	266,88	0,00	0,00	0,00	129,88
08/2024					101	20/09/2024	Mensal	1.285,23	129,81	0,00	0,00	0,00	102,81
08/2024					101	20/09/2024	Mensal	1	102,88	0,00	0,00	0,00	129,88
08/2024					101	20/09/2024	Mensal	1.623,60	129,88	0,00	0,00	0,00	129,88
08/2024					101	20/09/2024	Mensal	1.623,60	114,24	0,00	0,00	0,00	114,24
08/2024					101	20/09/2024	Mensal	1.428,00	114,24	0,00	0,00	0,00	114,24
08/2024					101	20/09/2024	Mensal	1.821,23	145,24	0,00	0,00	0,00	145,69
08/2024					101	20/09/2024	Mensal	768,16	72,69	0,00	0,00	0,00	61,44
08/2024					101	20/09/2024	Mensal	2.152,20	129,44	0,00	0,00	0,00	172,17
08/2024					101	20/09/2024	Mensal	1.293,55	72,17	0,00	0,00	0,00	111,48
08/2024					101	20/09/2024	Mensal	1.623,60	100,46	0,00	0,00	0,00	172,17
08/2024					101	20/09/2024	Mensal	2.152,20	129,88	0,00	0,00	0,00	129,88
08/2024					101	20/09/2024	Mensal	1	72,17	0,00	0,00	0,00	172,17
08/2024					101	20/09/2024	Mensal	1.256,96	91,55	0,00	0,00	0,00	100,55
08/2024					101	20/09/2024	Mensal	1.623,60	150,69	0,00	0,00	0,00	129,50
08/2024					101	20/09/2024	Mensal	5.718,07	131,52	0,00	0,00	0,00	172,17
08/2024					101	20/09/2024	Mensal	1.144,03	129,88	0,00	0,00	0,00	91,52
08/2024					101	20/09/2024	Mensal	1.875,90	129,88	0,00	0,00	0,00	150,07
08/2024					101	20/09/2024	Mensal	1.639,77	18	0,00	0,00	0,00	131,18
08/2024					101	20/09/2024	Mensal	5.718,07	8	0,00	0,00	0,00	129,88
Total do Tomador Sem Tomador								3	2.857,32	0,00	0,00	0,00	2.857,32
Total do Estabelecimento 09.145.367/0001-78								3	2.857,32	0,00	0,00	0,00	2.857,32
Total FGTS								35.718,07	2.857,32	0,00	0,00	0,00	2.857,32

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 09.145.367 **Nome Empregador:** G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 21 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024

Total Parcelado:

0.00

Total da Guia (FGTS): 2.857,32

Número da Guia: 0124090627043761-9 **Data Emissão:** 06/09/2024 13:42:47 (Brasília) **Emitida por:** 09.145.367/0001-78 - G2 CONSTRUCAO E

Relação de Categorias

Estabelecimento: 09.145.367/0001-78

Comp. Apuracão	Categoria	Qtde. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Uros	Atualiz.	Monetária	Multa	Total
08/2024	101	21	35.718,07	2.857,32	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2.857,32
		Total FGTS	35.718,07	2.857,32	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2.857,32

Descrição das categorias

- [illegible]





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 09.145.367 Nome Empregador: G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA

Vencimento da Guia: 20/09/2024

Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 21 Origem: Gestão de Guias

0,00

Total da Guia (FGTS): 2.857,32

Número da Guia: 0124090627043761-9 Data Emissão: 06/09/2024 13:42:47 (Brasília) Emitida por: 09.145.367/0001-78 - G2 CONSTRUCAO E



Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	09.145.367/0001-78	21	35.718,07	2.857,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.857,32
		Total FGTS	35.718,07	2.857,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.857,32



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 09.145.367 Nome Empregador: G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 21 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS): 2.857,32

Número da Guia: 0124090627043761-9 Data Emissão: 06/09/2024 13:42:47 (Brasília) Emitida por: 09.145.367/0001-78 - G2 CONSTRUCAO E

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 09.145.367/0001-78

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	11 - FGTS mensal	21	35.019,74	2.801,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.801,46
08/2024	12 - FGTS 13º salário	1	698,33	55,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,86
	Total FGTS		35.718,07	2.857,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.857,32





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 09.145.367 Nome Empregador: G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA
Vencimento da Guia: 20/09/2024 Total Parcelado:
Número da Guia: 0124090627043761-9 Data Emissão: 06/09/2024 13:42:47 (Brasília) Emitida por: 09.145.367/0001-78 - G2 CONSTRUCAO E

Qtd. Trabalhadores FGTS: 21 Origem: Gestão de Guias
0,00 Total da Guia (FGTS): 2.857,32



Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador								
Emp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
08/2024	21	35.718,07	2.857,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.857,32	
Total FGTS		35.718,07	2.857,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.857,32	

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários -DCTFWeb

CNPJ/CPF	09.145.367/0001-78
Nome	G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA
Período de apuração	08/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	27793195699 / eSocial 85046396/ ReinfCP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 3.261,67	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 43,09	R\$ 43,09
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 3.304,76	R\$ 43,09

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	
CPF	
Telefone	

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	10/09/2024 14:48:30
Nº do recibo de entrega	0000050000262943821
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	09.145.367/0001-78

1º GPT E



DESTACAMENTO DO SERVIÇO REGIONAL DE OBRAS DA 10ª REGIÃO MILITAR (1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA)

TERMO DE CONTRATO Nº 01/2023 - 1º GPT E (1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA)

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA
 RM: 10PRM
 OM BENEFICIADA: 1º GPT E
 LOCAL: FORTALEZA-CE
 BDI: 20,16%

CONTRATADA: G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.
 CONTRATAÇÃO: 09.145.367/0001-78
 DATA DA MEDIÇÃO: 25/09/24
 MEDIÇÃO: 1ª Medição
 ÁREA:



PLANILHA DE MEDIÇÃO - EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA (OPUS:201110000045 e 201910000045)

PLANILHA DE MEDIÇÃO - EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS															
Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant. Total	Custo Unit (R\$)		Custo Unit. Total (R\$)	Custo Total Atual s/ BDI(R\$)	1ª Medição			SALDO		
						M.O.	MAT.			%	Quant	Valor(R\$)	%	Quant	Valor(R\$)
SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS										17.595,69	0,00%	0,00	0,89%		156,84
ESTUDOS E PROJETOS										17.595,69	0,00%	0,00	0,89%		156,84
1.1.1	C4584	SEINFRA	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA	UT	500,00	30,96	0,00	30,96	15.480,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
1.1.2	000250	SBC	COPIAS DE PROJETOS POR PLOTAGEM ELETRONICA FORMATO A0	UN	50,00	0,00	14,84	14,84	742,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
1.1.3	016744	SBC	PROGRAMA GERENC PGRCC RESOLUCAO CONAMA 307/2002 ATE 5.000 M2	m²	0,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
1.1.4	016690	SBC	ATESTADO PCMAT (NR18)	UN	1,00	0,00	1.060,01	1.060,01	1.060,01	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
1.1.5	CREA CE - 1	Próprio	ART DE VALOR ATÉ R\$ 8.000,00	UN	4,00	0,00	78,42	78,42	313,68	0,00%	0,00	0,00	50,00%	2,00	156,84
SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS										232.042,86	5,30%	12.305,27	63,28%		146.848,18
PESSOAL										232.042,86	5,30%	12.305,27	63,28%		146.848,18
2.1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.144,00	112,54	2,89	115,43	132.051,92	5,31%	60,73	7.010,06	63,39%	725,15	83.704,06
2.1.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.288,00	21,35	2,41	23,76	54.362,88	5,31%	121,45	2.885,65	63,30%	1.448,26	34.410,65
2.1.3	90766	SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.288,00	18,16	1,68	19,84	45.393,92	5,31%	121,45	2.409,56	63,30%	1.448,26	28.733,47
2.1.4	CREA CE - 2	Próprio	ART DE VALOR ACIMA DE R\$ 15.000,00	UN	1,00	233,94	0,00	233,94	233,94	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES										5.572,80	0,00%	0,00	100,00%		5.572,80
COMO CONSTRUÍDO (AS BUILT)										5.572,80	0,00%	0,00	100,00%		5.572,80
3.1.1	C1083	SEINFRA	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO "AS BUILT"	UT	180,00	30,96	0,00	30,96	5.572,80	0,00%	0,00	0,00	100,00%	180,00	5.572,80
SERVIÇOS PRELIMINARES										117.982,31	0,00%	0,00	0,00%		1,78
DEMOLICOES E RETIRADAS										117.982,31	0,00%	0,00	0,00%		1,78
PAREDES E REVESTIMENTOS										0,00%					
4.1.1.1	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	3.800,66	4,21	0,00	4,21	16.000,77	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4.1.1.2	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	336,95	1,37	0,00	1,37	461,62	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4.1.1.3	97634	SINAPI	DEMOLUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	4.015,43	10,59	0,00	10,59	42.523,40	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4.1.1.4	97631	SINAPI	DEMOLUÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	2.713,17	2,78	0,00	2,78	7.542,61	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4.1.1.5	97622	SINAPI	DEMOLUÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m³	51,62	46,97	0,00	46,97	2.424,59	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4.1.1.6	97632	SINAPI	DEMOLUÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4.1.1.7	ADAPT SEINFRA C1049	Próprio	DEMOLUÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M³	5,39	272,71	0,00	272,71	1.469,90	0,00%	0,00	0,00	0,09%	0,00	1,36
4.1.1.8	ADAPT SEINFRA C1066	Próprio	DEMOLUÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M³	174,76	27,26	0,00	27,26	4.763,95	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,09
EQUIPAMENTOS E SEMELHANTES										0,00%					
4.1.2.1	97666	SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	339,00	7,52	0,00	7,52	2.549,28	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4.1.2.2	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LDOÇAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	277,00	10,30	0,00	10,30	2.853,10	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4.1.2.3	97664	SINAPI	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	497,00	1,27	0,00	1,27	631,19	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4.1.2.4	ADPT SEINFRA C4633	Próprio	REMANEJAMENTO DE BANCADA DE GRANITO	m²	0,00	62,26	61,34	123,60	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4.1.2.5	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	319,20	7,79	0,00	7,79	2.486,56	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4.1.2.6	022101	SBC	RETIRADA BOX CHUVEIRO	UN	60,00	68,49	0,00	68,49	4.109,40	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4.1.2.7	ADPT ORSE 3261	Próprio	Remoção e ressecamento de tanque de louça, incluso VALVULA INOXIDAVEL LONGA PARA TANQUE 2.1/2"x1.1/4" e SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 x 1.1/2 "	un	0,00	124,62	87,58	212,20	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4.1.2.8	ADPT ORSE 8387	Próprio	Remoção de bancada de granito (ou marmore)	m²	85,68	21,49	0,00	21,49	1.841,26	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4.1.2.9	ADPT SBC 023751	Próprio	RETIRADA E RECOLOCACAO DE ARMARIO EMBUTIDO DE MADEIRA	m²	0,00	254,15	0,00	254,15	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4.1.2.10	022314	SBC	RETIRADA ESQUADRIA E CAIXILHOS DE MADEIRA	m²	13,44	43,78	0,00	43,78	588,40	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4.1.2.11	ADAPT CPOS 0408100	Próprio	RETIRADA ARMARIOS EM MADEIRA OU METAL	m²	84,38	67,89	0,00	67,89	5.728,55	0,00%	0,00	0,00	0,01%	0,00	0,33
INSTALAÇÕES										0,00%					
4.1.3.1	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	557,00	0,56	0,00	0,56	311,92	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4.1.3.2	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	714,00	1,08	0,00	1,08	771,12	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4.1.3.3	97662	SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M	4.620,00	0,41	0,00	0,41	1.894,20	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4.1.3.4	104792	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF 09/2023	M	8.644,00	0,35	0,00	0,35	3.025,40	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant. Total	Custo Unit [R\$]		Custo Unit. Total [R\$]	Custo Total Atual s/ BDI[R\$]	1ª Medição			SALDO		
						M.O.	Mat.			%	Quant	Valor[R\$]	%	Quant	Valor[R\$]
4.1.3.5	ADAPT AGETOP CIVIL 020166	Próprio	RETIRADA ELETRODUTOS	M	731,90	0,79	0,00	0,79	578,20	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4.1.3.6	90447	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 05/2015	M	942,10	6,11	0,00	6,11	5.756,23	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4.1.3.7	90443	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 05/2015	M	724,30	12,25	0,00	12,25	8.872,67	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
4.1.3.8	91222	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF. 05/2015	M	60,50	13,19	0,00	13,19	797,99	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
5			SERVIÇOS DIVERSOS						91.520,65	2,08%		141,23	11,79%		10.428,07
5.1			CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE						72.050,89	0,00%		0,00	0,00%		0,00
5.1.1	071810	SBC	CACAMBA DE AÇO PARA LIXO/ENTULHO 5,0m3/LOCAÇÃO 3 DIAS IDA E VOLTA	UN	116,00	0,00	309,17	309,17	35.863,72	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
5.1.2	CEINFRA C2535	Próprio	TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	m³	464,21	75,80	0,00	75,80	35.187,11	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
5.2			LIMPEZA E ARRUMATES FINAIS						20.469,82	0,00%		141,23	50,94%		10.428,07
5.2.1	91802	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF. 04/2019	m²	4.794,68	0,44	0,00	0,44	2.109,65	0,00%	0,00	0,00	100,00%	4.794,68	2.109,65
5.2.2	91803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF. 04/2019	m²	4.794,68	1,73	0,00	1,73	8.294,79	0,00%	0,00	0,00	100,00%	4.794,68	8.294,79
5.2.3	ADAPT ORSE 7387	Próprio	Preparo de substrato (superfície de concreto) por lixamento elétrico	m²	829,11	9,31	1,12	10,43	8.647,61	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
5.2.4	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF. 04/2019	m²	829,11	1,65	0,06	1,71	1.417,77	9,96%	82,59	141,23	1,67%	13,82	23,63
6			CANTEIRO DE OBRAS						112.297,19	9,82%		208,15	26,47%		29.721,51
6.1			DIVERSOS						112.297,19	9,82%		208,15	26,47%		29.721,51
6.1.1	ADPT SEINFRA C1937	Próprio	PLACAS PADRÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO	m²	2,98	35,72	106,32	142,04	423,27	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
6.1.2	101505	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO). AF. 07/2020. PS	UN	1,00	93,56	1.616,15	1.709,71	1.709,71	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
6.1.3	SRO01	Próprio	CONSUMO DE ENERGIA	kWh	10.400,00	0,00	0,88	0,88	9.152,00	3,56%	369,99	325,59	47,13%	4.901,44	4.313,27
6.1.4	ADPT SEINFRA C2851	Próprio	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	334,80	696,66	1.031,46	1.031,46	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
6.1.5	SRO02	Próprio	Tarifa de esgoto	m³	390,00	0,00	9,41	9,41	3.669,90	4,57%	17,82	167,64	22,84%	89,07	838,17
6.1.6	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO. AF. 04/2016	m²	20,00	0,00	887,05	887,05	17.741,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
6.1.7	SS 10.030	CPDS	Locação de duto coletor de entulho	m x m x m	0,00	0,00	73,60	73,60	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
6.1.8	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUMNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF. 03/2016	CHP	616,00	0,00	20,86	20,86	12.849,76	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
6.1.9	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUMNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF. 03/2016	CHI	616,00	19,66	0,31	19,97	12.301,52	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
6.1.10	ADPT SEINFRA C4125	Próprio	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	m³	500,00	4,03	2,02	6,05	3.025,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
6.1.11	ADPT SBC 023100	Próprio	PROTECOES-PROTECAO DE PISO CONTRA IMPACTOS E MANCHAS - SALVA PISO OU EQUIVALENTE	m²	1.276,68	5,89	10,38	16,27	20.771,58	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
6.1.12	ADAPT SINAPI 73847/004	Próprio	ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/ 4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERVY TRAPEZ FORRO C/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST RA ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	13,00	0,00	1.879,24	1.879,24	24.430,12	0,00%	0,00	0,00	92,31%	12,00	22.550,88
6.1.13	SRO02	Próprio	TARIFA DE ÁGUA	MES	487,50	0,00	10,65	10,65	5.191,87	4,14%	20,18	214,92	38,89%	189,60	2.019,19
7			ESTRUTURA						106.332,84	0,00%		0,00	0,77%		734,64
7.1			RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO FUNDO DO RES. SUPERIOR DE ÁGUA						72.736,36	0,00%		0,00	0,32%		734,64
7.1.1	ADPT SEINFRA C1271	Próprio	LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA P/VIGAS/LAJES	m²	45,30	1,78	4,45	6,23	282,21	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
7.1.2	ADPT SEINFRA C0929	Próprio	CORTE EM CONCRETO DETERIORADO	m²	149,70	35,72	0,00	35,72	5.347,28	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
7.1.3	ADPT SEINFRA C0094	Próprio	APICAMENTO EM CONCRETO/PREPARO DA SUPERFÍCIE	m²	149,70	35,72	0,00	35,72	5.347,28	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
7.1.4	ADPT SEINFRA C3095	Próprio	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO	m²	149,70	7,14	0,00	7,14	1.068,85	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
7.1.5	ADPT SEINFRA C3083	Próprio	EXECUÇÃO DE FUROS EM CONCRETO C/BROCA 1/2" x D <= 1"	UN	440,00	6,25	9,04	15,29	6.727,60	0,00%	0,00	0,00	3,18%	14,00	214,06
7.1.6	ADPT SEINFRA C2900	Próprio	PINTURA PROTEÇÃO C/INIBIDOR MIGRATÓRIO CORROSÃO, 3 DEMÃOS	m²	149,70	13,26	8,18	21,44	3.209,56	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
7.1.7	ADPT SEINFRA C0216	Próprio	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	59,10	3,35	11,35	14,70	868,77	0,00%	0,00	0,00	2,37%	1,40	20,58
7.1.8	SINAPI 83730 (01/2020)	Próprio	REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA DE ALTO DESEMPENHO, E=2 CM - SINAPI 83730 (01/2020)	m³	207,30	14,08	225,65	239,73	49.696,02	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
7.1.9	ADPT ORSE 4924	Próprio	Estucamento com argamassa polimérica	m²	3,00	8,41	54,52	62,93	188,79	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant. Total	Custo Unit [R\$]		Custo Unit. Total [R\$]	Custo Total Atual s/ BDI[R\$]	17ª Medição			SALDO		
						M.O.	MAT.			%	Quant	Valor(R\$)	%	Quant	Valor(R\$)
7.2			FECHAMENTOS						33.596,48	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
7.2.1	92526	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA. 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	50,00	13,81	23,71	37,52	1.876,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
7.2.2	ADPT SEINFRA C0833	Próprio	CONCRETO GROUT C/ATÉ 30% DE PEDRISCO EM PESO, LANÇAMENTO E CURA	m³	8,86	466,86	3.113,33	3.580,19	31.720,48	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						799.758,80	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.1			APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS E OUTROS						231.986,53	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.1.1	100878	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	123,00	41,89	521,70	563,59	69.321,57	0,00%	0,00	0,00	100,00%	123,00	69.321,57
8.1.2	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	60,00	13,08	68,96	82,04	4.922,40	0,00%	0,00	0,00	100,00%	60,00	4.922,40
8.1.3	ADPT SEINFRA C0797	Próprio	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	31,00	5,92	11,96	17,88	554,28	0,00%	0,00	0,00	100,00%	31,00	554,28
8.1.4	ADPT ORSE 9502	Próprio	Ducha higiênica com registro, linha Link, ref. 1984.C.ACT. LNK, da DECA ou similar	un	92,00	11,84	218,45	230,29	21.186,68	0,00%	0,00	0,00	100,00%	92,00	21.186,68
8.1.5	ADPT SEINFRA C1151	Próprio	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	31,00	21,30	93,90	115,20	3.571,20	0,00%	0,00	0,00	100,00%	31,00	3.571,20
8.1.6	86937	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	62,00	0,00	187,64	187,64	11.633,68	0,00%	0,00	0,00	100,00%	62,00	11.633,68
8.1.7	ADPT SEINFRA C4770	Próprio	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE SEMI-ENCAIXE, DECA L733 OU EQUIVALENTE, DIMENSÕES 36,5x33cm, S/ TORNEIRA C/ ACESSÓRIOS	UN	30,00	63,90	722,72	786,62	23.598,60	0,00%	0,00	0,00	100,00%	30,00	23.598,60
8.1.8	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	31,00	0,00	213,75	213,75	6.626,25	0,00%	0,00	0,00	100,00%	31,00	6.626,25
8.1.9	86935	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	61,00	0,00	221,38	221,38	13.504,18	0,00%	0,00	0,00	100,00%	61,00	13.504,18
8.1.10	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	61,00	3,40	91,70	95,10	5.801,10	0,00%	0,00	0,00	100,00%	61,00	5.801,10
8.1.11	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	91,00	2,81	103,49	106,30	9.673,30	0,00%	0,00	0,00	100,00%	91,00	9.673,30
8.1.12	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	30,00	4,46	68,97	73,43	2.202,90	0,00%	0,00	0,00	100,00%	30,00	2.202,90
8.1.13	ADPT ORSE 3709	Próprio	Papeleira em aço inox, DECA 2020 C40 ou similar	un	92,00	16,96	122,78	139,74	12.856,08	0,00%	0,00	0,00	100,00%	92,00	12.856,08
8.1.14	SIROL0C002	Próprio	Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar - ADAP ORSE 7611	un	31,00	7,26	55,93	63,19	1.958,89	0,00%	0,00	0,00	100,00%	31,00	1.958,89
8.1.15	ADPT ORSE 9495	Próprio	Cabide em aço inox, linha Slim, ref. 2060.C.SLM, Deca ou similar	un	152,00	16,96	109,60	126,56	19.237,12	0,00%	0,00	0,00	100,00%	152,00	19.237,12
8.1.16	86919	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUMA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	30,00	50,36	794,25	844,61	25.338,30	0,00%	0,00	0,00	100,00%	30,00	25.338,30
8.2			COLUNAS, BARRILETES E RAMAIS						343.223,93	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.2.1			HIDRÁULICA						343.223,93	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.2.1.1	96673	SINAPI	TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	M	43,00	0,00	86,87	86,87	3.735,41	0,00%	0,00	0,00	12,33%	5,30	460,41
8.2.1.2	96672	SINAPI	TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	M	88,45	0,00	54,77	54,77	4.844,40	0,00%	0,00	0,00	18,03%	15,95	873,58
8.2.1.3	96671	SINAPI	TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	M	21,00	0,00	38,73	38,73	813,33	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.2.1.4	91788	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	78,12	0,00	41,47	41,47	3.239,63	0,00%	0,00	0,00	100,00%	78,12	3.239,63
8.2.1.5	96670	SINAPI	TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	M	189,42	6,01	23,77	29,78	5.640,92	12,67%	24,00	714,72	87,33%	165,42	4.926,20
8.2.1.6	91787	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	211,68	0,00	32,80	32,80	6.943,10	2,83%	6,00	196,80	97,17%	205,68	6.746,30
8.2.1.7	96669	SINAPI	TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	M	387,00	4,98	15,60	20,58	7.964,46	0,00%	0,00	0,00	46,25%	179,00	3.683,82
8.2.1.8	ADPT SEINFRA C2626	Próprio	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1")	M	373,80	19,16	14,09	33,25	12.428,85	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.2.1.9	96644	SINAPI	TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	M	747,80	7,27	12,48	19,75	14.769,05	0,00%	0,00	0,00	27,49%	205,55	4.059,61
8.2.1.10	91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	921,36	0,00	40,29	40,29	37.121,59	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.2.1.11	89452	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	25,00	2,34	57,87	60,21	1.505,25	100,00%	25,00	1.505,25	0,00%	0,00	0,00
8.2.1.12	89631	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	11,77	118,65	130,42	521,68	75,00%	3,00	391,26	25,00%	1,00	130,42



Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant. Total.	Custo Unit [R\$]		Custo Unit. Total [R\$]	Custo Total Atual s/ BDI[R\$]	17ª Medição			SALDO		
						M.O.	MAT.			%	Quant	Valor(R\$)	%	Quant	Valor(R\$)
8.2.1.13	ADPT SINAPI 89631	Próprio	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85x75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	11,77	208,59	220,36	440,72	0,00%	0,00	0,00	100,00%	2,00	440,72
8.2.1.14	89632	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	10,14	92,53	102,67	616,02	0,00%	0,00	0,00	100,00%	6,00	616,02
8.2.1.15	96762	SINAPI	TE, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	9,00	23,55	74,39	97,94	881,46	0,00%	0,00	0,00	100,00%	9,00	881,46
8.2.1.16	96761	SINAPI	TE, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	14,26	35,62	49,88	149,64	0,00%	0,00	0,00	100,00%	3,00	149,64
8.2.1.17	96713	SINAPI	TE NORMAL, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	18,00	17,54	20,39	37,93	682,74	0,00%	0,00	0,00	77,78%	14,00	531,02
8.2.1.18	96712	SINAPI	TE NORMAL, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	6,00	14,45	15,23	29,68	178,08	0,00%	0,00	0,00	100,00%	6,00	178,08
8.2.1.19	96642	SINAPI	TE NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	120,00	14,77	4,28	19,05	2.286,00	5,83%	7,00	133,35	35,83%	43,00	819,15
8.2.1.20	ADPT SINAPI 96715	Próprio	TE REDUÇÃO, PPR, DN 75x50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,00	25,24	72,78	98,02	392,08	0,00%	0,00	0,00	50,00%	2,00	196,04
8.2.1.21	ADPT SINAPI 96714	Próprio	TE REDUÇÃO, PPR, DN 63x50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	7,00	21,54	31,34	52,88	370,16	0,00%	0,00	0,00	14,29%	1,00	52,88
8.2.1.22	ADPT SINAPI 96712	Próprio	TE REDUÇÃO, PPR, DN 40x32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	32,00	14,45	18,46	32,91	1.053,12	6,25%	2,00	65,82	93,75%	30,00	987,30
8.2.1.23	ADPT SINAPI 96666	Próprio	TE REDUÇÃO, PPR, DN 32x25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	10,00	7,41	9,96	17,37	173,70	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.2.1.24	ADPT SINAPI 96642	Próprio	TE COM INSERTO METÁLICO, PPR, DN 25x1/2" MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	20,00	14,77	10,59	25,36	507,20	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.2.1.25	89521	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00	8,81	126,70	135,51	1.626,12	100,00%	12,00	1.626,12	0,00%	0,00	0,00
8.2.1.26	96694	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	11,00	18,92	73,35	92,27	1.014,97	0,00%	0,00	0,00	72,73%	8,00	738,16
8.2.1.27	96692	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	8,00	16,15	29,10	45,25	362,00	0,00%	0,00	0,00	100,00%	8,00	362,00
8.2.1.28	96690	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	4,00	13,15	19,41	32,56	130,24	0,00%	0,00	0,00	50,00%	2,00	65,12
8.2.1.29	96688	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	94,00	10,83	9,43	20,26	1.904,44	4,26%	4,00	81,04	95,74%	90,00	1.823,40
8.2.1.30	96637	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	212,00	11,08	3,33	14,41	3.054,92	0,94%	2,00	28,82	0,00%	0,00	0,00
8.2.1.31	ADPT SINAPI 96637	Próprio	JOELHO 90 GRAUS COM INSERTO METÁLICO, PPR, DN 25x1/2" MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	180,00	11,08	7,07	18,15	3.267,00	5,56%	10,00	181,50	27,78%	50,00	907,50
8.2.1.32	96689	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	20,00	10,83	8,79	19,62	392,40	0,00%	0,00	0,00	100,00%	20,00	392,40
8.2.1.33	96707	SINAPI	LUVA, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	5,00	12,61	46,74	59,35	296,75	0,00%	0,00	0,00	40,00%	2,00	118,70
8.2.1.34	96706	SINAPI	LUVA, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	20,00	10,76	19,92	30,68	613,60	0,00%	0,00	0,00	30,00%	6,00	184,08
8.2.1.35	96742	SINAPI	LUVA, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	7,14	13,30	20,44	20,44	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.2.1.36	96703	SINAPI	LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	64,00	7,22	8,89	16,11	1.031,04	0,00%	0,00	0,00	100,00%	64,00	1.031,04
8.2.1.37	ADAP SINAPI (96704) 4	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 75 X 63, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	1,00	2,75	42,06	44,81	44,81	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.2.1.38	ADAP SINAPI (96704) 1	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 63 X 50, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	2,00	2,75	28,39	31,14	62,28	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.2.1.39	ADAP SINAPI 96704	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 50 X 40, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	13,00	2,75	11,61	14,36	186,68	0,00%	0,00	0,00	100,00%	13,00	186,68
8.2.1.40	ADAP SINAPI (96704) 5	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 32, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	10,00	2,75	8,59	11,34	113,40	10,00%	1,00	11,34	90,00%	9,00	102,06
8.2.1.41	96704	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	10,00	6,06	10,81	16,87	168,70	0,00%	0,00	0,00	100,00%	10,00	168,70
8.2.1.42	96702	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	10,00	5,45	3,82	9,27	92,70	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.2.1.43	ADPT SINAPI (96660) 3	Próprio	CONECTOR MACHO, PPR, 75 X 2.1/2", CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	10,00	3,61	312,06	315,67	3.156,70	0,00%	0,00	0,00	100,00%	10,00	3.156,70
8.2.1.44	ADPT SINAPI (96660) 2	Próprio	CONECTOR MACHO, PPR, 63 X 2", CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	18,00	3,61	144,02	147,63	2.657,34	0,00%	0,00	0,00	100,00%	18,00	2.657,34



Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant. Total	Custo Unit [R\$]		Custo Unit. Total [R\$]	Custo Total Atual s/ BDI[R\$]	17ª Medição			SALDO		
						M.O.	MAT.			%	Quant	Valor(R\$)	%	Quant	Valor(R\$)
8.2.1.45	ADPT SINAPI 1966501	Próprio	CONECTOR MACHO, PPR, 50 X 1.1/2, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	8,00	3,61	107,65	111,26	890,08	0,00%	0,00	0,00	100,00%	8,00	890,08
8.2.1.46	ADPT SINAPI 96660	Próprio	CONECTOR MACHO, PPR, 40 X 1.1/4, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	106,00	3,61	86,51	90,12	9.552,72	0,00%	0,00	0,00	100,00%	106,00	9.552,72
8.2.1.47	ADPT SINAPI 96640	Próprio	CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 3/4, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	158,00	5,24	16,63	21,87	3.455,46	0,00%	0,00	0,00	0,63%	1,00	21,87
8.2.1.48	ADPT SINAPI 96641	Próprio	CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 3/4, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	30,00	5,24	10,43	15,67	470,10	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.2.2			ESGOTO, SABÃO E GOROURA							0,00%					
8.2.2.1	91795	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	780,00	0,00	64,42	64,42	50.247,60	0,00%	0	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.2.2.2	91790	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	394,48	0,00	67,81	67,81	26.749,68	0,00%	0,00	0,00	20,49%	80,82	5.480,40
8.2.2.3	91793	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	372,00	0,00	85,71	85,71	31.884,12	0,00%	0,00	0,00	4,88%	18,15	1.555,63
8.2.2.4	91792	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	496,00	0,00	55,25	55,25	27.404,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.2.2.5	104328	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	155,00	18,01	47,35	65,36	10.130,80	0,00%	0,00	0,00	20,65%	32,00	2.091,52
8.2.2.6	89709	SINAPI	RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	124,00	7,03	12,35	19,38	2.403,12	48,39%	60,00	1.162	51,61%	64,00	1.240,32
8.2.2.7	054248	SBC	RAIO ABACAXI FERRO FUNDIDO 150mm	UN	14,00	44,89	46,10	90,99	1.273,86	0,00%	0,00	0,00	100,00%	14,00	1.273,86
8.2.2.8	ADAPT SBC 053487	SINAPI	TUBO PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA 150x200mm	UN	186,00	37,63	18,48	56,11	10.436,46	0,00%	0	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.2.2.9	89811	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	123,00	9,49	35,86	45,35	5.578,05	0,00%	0	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.2.2.10	89531	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	26,00	5,63	38,55	44,18	1.148,68	0,00%	0	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.2.2.11	89810	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	154,00	9,49	20,61	30,10	4.635,40	0,00%	0	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.2.2.12	89834	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	124,00	12,66	41,17	53,83	6.674,92	0,00%	0	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.2.2.13	89827	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	62,00	1,99	18,98	20,97	1.300,14	0,00%	0	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.2.2.14	104345	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	186,00	10,17	33,83	44,00	8.184,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.2.2.15	89690	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	4,00	15,91	84,47	100,38	401,52	0,00%	0	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.2.2.16	89825	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	155,00	1,99	17,03	19,02	2.948,10	0,00%	0,00	0,00	3,87%	6,00	114,12
8.3			REGISTROS E VALVULAS						59.274,78	0,00%		0,00	91,11%		54.006,83
8.3.1	ADPT SINAPI 1952531	Próprio	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	14,46	739,35	753,81	1.507,62	0,00%	0,00	0,00	100,00%	2,00	1.507,62
8.3.2	ADPT SINAPI 95253	Próprio	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	14,46	490,25	504,71	1.514,13	0,00%	0,00	0,00	100,00%	3,00	1.514,13
8.3.3	95253	SINAPI	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2	UN	9,00	14,46	172,37	186,83	1.681,47	0,00%	0,00	0,00	100,00%	9,00	1.681,47
8.3.4	95252	SINAPI	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2	UN	8,00	11,21	111,81	123,02	984,16	0,00%	0,00	0,00	100,00%	8,00	984,16
8.3.5	95251	SINAPI	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4	UN	53,00	8,60	92,81	101,41	5.374,73	0,00%	0,00	0,00	100,00%	53,00	5.374,73
8.3.6	ADPT ORSE (9500) 2	Próprio	Registro gaveta c/canopla cromada, 3/4", linha Link, Deka ou similar	un	184,00	28,58	90,38	118,96	21.888,64	0,00%	0,00	0,00	83,70%	154,00	18.319,84
8.3.7	ADPT ORSE (9500) 3	Próprio	Registro pressão c/canopla cromada, 3/4", linha Link, Deka ou similar	un	90,00	28,58	84,83	113,41	10.206,90	0,00%	0,00	0,00	83,33%	75,00	8.505,75
8.3.8	101917	SINAPI	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	35,90	95,65	131,55	263,10	0,00%	0	0,00	100,00%	2,00	263,10
8.3.9	ADPT CPOS 47.05.460	Próprio	Válvula redutora de pressão de ação direta em bronze, extremidade roscada, para água, ar, óleo e gás, PE= 200 psi e PS= 20 à 90 psi, DN= 2"	UN	2,00	85,20	5.105,46	5.190,66	10.381,32	0,00%	0,00	0,00	100,00%	2,00	10.381,32
8.3.10	ADPT CPOS 47.20.330	Próprio	Filtro "Y" corpo em bronze, pressão de serviço até 20,7 bar (PN 20), DN= 2"	UN	2,00	53,25	291,86	345,11	690,22	0,00%	0,00	0,00	100,00%	2,00	690,22
8.3.11	99624	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	1,00	19,36	454,75	474,11	474,11	0,00%	0,00	0,00	100,00%	1,00	474,11
8.3.12	95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 25 (1/2"), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	m²	31,00	23,00	115,98	138,98	4.308,38	0,00%	0,00	0,00	100,00%	31,00	4.308,38
8.4			ELEMENTOS DE GRANITO						65.436,57	0,00%		0,00	100,00%		65.436,57

345/18
B
19/01/2018

Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant. Total.	Custo Unit (R\$)		Custo Unit. Total (R\$)	Custo Total Atual s/ BDI(R\$)	17ª Medição			SALDO		
						M.O.	MAT.			%	Quant	Valor(R\$)	%	Quant	Valor(R\$)
8.4.1	ADPT SINAPI 98685	Próprio	ESPELHO EM GRANITO COLORIDO, ALTURA 10 CM. AF_06/2018	M	189,10	9,76	28,31	38,07	7.199,03	0,00%	0,00	0,00	100,00%	189,10	7.199,03
8.4.2	ADPT SEINFRA C4069	Próprio	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2,0cm (COLOCADO)	m²	75,96	64,79	300,43	365,22	27.742,11	0,00%	0,00	0,00	100,00%	75,96	27.742,11
8.4.3	ADPT SEINFRA C1944	Próprio	POLIMENTO EM GRANITO E MÁRMORE	m²	0,00	44,23	10,77	55,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.4.4	ADAPT SEINFRA C4756	Próprio	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM	m²	67,73	26,31	423,94	450,25	30.495,43	0,00%	0,00	0,00	100,00%	67,73	30.495,43
8.5			SERVIÇOS DIVERSOS						109.836,99	0,00%		1.103,46	9,14%		10.039,85
8.5.1	90462	SINAPI	PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM PARA SUPORTE DE ATÉ 3 TUBOS VERTICAIS. AF_05/2015	M	156,00	0,38	1,07	1,45	226,20	0,00%	0,00	0,00	7,69%	12,00	17,40
8.5.2	91173	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	M	38,00	0,91	0,61	1,52	59,28	0,00%	0,00	0,00	100,00%	38,00	59,28
8.5.3	91174	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	M	72,52	1,75	1,26	3,01	352,17	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.5.4	91176	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	M	1,00	14,40	12,15	26,55	4.580,40	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.5.5	91177	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	M	1,00	8,05	4,69	12,74	127,40	0,00%	0,00	0,00	100,00%	10,00	127,40
8.5.6	90439	SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	189,00	57,72	0,00	57,72	10.389,60	0,00%	0,00	0,00	7,78%	14,00	808,08
8.5.7	90440	SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	UN	7,00	92,44	0,00	92,44	16.361,88	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.5.8	90441	SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	UN	50	118,07	0,00	118,07	66.945,69	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.5.9	97628	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	0,10	232,10	0,00	232,10	22,28	0,00%	0,00	0,00	100,00%	0,10	22,28
8.5.10	ADPT SEINFRA C1908	Próprio	PINTURA EXTERNA DE RUFO, CALHAS E CONDUTORES C/ESMALTE SINTÉTICO	M	230,00	13,66	3,71	17,37	3.995,10	0,00%	0,00	0,00	100,00%	230,00	3.995,10
8.5.11	ADPT ORSE 7755	Próprio	Painel para shaft de 1,00 x 0,65 sem visita e com acessórios	un	0,00	23,68	144,79	168,47	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8.5.12	ADPT SBC 052278	Próprio	Caixa plástica para proteção de hidrômetro c/tampa articulada em policarbonato	UN	16,00	71,61	74,80	146,41	2.342,56	0,00%	0,00	0,00	100,00%	16,00	2.342,56
8.5.13	ADPT SEINFRA C1238	Próprio	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	M	724,30	5,41	0,05	5,46	3.954,67	27,90%	202,10	1.103,46	67,46%	488,60	2.667,75
8.5.14	ADPT SEINFRA C1239	Próprio	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2")	M	60,50	7,75	0,18	7,93	479,76	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						48.827,84	0,00%		12.257,42	20,05%		9.792,22
9.1			ELETRODUTOS E CAIXAS EM GERAL						48.827,84	0,00%		12.257,42	19,40%		9.471,69
9.1.1	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	639,00	10,89	2,26	13,15	8.402,85	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9.1.2	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,00	6,31	4,53	10,84	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9.1.3	91860	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,00	8,29	5,02	13,31	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9.1.4	91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	985,50	7,23	4,26	11,49	11.323,39	0,00%	0,00	0,00	5,66%	55,80	641,14
9.1.5	ADPT SEINFRA C1239	Próprio	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2")	M	942,10	7,75	0,18	7,93	7.470,85	0,00%	0,00	0,00	1,32%	12,40	98,33
9.1.6	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	30,00	33,67	501,45	535,12	16.053,60	56,67%	17,00	9.097,04	43,33%	13,00	6.956,56
9.1.7	90458	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015	UN	30,00	25,45	0,00	25,45	763,50	56,67%	17,00	432,65	43,33%	13,00	330,85
9.1.8	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	225,00	8,80	8,36	17,16	3.861,00	56,67%	127,50	2.187,90	43,33%	97,50	1.673,10
9.1.9	91873	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	45,00	10,03	11,14	21,17	952,65	56,67%	25,50	539,83	43,33%	19,50	412,81
9.2			LUMINÁRIAS						0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00
9.2.1	060121	SBC	LUMINÁRIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5	UN	0,00	44,15	24,97	69,12	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9.2.2	060081	SBC	LUMINÁRIA EMBUTIR/PAINEL LED DEEP QUADRAO STH8904/30 STELLA	UN	0,00	44,15	104,01	148,16	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9.2.3	060114	SBC	SPOT DIRECIONÁVEL ARQUITETÔNICA USINADA CROMADO C/ DICROICA	UN	0,00	22,07	29,63	51,70	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9.3			TOMADAS E INTERRUPTORES						0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00
9.3.1	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,00	0,00	24,03	24,03	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9.3.2	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,00	0,00	42,59	42,59	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9.3.3	92027	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,00	0,00	56,63	56,63	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9.3.4	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,00	0,00	25,40	25,40	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9.3.5	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,00	0,00	40,75	40,75	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9.3.6	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,00	0,00	27,54	27,54	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00



Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant. Total	Custo Unit [R\$]		Custo Unit Total [R\$]	Custo Total Atual s/ BDI[R\$]	17ª Medição			SALDO		
						M.O.	MAT.			%	Quant	Valor(R\$)	%	Quant	Valor(R\$)
9.3.7	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	0,00	0,00	47,20	47,20	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9.3.8	91987	SINAPI	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2017	UN	0,00	0,00	40,91	40,91	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
9.3.9	98308	SINAPI	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	0,00	9,09	19,86	28,95	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
10.1			INSTALAÇÕES ESPECIAIS - GÁS GLP						8.977,80	0,00%	0,00	0,00	100,00%		8.977,80
10.1.1	103835	SINAPI	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2022	M	112,50	12,38	40,96	53,34	6.000,75	0,00%	0,00	0,00	100,00%	112,50	6.000,75
10.1.2	92326	SINAPI	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	60,00	6,58	5,13	11,71	702,60	0,00%	0,00	0,00	100,00%	60,00	702,60
10.1.3	ADPT SINAPI 92326	Próprio	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	30,00	6,58	5,13	11,71	351,30	0,00%	0,00	0,00	100,00%	30,00	351,30
10.1.4	95248	SINAPI	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	30,00	3,06	39,96	43,02	1.290,60	0,00%	0,00	0,00	100,00%	30,00	1.290,60
10.1.5	ADPT SEINFRA C1238	Próprio	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM. = 15 A 25mm (1/2" A 1")	M	112,50	5,41	0,05	5,46	614,25	0,00%	0,00	0,00	100,00%	112,50	614,25
10.1.6	00004895	SINAPI	PLUG PVC ROSCAVEL, 1/2", ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	30,00	0,00	0,61	0,61	18,30	0,00%	0,00	0,00	100,00%	30,00	18,30
11			PAREDES E PAINÉIS						32.492,46	0,00%	0,00	0,00	15,79%		5.129,47
11.1			ALVENARIA EM BLOCOS CERÂMICOS						32.492,46	0,00%	0,00	0,00	15,79%		5.129,47
11.1.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	m³	423,92	53,38	20,61	73,99	31.365,84	0,00%	0,00	0,00	12,76%	54,10	4.002,85
11.1.2	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	33,00	4,18	29,96	34,14	1.126,62	0,00%	0,00	0,00	100,00%	33,00	1.126,62
11.2			ALVENARIA EM GESSO HIDROFUGANTE						0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%		0,00
11.2.1	C4508	SEINFRA	PAREDE DE BLOCO DE GESSO HIDROFUGANTE, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	m²	0,00	0,00	61,83	61,83	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
12			IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÕES DIVERSAS						248.880,60	0,00%		33.973,64	34,27%		85.299,97
12.1			REGULARIZAÇÃO						131.005,96	0,00%		20.134,77	15,54%		20.356,02
12.1.1	87737	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF 06/2014	m²	831,13	17,54	23,06	40,60	33.743,87	9,94%	82,59	3.353,15	21,78%	181,03	7.349,81
12.1.2	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	m²	642,23	1,81	1,92	3,73	2.395,51	30,43%	195,46	729,06	53,58%	344,10	1.283,49
12.1.3	89048	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF 11/2014	m²	642,23	0,00	33,53	33,53	21.533,97	27,77%	178,34	5.979,74	50,91%	326,99	10.963,97
12.1.4	94779	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF 11/2014	m²	829,11	10,76	29,29	40,05	33.205,85	9,96%	82,59	3.307,72	21,59%	179,01	7.169,35
12.1.5	ADAPT CPOS/CDHU 11.18.220	Próprio	Enchimento de nichos com poliestireno expandido do tipo EPS-SF	m³	8,29	14,79	1.270,12	1.284,91	10.651,90	35,95%	2,98	3.829,03	64,05%	5,31	6.822,87
12.1.6	ADAPT SEINFRA C1235	Próprio	EMULSÃO DE RESINAS ACRÍLICAS EM CONCRETO - 2 DEMÃOS	m²	829,11	29,11	6,44	35,55	29.474,86	9,96%	82,59	2.936,07	21,59%	179,01	6.363,80
12.2			IMPERMEABILIZAÇÃO						88.409,25	0,00%		5.883,13	53,72%		47.491,58
12.2.1	ADPT SINAPI (98546)	Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO A ASFALTO OXIDADO (3 KG/M²), L=4MM, TIPO III B PP. AF 06/2018	m²	183,18	26,57	134,58	161,15	29.519,45	0,00%	0,00	0,00	100,00%	183,18	29.519,45
12.2.2	ADPT SEINFRA C4722	Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ARGAMASSA POLIMÉRICA, RESINA TERMOPLÁSTICA E TELA DE POLIESTER MALHA 2X2MM	m²	1.388,95	10,09	31,59	41,68	57.891,43	10,16%	141,15	5.883,13	29,32%	407,24	16.973,76
12.2.3	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF 06/2018	m²	36,16	14,91	12,70	27,61	998,37	0,00%	0,00	0,00	100,00%	36,16	998,37
12.3			PROTEÇÃO MECÂNICA						29.465,39	0,00%		7.955,74	25,89%		7.653,73
12.3.1	98563	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF 06/2018	m²	243,52	11,66	20,16	31,82	7.748,80	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
12.3.2	98564	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF 06/2018	m²	486,81	12,98	31,63	44,61	21.716,59	36,63%	178,34	7.955,74	35,24%	171,57	7.653,73
13			ESQUADRIAS, TERRAGENS E VIDROS						272.816,03	0,00%		0,00	100,00%		272.816,03
13.1			ESQUADRIA DE MADEIRA						192.088,91	0,00%		0,00	100,00%		192.088,91
13.1.1	90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OC (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	110,00	0,00	912,61	912,61	100.387,10	0,00%	0,00	0,00	100,00%	110,00	100.387,10
13.1.2	90842	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OC (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	10,00	0,00	920,54	920,54	9.205,40	0,00%	0,00	0,00	100,00%	10,00	9.205,40
13.1.3	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OC (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	33,00	0,00	963,20	963,20	31.785,60	0,00%	0,00	0,00	100,00%	33,00	31.785,60
13.1.4	C3873	SEINFRA	GRELHA DE INSUFILAMENTO/RETORNO, EM ALUMÍNIO ATÉ 0,25 M2 (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	30,00	0,00	121,42	121,42	3.642,60	0,00%	0,00	0,00	100,00%	30,00	3.642,60
13.1.5	ADPT SEINFRA C2031	Próprio	PRENDEDOR METÁLICO PARA PORTA	UN	94,00	7,71	32,11	39,82	3.743,08	0,00%	0,00	0,00	100,00%	94,00	3.743,08
13.1.6	90831	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	123,00	24,60	110,85	135,45	16.660,35	0,00%	0,00	0,00	100,00%	123,00	16.660,35



Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant. Total	Custo Unit [R\$]		Custo Unit Total [R\$]	Custo Total Atual s/ BDI [R\$]	17ª Medição			SALDO		
						M.O.	MAT.			%	Quant	Valor [R\$]	%	Quant	Valor [R\$]
13.1.7	90830	SINAPI	FACHADA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	63,00	12,13	122,33	154,46	9.730,98	0,00%	0,00	0,00	100,00%	63,00	9.730,98
13.1.8	100659	SINAPI	ALIZAR DE SCL, SCM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M	1.690,00	2,17	7,85	10,02	16.933,80	0,00%	0,00	0,00	100,00%	1.690,00	16.933,80
13.1.9	ADPT SINAPI 90320	Próprio	REINSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA COM REAPROVETAMENTO	UN	0,00	41,11	0,00	41,11	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
13.2			ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E/OU VIDRO						50.000,22	0,00%	0,00	0,00	100,00%		50.000,22
13.2.1	021422	SBC	REVISÃO E RECUPERAÇÃO DE CAIXILHOS FIXOS PARA VIDRO	m²	0,00	69,12	158,36	227,48	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
13.2.2	ADAP SBC (150163)	Próprio	VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8mm PARA BOX COM FERRAGEM DE FIXAÇÃO	m²	131,10	47,53	333,86	381,39	50.000,22	0,00%	0,00	0,00	100,00%	131,10	50.000,22
13.3			PECAS DE APOIO						30.726,90	0,00%	0,00	0,00	100,00%		30.726,90
13.3.1	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	90,00	27,79	313,62	341,41	30.726,90	0,00%	0,00	0,00	100,00%	90,00	30.726,90
14			REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS						440.050,14	0,00%		51.314,86	72,67%		319.802,61
14.1			CHAPISCO						5.935,51	0,00%		0,00	0,00%		0,00
14.1.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	m²	1.416,59	1,81	2,38	4,19	5.935,51	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
14.2			MASSA ÚNICA						55.123,51	0,00%		0,00	4,99%		2.745,09
14.2.1	89048	SINAPI	[COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA] DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONERA DE 400L, EMPAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALUSAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL, MÚLTIPLO FAMILIAR (PRÉDIO). AF 11/2014	m²	1.416,59	0,00	33,53	33,53	47.498,26	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
14.2.2	ADAPT SBC 090307	Próprio	ALVENARIA TIPO MACICO EM ESPELHO-CAL/ÁREA 1:1:15	m²	56,25	69,39	66,17	135,56	7.625,25	0,00%	0,00	0,00	36,00%	20,25	2.745,09
14.3			REVESTIMENTO CERÂMICO						372.125,47	0,00%		51.314,86	81,35%		270.182,87
14.3.1	ADPT 2 SINAPI 87273	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES ATÉ 45X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES. AF 06/2014	m²	3.765,79	22,34	48,19	70,53	265.601,16	15,30%	576,04	40.628,10	81,50%	3.069,17	216.468,56
14.3.2	ADPT SINAPI 87273	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES ATÉ 45X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRAS DAS PAREDES. AF 06/2014	m²	240,57	22,34	53,71	76,05	18.295,34	16,34%	39,32	2.990,28	81,27%	195,50	14.867,77
14.3.3	ADPT SENIRA C0674	Próprio	REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE - ARGAMASSA COLA AC-III												
14.3.3			CANTEIREIRA DE ALUMÍNIO/ AZULEJOS	M	1.933,80	21,61	3,33	24,94	48.328,97	15,96%	308,60	7.696,48	80,55%	1.557,60	38.846,54
14.4			FORRO						46.874,65	0,00%		0,00	100,00%		46.874,65
14.4.1	96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF 05/2017 P	m²	738,96	26,32	12,23	38,55	28.486,90	0,00%	0,00	0,00	100,00%	738,96	28.486,90
14.4.2	96111	SINAPI	FORRO EM REGUAS DE PVC, PRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P	m²	312,08	10,42	48,50	58,92	18.387,75	0,00%	0,00	0,00	100,00%	312,08	18.387,75
15			PISOS, SOLHAS E RODAPÉS						82.902,86	0,00%		12.343,32	77,73%		84.441,74
15.1			REVESTIMENTO CERÂMICO						61.725,95	0,00%		12.343,32	70,10%		69.270,83
15.1.1	ADPT 2 SINAPI 87246	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES ATÉ 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF 06/2014	m²	151,23	20,08	46,51	66,59	10.070,40	5,82%	8,80	585,99	92,73%	140,23	9.337,91
15.1.2	ADPT SINAPI 87247	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES ATÉ 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 06/2014	m²	495,23	13,94	45,79	59,73	29.580,08	32,09%	158,93	9.492,88	48,65%	240,94	14.391,34
15.1.3	ADPT SINAPI 87246	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES ATÉ 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF 06/2014 - COLADA COM AC III	m²	311,11	20,08	50,89	70,97	22.079,47	10,26%	31,91	2.264,65	88,51%	275,35	19.541,58
15.2			SOLHAS E FRETTES						21.172,91	0,00%		0,00	100,00%		21.172,91
15.2.1	ADPT SINAPI 98639	Próprio	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 5 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF 09/2020	M	205,80	17,85	26,51	44,36	9.129,28	0,00%	0,00	0,00	100,00%	205,80	9.129,28
15.2.2	98639	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF 09/2020	M	131,61	17,85	73,66	91,51	12.043,63	0,00%	0,00	0,00	100,00%	131,61	12.043,63
16			PINTURA						24.018,08	0,00%		0,00	100,00%		24.018,08
16.1			PAREDE						0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00
16.1.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m²	0,00	1,73	1,07	2,30	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
16.1.2	96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF 05/2017	m²	0,00	12,70	3,72	16,42	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
16.1.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	0,00	5,93	6,62	12,55	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
16.2			TETO						0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00
16.2.1	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m²	0,00	1,61	1,07	2,68	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
16.2.2	88494	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF 06/2014	m²	0,00	15,98	2,08	18,06	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
16.2.3	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	0,00	7,71	6,62	14,33	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00



Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant. Total	Custo Unit (R\$)		Custo Unit. Total (R\$)	Custo Total Atual s/ BDI(R\$)	17ª Medição			SALDO		
						M.O.	MAT.			%	Quant	Valor(R\$)	%	Quant	Valor(R\$)
16.2			MADEIRA						24.018,08	0,00%	0,00	0,00	100,00%		24.018,08
16.3.1	102200	SINAPI	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF. 01/2021	m³	480,38	9,24	5,59	14,83	7.124,03	0,00%	0,00	0,00	100,00%	480,38	7.124,03
16.3.2	102197	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF. 01/2021	m²	362,25	7,05	10,33	17,38	6.295,90	0,00%	0,00	0,00	100,00%	362,25	6.295,90
16.3.3	102217	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃO'S. AF. 01/2021	m²	722,93	9,57	5,09	14,66	10.598,15	0,00%	0,00	0,00	100,00%	722,93	10.598,15
17.1	00010515	SINAPI	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL 4, FORMATO MAIOR A 20x25 CM2	m²	145,80	0,00	35,90	35,90	5.234,22	0,00%	0,00	0,00	100,00%	145,80	5.234,22
CUSTO TOTAL DA OBRA - (R\$)									2.647.311,97	TOTAL S/ BDI			130.246,37		
BONIFICAÇÃO E DESPESAS - (BDI)¹									20,16%	VALOR BDI			26.259,05		
ARREDONDAMENTO DO 1º JTA									-10,84	ARRED. DO 1º JTA			0,00		
DESCONTOS COMPLEMENTARES									-36.543,61	DESCONTOS COMP.			-3.543,61		
1º REAJUSTE									103.084,91	1º REAJUSTE			59.049,76		
PREÇO TOTAL DA OBRA - (R\$)									3.247.568,64	11ª Med/Valor GLOBAL(%)			4,82%		
										TOTAL C/ BDI			156.505,42		
													SALDO C/ BDI		
													1.694.371,15		

Documento assinado digitalmente

Documento assinado digitalmente

Documento assinado digitalmente


gov.br



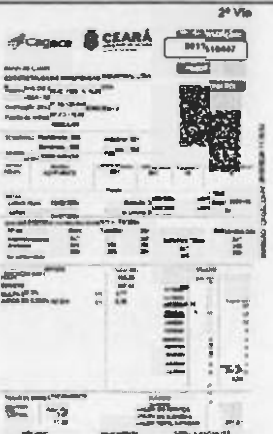
	DESTACAMENTO DO SERVIÇO REGIONAL DE OBRAS DA 10ª REGIÃO MILITAR (1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA)		
	TERMO DE CONTRATO Nº 01/2023 - 1º GPT E (1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA)		
	OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA	CONTRATADA: G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.	
	RM: 10ªRM	CONTRATADA: 09.145.367/0001-78	
	OM BENEFICIADA: 1º GPT E	DATA DA MEDIÇÃO: 25/09/2024	
	LOCAL: FORTALEZA-CE	MEDIÇÃO: 17ª Medição	
	BDI: 20,16%	AREA:	
MEMÓRIA DE MEDIÇÃO - EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DO EDIFÍCIO VILAGRAN CABRITA (OPUS:201110000045 e 201910000045)			

2									
SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS									
2.1		PESSOAL							
2.1.1		90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				TOTAL	60,73
Local						PREVISTO	% EXECUTADA	APROVADO	MEDIDO
SERVIÇOS						1.144,00	5,31%	60,73	60,73
		FOTOS/FIGURAS				OBSERVAÇÕES			
		SEM IMAGEM				O CÁLCULO PROPORCIONAL LEVOU EM CONSIDERAÇÃO A FRAÇÃO ENTRE OS SERVIÇOS ORÇADOS E OS SERVIÇOS EXECUTADOS, COMPOSTOS PELOS ITENS (1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 E 17, QUE SÃO ITENS RELATIVOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS)			
2.1.2		90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				TOTAL	121,45
Local						PREVISTO	% EXECUTADA	APROVADO	MEDIDO
SERVIÇOS						2.288,00	5,31%	121,45	121,45
		FOTOS/FIGURAS				OBSERVAÇÕES			
		SEM IMAGEM				O CÁLCULO PROPORCIONAL LEVOU EM CONSIDERAÇÃO A FRAÇÃO ENTRE OS SERVIÇOS ORÇADOS E OS SERVIÇOS EXECUTADOS, COMPOSTOS PELOS ITENS (1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 E 17, QUE SÃO ITENS RELATIVOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS)			
2.1.3		90766	SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				TOTAL	121,45
Local						PREVISTO	% EXECUTADA	APROVADO	MEDIDO
SERVIÇOS						2.288,00	5,31%	121,45	121,45
		FOTOS/FIGURAS				OBSERVAÇÕES			
		SEM IMAGEM				O CÁLCULO PROPORCIONAL LEVOU EM CONSIDERAÇÃO A FRAÇÃO ENTRE OS SERVIÇOS ORÇADOS E OS SERVIÇOS EXECUTADOS, COMPOSTOS PELOS ITENS (1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 E 17, QUE SÃO ITENS RELATIVOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS)			



6		CANTEIRO DE OBRAS											
6.1		DIVERSOS											
6.1.3		SRO01		Próprio		CONSUMO DE ENERGIA				TOTAL		369,99	kWh
Local						CUSTO		REGISTRADO	QUANTIDADE	REPETIÇÃO	MEDIDO	kWh	
MEDICÃO PRÓPRIA MÊS 08						0,88	325,59	369,99	1,00	369,99			
						0,88		0,00	2,00	0,00			
MEDICÃO PRÉDIO						0,88		0,00		0,00			
TOTAL										369,99			
											SALDO EM CONTRATO	5271,43	
FOTOS/FIGURAS													OBSERVAÇÕES
		SEM IMAGEM											MEDIDO CONFORME FATURA DE ENERGIA FORNECIDO PELA ENEL, SEGUE AO LADO O COMPROVANTE DO PAGAMENTO DA ENERGIA DO CONDOMINIO PELA CONTRATADA REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023 A FEVEREIRO DE 2024





6.1.5	SRO02	Próprio	Tarifa de esgoto				TOTAL	17,82	m³
Local				CUSTO	VLR REGISTRADO	QUANTIDADE	REPETIÇÃO	MEDIDO	m³
MEDIDAÇÃO PRÓPRIA MÊS 08				9,41	167,64	17,82	1,00	17,82	
				9,41		0,00	1,00	0,00	
TOTAL								17,82	
							SALDO EM CONTRATO	106,89	
FOTOS/FIGURAS						OBSERVAÇÕES			
						MEDIDO CONFORME A TARIFA MINIMA DE AGUA/ESGOTO FORNECIDO PELA CAGECE.			



6.1.13	SRO02	Próprio	TARIFA DE ÁGUA	MÊS ANT.	CUSTO	VLR REGISTRADO	QUANTIDADE	TOTAL	20.18	MES
Local	MEDIÇÃO PRÓPRIA MÊS 08									MES
					9,41	189,90	20,18	REPETIÇÃO	20,18	
					9,41		0,00		0,00	
TOTAL										
FOTOS/FIGURAS										
OBSERVAÇÕES										
SEM IMAGEM										
MEDIDO CONFORME A TARIFA MINIMA DE AGUA/ESGOTO FORNECIDO PELA CAGECE. NO ENTANTO, NÃO TINHA MAIS SALDO DE QUANTITATIVO NO CONTRATO E APÓS ADITIVO SERÁ MEDIDO O RESTANTE.										
20,18										
209,78										






8.2 COLUNAS, BARRILETES E RAMAIS														
8.2.1 HIDRÁULICA														
8.2.1.5		96670	SINAPI	TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2015			COMP. (m)	24,00	REPETIÇÃO	1,00	TOTAL	24,00	M	
Local		RAMAL PILOTIS										M		
												TOTAL	24,00	
												SALDO MEDIÇÃO ANTERIOR		189,42
FOTOS/FIGURAS														
						SEM IMAGEM		MEDIDOPOR METRO LINEAR APLICADO, CONFORME MEMORIA DE CÁLCULO ACIMA						
8.2.1.6		91787	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF. 10/2015			COMP. (m)	6,00	REPETIÇÃO	1,00	TOTAL	6,00	M	
Local		ESTRAVASOR CX D'ÁGUA										M		
												TOTAL	6,00	
												SALDO MEDIÇÃO ANTERIOR		211,88
FOTOS/FIGURAS														
						SEM IMAGEM		MEDIDOPOR METRO LINEAR APLICADO, CONFORME MEMORIA DE CÁLCULO ACIMA						



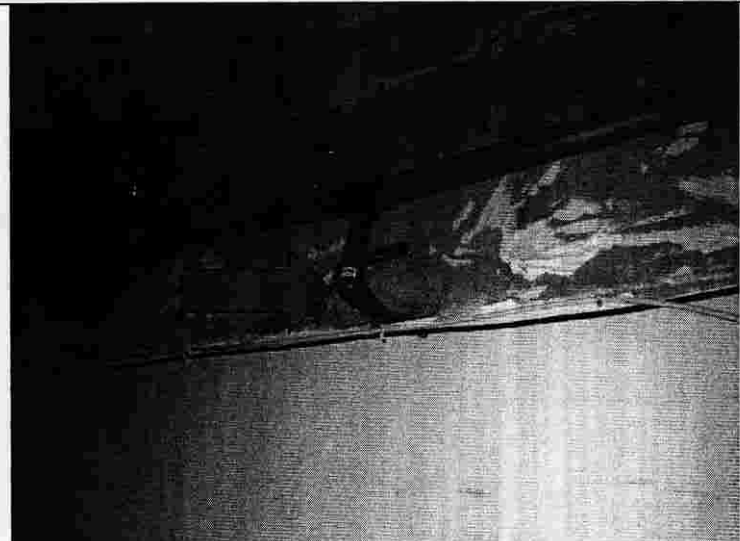
8.2.1.11	89452	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014				TOTAL	25,00	M						
Local	CAIXA D'ÁGUA						COMP. (m)	REPETIÇÃO	MEDIDO	M					
							25,00	1,00	25,00						
									0,00						
									0,00						
									0,00						
						TOTAL		25,00							
						SALDO MEDIÇÃO ANTERIOR		25,00							
FOTOS/FIGURAS						OBSERVAÇÕES									
						SEM IMAGEM									
						MEDIDOPOR METRO LINEAR APLICADO, CONFORME MEMORIA DE CÁLCULO ACIMA									

8.2.1.12	89631	SINAPI	TE- PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014		TOTAL	3,00	UN
Local					QUANT. (Und)	REPETIÇÃO	MEDIDO
CAIXA D'ÁGUA					3,00	1,00	3,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
					TOTAL		3,00
					SALDO MEDIÇÃO ANTERIOR		4,00
		FOTOS/FIGURAS			OBSERVAÇÕES		
					SEM IMAGEM		
					MEDIDOPOR METRO LINEAR APLICADO, CONFORME MEMORIA DE CÁLCULO ACIMA		
8.2.1.19	96642	SINAPI	TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_06/2015		TOTAL	7,00	UN
Local					QUANT. (Und)	REPETIÇÃO	MEDIDO
WC MASTER					2,00		0,00
WC SOCIAL					2,00		0,00
WC SERVIÇO					2,00		0,00
LAVABO					1,00		0,00
HALL SF					3,00	1,00	3,00
WC ZELADOR					2,00	1,00	2,00
WC MASC SF					1,00	1,00	1,00
WC FEM SF					1,00	1,00	1,00
					TOTAL		7,00
					SALDO MEDIÇÃO ANTERIOR		50,00
		FOTOS/FIGURAS			OBSERVAÇÕES		
					SEM IMAGEM		
					MEDIDOPOR METRO LINEAR APLICADO, CONFORME MEMORIA DE CÁLCULO ACIMA		

8.2.1.22	ADPT SINAPI 96712	Próprio	TÊ REDUÇÃO, PPR, DN 40x32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022				TOTAL	2,00	UN
Local			QUANT. (Und)				REPETIÇÃO	MEDIDO	UN
COZINHA SF			1,00				1,00	1,00	
WC ZELADOR			1,00				1,00	1,00	
								0,00	
								0,00	
							TOTAL	2,00	
							SALDO MEDIÇÃO ANTERIOR	32,00	
FOTOS/FIGURAS			OBSERVAÇÕES						
			SEM IMAGEM		SEM IMAGEM		MEDIDOPOR METRO LINEAR APLICADO, CONFORME MEMORIA DE CÁLCULO ACIMA		
8.2.1.25	89521	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014				TOTAL	12,00	UN
Local			QUANT. (Und)				REPETIÇÃO	MEDIDO	UN
CAIXA D'ÁGUA			6,00				2,00	12,00	
							TOTAL	12,00	
							SALDO MEDIÇÃO ANTERIOR	12,00	
FOTOS/FIGURAS			OBSERVAÇÕES						
							MEDIDOPOR METRO LINEAR APLICADO, CONFORME MEMORIA DE CÁLCULO ACIMA		



8.2.1.29	96688	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015		TOTAL	4,00	UN
Local	QUANT. (Und)				REPETIÇÃO	MEDIDO	UN
PILOTIS	4,00				1,00	4,00	
				TOTAL		4,00	
				SALDO MEDIÇÃO ANTERIOR		94,00	
FOTOS/FIGURAS				OBSERVAÇÕES			
				SEM IMAGEM		MEDIDOPOR METRO LINEAR APLICADO, CONFORME MEMORIA DE CÁLCULO ACIMA	

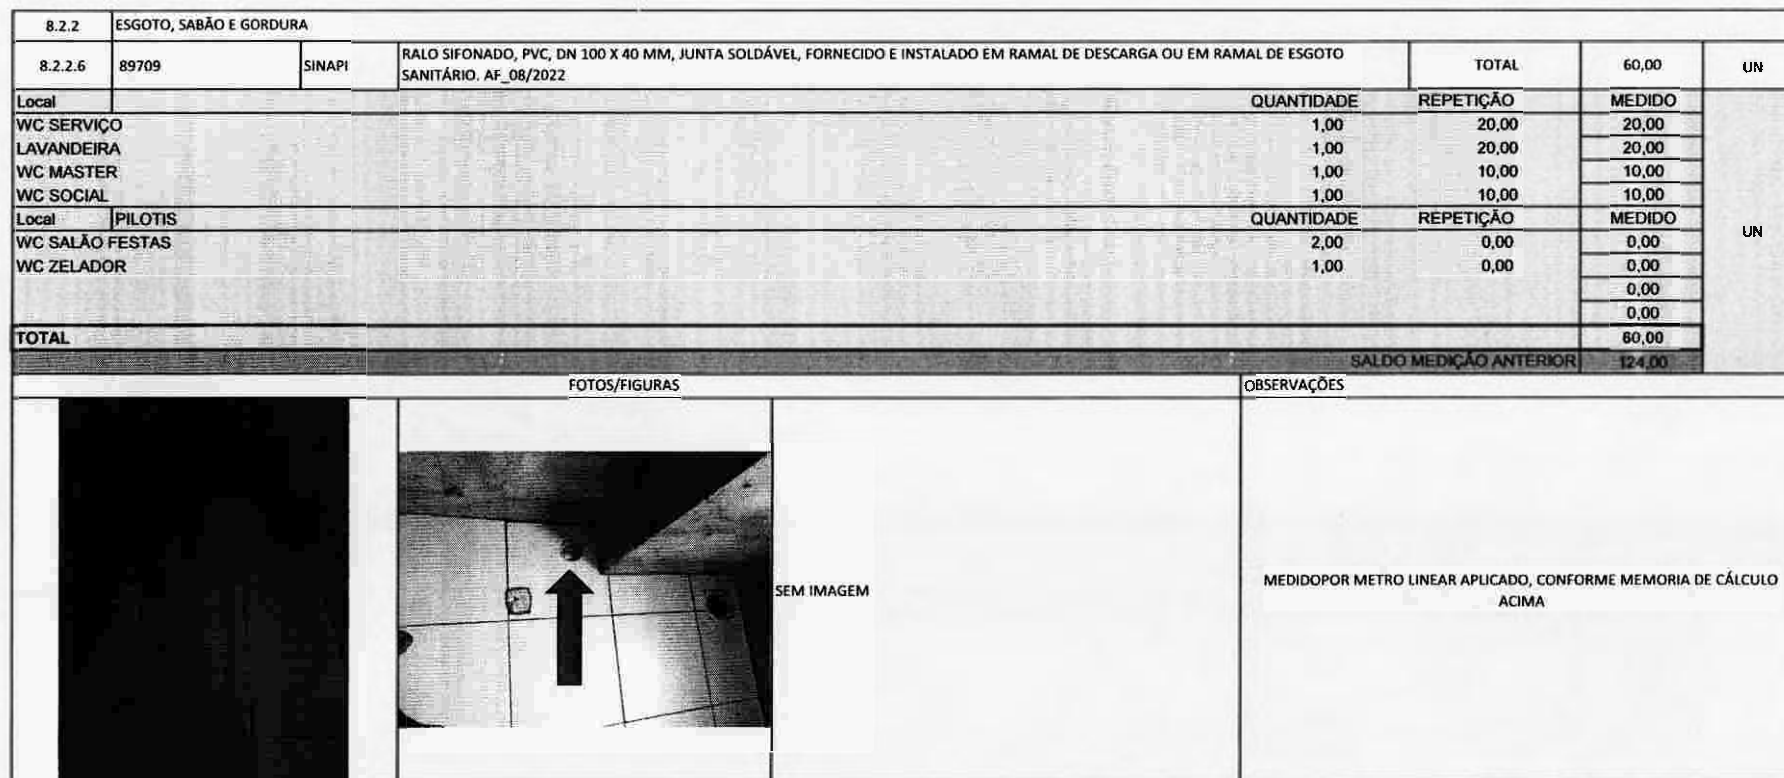
8.2.1.30	96637	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015	TOTAL	2,00	UN
Local				QUANT. (Und)	REPETIÇÃO	MEDIDO
COZINHA				3,00		0,00
LAVANDERIA				4,00		0,00
WC SERVIÇO				4,00		0,00
LAVABO				2,00		0,00
WC SOCIAL				4,00		0,00
WC MASTER				4,00		0,00
WC MASC SF				2,00	1,00	2,00
WC FEM SF				2,00	1,00	2,00
WC ZELADOR				4,00	1,00	4,00
HALL				1,00	1,00	1,00
COZINHA SF				2,00	1,00	2,00
				TOTAL		11,00
				SALDO MEDIÇÃO ANTERIOR		2,00
FOTOS/FIGURAS				OBSERVAÇÕES		
				SEM IMAGEM		
				MEDIDO POR METRO LINEAR APLICADO, CONFORME MEMORIA DE CÁLCULO ACIMA		




8.2.1.31	ADPT SINAPI 96637	Próprio	JOELHO 90 GRAUS COM INSERTO METÁLICO, PPR, DN 25x1/2" MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022				TOTAL	10,00	UN
Local							QUANT. (Und)	REPETIÇÃO	MEDIDO
COZINHA							1,00		0,00
WC SERVIÇO							3,00		0,00
LAVABO							2,00		0,00
WC SOCIAL							3,00		0,00
WC MASTER							3,00		2,00
WC MASC SF							2,00	1,00	2,00
WC FEM SF							2,00	1,00	0,00
WC ZELADOR							3,00	1,00	0,00
HALL							1,00	1,00	1,00
COZINHA SF							2,00	1,00	2,00
							TOTAL	10,00	
							SALDO MEDIÇÃO ANTERIOR	60,00	
FOTOS/FIGURAS							OBSERVAÇÕES		
		SEM IMAGEM		SEM IMAGEM		MEDIDOPOR METRO LINEAR APLICADO, CONFORME MEMORIA DE CÁLCULO ACIMA			



8.2.1.40	ADAP SINAPI (96704) 5	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 32, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015				TOTAL	1,00	UN	
Local	QUANT.						REPETIÇÃO	MEDIDO	UN	
RAMAL PILOTIS						1,00	1,00	1,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
							TOTAL	1,00		
						SALDO MEDIÇÃO ANTERIOR			10,00	
FOTOS/FIGURAS						OBSERVAÇÕES				
						SEM IMAGEM		MEDIDO POR METRO LINEAR APLICADO, CONFORME MEMORIA DE CÁLCULO ACIMA		



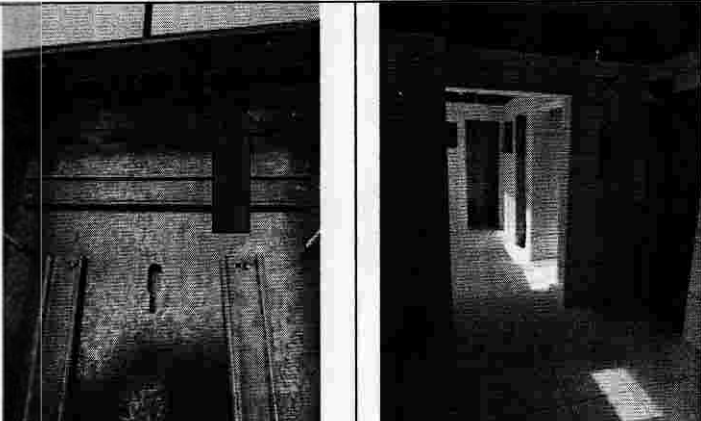
8.5	SERVIÇOS DIVERSOS						
8.5.13	ADPT SEINFRA C1238	Próprio	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")		TOTAL	202,10	M
Local			ALTURA	Comp (m)	Repetição	MEDIDO	
WC MASTER			2,50	2,11	10,00	46,10	M
WC SOCIAL			2,50	2,11	10,00	46,10	
WC SERVIÇO			2,50	1,36	10,00	38,60	
COZINHA			1,30	2,47	10,00	37,70	
LAVABO			2,50	1,25	5,00	18,75	
LAVANDERIA			1,30	1,67	5,00	14,85	
WC LADOR			2,50	1,30		0,00	
COZINHA SF			1,30	0,40		0,00	
WC SF MASC			2,50	1,80		0,00	
WC SF FEM			2,50	1,80		0,00	
PIA HALL SF			2,50	0,60		0,00	
TOTAL						202,10	
SALDO MEDIÇÃO ANTERIOR						690,70	
FOTOS/FIGURAS				OBSERVAÇÕES			
				MEDIDOPOR METRO LINEAR APLICADO, CONFORME MEMORIA DE CÁLCULO ACIMA			



9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
9.1	ELETRODUTOS E CAIXAS EM GERAL									
9.1.6	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020					TOTAL	17,00	UND
Local						QUANTIDADE	REPETIÇÃO	MEDIDO		
APARTAMENTOS						1,00	17,00	17,00		
PILOTIS						1,00		0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		
								0,00		



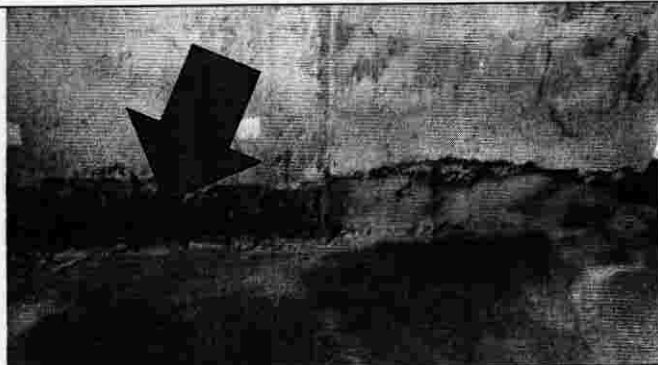
9.1.7	90458	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015				TOTAL	17,00	UND
Local							QUANTIDADE	REPETIÇÃO	MEDIDO
APARTAMENTOS PILOTIS							1,00	17,00	17,00
							1,00		0,00
									0,00
									0,00
						TOTAL		17,00	
						SALDO MEDIÇÃO ANTERIOR		30,00	
FOTOS/FIGURAS							OBSERVAÇÕES		
							MEDIDOPOR METRO LINEAR APLICADO, CONFORME MEMORIA DE CÁLCULO ACIMA		

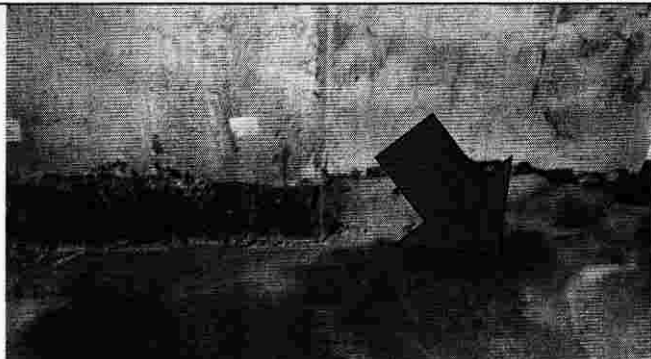
9.1.8	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	TOTAL	127,50	M
Local				COMP. (m)	Projetado	Repetição
				1,50	5,00	17,00
						MEDIDO
						127,50
				TOTAL		127,50
				SALDO MEDIÇÃO ANTERIOR		225,00
FOTOS/FIGURAS				OBSERVAÇÕES		
				MEDIDO POR METRO LINEAR APLICADO, CONFORME MEMORIA DE CÁLCULO ACIMA		



9.1.9	91873	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				TOTAL	25,50	M
Local				COMP. (m)	Projetado	Repetição	MEDIDO		
				1,50	1,00	17,00	25,50		
				TOTAL			25,50		
				SALDO MEDIÇÃO ANTERIOR			45,00		
FOTOS/FIGURAS				OBSERVAÇÕES					
									
				MEDIDO POR METRO LINEAR APLICADO, CONFORME MEMORIA DE CÁLCULO ACIMA					

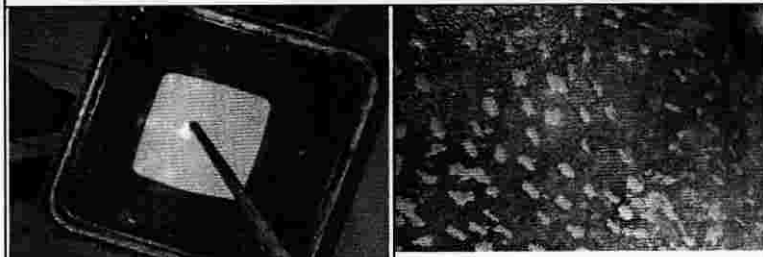
12	IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÕES DIVERSAS					
12.1	REGULARIZAÇÃO					
12.1.1	#7737	SINAPI	CONT RAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	TOTAL	82,59	m²
Local				ÁREA	REPETIÇÃO	MEDIDO
CONTRA PISO WC MASTER				3,22	10,00	32,16
CONTRA PISO WC SOCIAL				3,41	10,00	34,06
CONTRA PISO LAVABO				3,64	10,00	16,37
CONTRA PISO WC SERVIÇO				1,92		-
CONTRA PISO COZINHA RIA				,93		-
C PISO LAVANDE				9,96		-
CONTRA PISO DESPENSA SF				5,10		-
CONTRA PISO WC MASI SF				1,83		-
C PISO WC FEM SF				2,74		-
CONTRA PISO HALL PIA SF				5,37		-
CONTRA PISO COZINHA LADOR				2,86		-
CONTRA PISO WC ZE				2,02		-
CONTRA PISO LAJE COBER.				205,00		-
CONTRA PISO RESERVATÓRIO				2,02		-
				TOTAL	82,59	
				SALDO MEDIÇÃO ANTERIOR	263,62	
FOTOS/FIGURAS				OBSERVAÇÕES		
				MEDIDO POR METRO LINEAR APLICADO, CONFORME MEMORIA DE CÁLCULO ACIMA		

12.1.2	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF 06/2014				TOTAL	195,46	m²
PAREDE									
Local			COMP. (m)	ALT. (m)	DESCONTO (m)	REPETIÇÃO	MEDIDO	m²	
WC MASTER			7,62	0,30	0,60	10,00	21,06		
WC SOCIAL			7,80	0,30	0,60	10,00	21,60		
WC SERVIÇO			5,48	0,30	0,60	16,00	23,42		
LAVABO			5,90	0,30	0,60	10,00	15,90		
COZINHA			12,88	0,30	1,50	16,00	54,62		
LAVANDERIA			10,46	0,30	1,30	16,00	43,97		
DESPENSA			3,10	0,30	0,00	16,00	14,88		
WC MASC SALÃO DE FESTAS			5,61	0,30	0,60		0,00		
WC FEM SALÃO DE FESTAS			5,63	0,30	0,60		0,00		
HALL PIA SALÃO DE FESTAS			4,54	0,30	1,20		0,00		
COZINHA DO SALÃO DE FESTAS			9,76	0,30	1,40		0,00		
BANHEIRO ZELADOR			5,73	0,30	0,60		0,00		
CAIXA D'ÁGUA			17,54	4,80	0,00		0,00		
						TOTAL	195,46		
						SALDO MEDIÇÃO ANTERIOR	539,56		
FOTOS/FIGURAS					OBSERVAÇÕES				
					SEM IMAGEM				
					MEDIDO POR METRO LINEAR APLICADO, CONFORME MEMORIA DE CÁLCULO ACIMA				

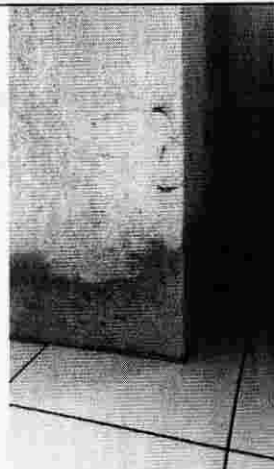
12.1.3	89048	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014				TOTAL	178,34	m²
PAREDE									m²
Local			COMP. (m)	ALT. (m)	DESCONTO (m)	REPETIÇÃO	MEDIDO		
WC MASTER			7,62	0,30	0,60	10,00	21,06		
WC SOCIAL			7,80	0,30	0,60	10,00	21,60		
WC SERVIÇO			5,48	0,30	0,60	14,00	20,50		
LAVABO			5,90	0,30	0,60	10,00	15,90		
COZINHA			12,88	0,30	1,50	14,00	47,80		
LAVANDERIA			,46	0,30	1,30	14,00	38,47		
DESPENSA			3,10	0,30	0,00	14,00	13,02		
WC MASC SALÃO DE FESTAS			5,61	0,30	0,60		0,00		
WC FEM SALÃO DE FESTAS			5,63	0,30	0,60		0,00		
HALL PIA SALÃO DE FESTAS			5,54	0,30	1,20		0,00		
COZINHA DO SALÃO DE FESTAS				0,30	1,40		0,00		
BANHEIRO ZELADOR			5,75	0,30	0,60		0,00		
CAIXA D'ÁGUA			17,54	4,80	0,00		0,00		
							TOTAL	178,34	
							SALDO MEDIÇÃO ANTERIOR	505,33	
FOTOS/FIGURAS					OBSERVAÇÕES				
					MEDIDO POR METRO LINEAR APLICADO, CONFORME MEMORIA DE CÁLCULO ACIMA				

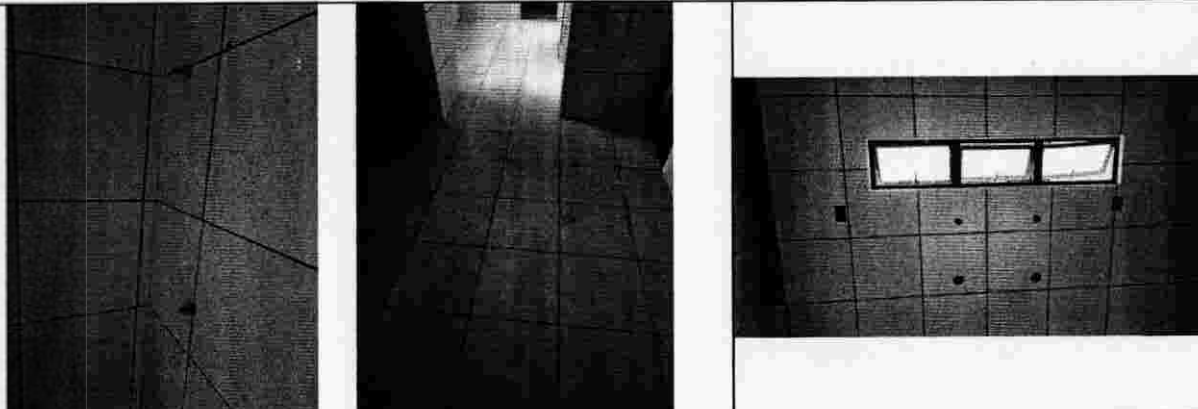


12.1.4	94779	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	TOTAL	82,59	m²
Local				ÁREA	REPETIÇÃO	MEDIDO
CONTRA PISO WC MASTER				3,22	10,00	32,16
CONTRA PISO WC SOCIAL				3,41	00	34,06
CONTRA PISO LAVABO				1,64	10,00	16,37
CONTRA PISO WC SERVIÇO				1,92		-
CONTRA PISO COZINHA				9,93		-
CONTRA PISO LAVANDERIA				5,96		-
CONTRA PISO DESPENSA				1,10		-
CONTRA PISO WC MASC SF				1,83		-
CONTRA PISO WC FEM SF				1,74		-
CONTRA PISO HALL PIA SF				2,37		-
CONTRA PISO COZINHA SF				5,86		-
CONTRA PISO WC ZELADOR				2,02		-
CONTRA PISO LAJE COBER.				205,00		-
				TOTAL	82,59	
				SALDO MEDIÇÃO ANTERIOR	261,60	
FOTOS/FIGURAS				OBSERVAÇÕES		
				MEDIDO POR METRO LINEAR APLICADO, CONFORME MEMORIA DE CÁLCULO ACIMA		

12.1.5	ADAPT CPOS/CDHU 11.18.220	Próprio	Enchimento de nichos com poliestireno expandido do tipo EPS-Sf				TOTAL	2,98	m²			
Local							% APLICADA	ÁREA	ESPESSURA (m)	REPETIÇÃO	MEDIDO	m²
WC SOCIAL						90,00%	3,22	0,05	10,00	1,45		
WC MASTER						90,00%	3,41	0,05	10,00	1,53		
LAVANDERIA						10,00%	9,93	0,03		0,00		
COZINHA						10,00%	5,96	0,03		0,00		
						TOTAL				2,98		
						SALDO MEDIÇÃO ANTERIOR				8,29		
FOTOS/FIGURAS						OBSERVAÇÕES						
						MEDIDO POR METRO LINEAR APLICADO, CONFORME MEMORIA DE CÁLCULO ACIMA						
12.1.6	ADAPT SEINFRA C1235	Próprio	EMULSÃO DE RESINAS ACRÍLICAS EM CONCRETO - 2 DEMÃOS				TOTAL	82,59	m²			
Local							ÁREA	REPETIÇÃO	MEDIDO	m²		
CONTRA PISO WC MASTER						3,22	10,00	32,16				
CONTRA PISO WC SOCIAL						3,41	10,00	34,06				
CONTRA PISO LAVABO						1,64	10,00	16,37				
CONTRA PISO WC SERVIÇO						1,92		-				
CONTRA PISO COZINHA						9,93		-				
CONTRA PISO LAVANDERIA						5,96		-				
CONTRA PISO DESPENSA						1,10		-				
CONTRA PISO WC MASC SF						1,83		-				
CONTRA PISO WC FEM SF						1,74		-				
CONTRA PISO HALL PIA SF						2,37		-				
CONTRA PISO COZINHA SF						5,86		-				
CONTRA PISO WC ZELADOR						2,02		-				
CONTRA PISO LAJE COBER.						205,00		-				
CONTRA PISO RESERVATÓRIO						2,02		-				
						TOTAL		82,59				
						SALDO MEDIÇÃO ANTERIOR		261,60				
FOTOS/FIGURAS						OBSERVAÇÕES						
						MEDIDO POR METRO LINEAR APLICADO, CONFORME MEMORIA DE CÁLCULO ACIMA						

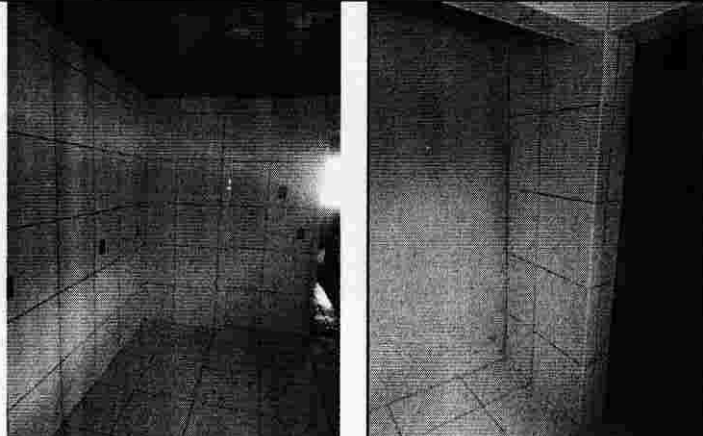
12.2	IMPERMEABILIZAÇÃO									
12.2.2	ADPT SEINFRA C4722	Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ARGAMASSA POLIMÉRICA, RESINA TERMOPLÁSTICA E TELA DE POLIÉSTER MALHA 2X2MM				TOTAL	141,15	m²	
PAREDE										
Local			COMP. (m)	ALT. (m)	DESCONTO (m)	REPETIÇÃO	MEDIDO			
WC MASTER			7,62	0,30	0,60	10,00	21,06		m²	
WC SOCIAL			7,80	0,30	0,60	10,00	24,06			
WC SERVIÇO			5,48	0,30	0,60		16,00			
LAVABO			5,90	0,30	0,60	10,00	0,90			
COZINHA			12,88	0,30	1,50		0,00			
LAVANDERIA			10,46	0,30	1,30		0,00			
DESPENSA			3,10	0,30	0,00		0,00			
WC MASC SALÃO DE FESTAS			5,61	0,30	0,60		0,00			
WC FEM SALÃO DE FESTAS			5,63	0,30	0,60		0,00			
HALL PIA SALÃO DE FESTAS			4,54	0,30	1,20		0,00			
COZINHA SALÃO DE FESTAS			9,76	0,30	1,40		0,00			
BANHEIRO ZELADOR			5,73	0,30	0,60		0,00			
CAIXA D'ÁGUA			17,54	4,80	0,00		0,00			
PISO										
Local					ÁREA	REPETIÇÃO	MEDIDO			m²
CONTRA PISO WC MASTER					3,22	10,00	32,16			
CONTRA PISO WC SOCIAL					3,41	10,00	34,06			
CONTRA PISO LAVABO					1,64	10,00	16,00			
CONTRA PISO WC SERVIÇO					1,92		0,37			
CONTRA PISO COZINHA					9,93		0,00			
CONTRA PISO LAVANDERIA					5,96		0,00			
CONTRA PISO DESPENSA					1,10		0,00			
CONTRA PISO WC MASC SF					1,83		0,00			
CONTRA PISO WC FEM SF					1,74		0,00			
CONTRA PISO HALL PIA SF					2,37		0,00			
CONTRA PISO COZINHA SF					5,86		0,00			
CONTRA PISO WC ZELADOR					2,02		0,00			
CAIXA D'ÁGUA					17,87		0,00			
TOTAL							141,15			
SALDO MEDIÇÃO ANTERIOR							548,39			
FOTOS/FIGURAS					OBSERVAÇÕES					
					SEM IMAGEM					
					MEDIDO POR METRO LINEAR APLICADO, CONFORME MEMORIA DE CÁLCULO ACIMA					

12.3	PROTEÇÃO MECÂNICA									
12.3.2	98564	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018					TOTAL	178,34	m²
PAREDE										
Local			COMP. (m)	ALT. (m)	DESCONTO (m)	REPETIÇÃO	MEDIDO			
WC MASTER			7,62	0,30	0,60	10,00	21,06		m²	
WC SOCIAL			7,80		0,60	10,00	21,60			
WC SERVIÇO			5,48	0,30	0,60	14,00	20,50			
LAVABO			5,90	0,30	0,60	10,00	15,90			
COZINHA			12,88	0,30	0,50	14,00	47,80			
LAVANDERIA			10,46	0,30	1,30	14,00	38,47			
DESPENSA			10,10	0,30	0,00	14,00	13,02			
WC MASC SALÃO DE FESTAS			5,61	0,30	0,60		0,00			
WC FEM SALÃO DE FESTAS			5,63	0,30	0,60		0,00			
HALL PIA SALÃO DE FESTAS			9,54	0,30	1,20		0,00			
COZINHA DO SALÃO DE FESTAS			9,76	0,30	1,40		0,00			
BANHEIRO ZELADOR			5,73	0,30	0,60		0,00			
CAIXA D'ÁGUA			17,54		0,00		0,00			
							TOTAL	178,34		
							SALDO MEDIÇÃO ANTERIOR	349,91		
FOTOS/FIGURAS			OBSERVAÇÕES							
			SEM IMAGEM		SEM IMAGEM		MEDIDO POR METRO LINEAR APLICADO, CONFORME MEMORIA DE CÁLCULO ACIMA			

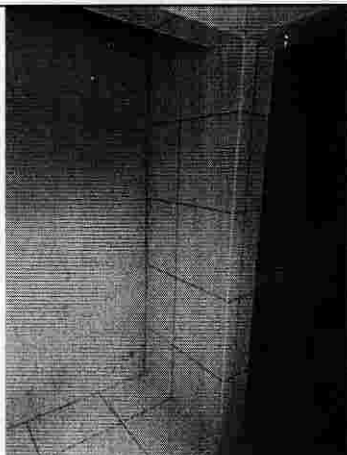
14	REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS									
14.3		REVESTIMENTO CERÂMICO								
14.3.1	ADPT 2 SINAPI (87273)	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES ATÉ 45X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014					TOTAL	576,04	m²
Local			Comp. (m)	Alt. (m)	DESCONTOS	Repetição	MEDIDO		m²	
WC MASTER			7,62	2,40	1,43	2,00	33,71			
WC SOCIAL			7,80	2,40	1,62	2,00	34,21			
WC SERVIÇO			5,48	2,40	1,41	8,00	93,00			
LAVABO			5,90	2,40	1,26	2,00	25,92			
COZINHA			8,78	2,40	5,76	8,00	1,00			
COZINHA 2			4,10	2,40	0,00	8,00	78,80			
LAVANDERIA			10,46	2,50	10,50	8,00	122,51			
DESPENSA			3,10	2,50	0,00	8,00	62,72			
WC MASC SALÃO DE FESTAS			3,96	2,40	1,26		05,18			
WC FEM SALÃO DE FESTAS			3,84	2,40	1,26		0 00			
HALL PIA SALÃO DE FESTAS			1,62	0,60	0,00		0 00			
COZINHA DO SALÃO DE FESTAS			8,18	2,40	3,36		0 00			
BANHEIRO ZELADOR			5,71	2,30	1,26		0 00			
TOTAL								576,04		
SALDO MEDIÇÃO ANTERIOR								3.645,21		
FOTOS/FIGURAS										OBSERVAÇÕES
										MEDIDO POR METRO LINEAR APLICADO, CONFORME MEMORIA DE CÁLCULO ACIMA

14.3.2	ADPT SINAPI (87273)	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES ATÉ 45X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 (REVESTIMENTO DE SHAFTS - ARGAMASSA COLA AC-III)				TOTAL	39,32	m²	
Local					Comp. (m)	Alt. (m)	Repetição	MEDIDO	m²	
WC MASTER					1,00	2,40	2,00	4,80		
WC SOCIAL					1,10	2,40	2,00	5,28		
WC SERVIÇO					1,15	2,50	8,00	23,00		
WC FEM SALÃO DE FESTAS					1,30	2,40	2,00	6,24		
							TOTAL	39,32		
							SALDO MEDIÇÃO ANTERIOR	234,82		
FOTOS/FIGURAS						OBSERVAÇÕES				
		SEM IMAGEM		SEM IMAGEM		MEDIDO POR METRO LINEAR APLICADO, CONFORME MEMORIA DE CÁLCULO ACIMA				
14.3.3	ADPT SEINFRA C0674	Próprio	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO P/ AZULEJOS				TOTAL	308,60	M	
Local					Comp. (m)	Alt. (m)	Quant. (und.)	Repetição	MEDIDO	M
JANELAS										
WC MASTER					0,40	0,90	2,00	2,00	5,20	
WC SOCIAL					0,50	1,10	2,00	2,00	6,40	
WC SERVIÇO					0,50	0,50	2,00	8,00	16,00	
COZINHA					0,40	1,75	2,00	8,00	34,40	
LAVANDERIA 01					1,10	80	1,00	8,00	31,20	
LAVANDERIA 02					0,50	2,50	2,00	8,00	16,00	
LAVANDERIA 03					1,00	0,60	2,00	8,00	25,60	
COZINHA DO SALÃO DE FESTAS					2,20	1,50	1,00	2,00	7,40	
BANHEIRO ZELADOR					0,50	0,50	2,00		0,00	
ABERTURAS										
Local					Comp. (m)	Alt. (m)	Quant. (und.)	Repetição	MEDIDO	M
COZINHA					1,15	2,15	1,00	8,00	26,40	
LAVANDERIA					1,15	2,15	2,00	8,00	52,80	
DESPENSA					1,15		1,00	8,00	9,20	



QUINAS					
Local	Comp. (m)	Alt. (m)	Quant. (und.)	Repetição	MEDIDO
WC MASTER		2,40	2,00	2,00	9,60
WC SOCIAL		2,40	1,00	2,00	4,80
LAVABO		2,40	1,00	2,00	4,80
COZINHA		2,45	2,00	8,00	39,20
LAVANDERIA		2,45	1,00	8,00	19,60
WC MASC SALÃO DE FESTAS		2,45	1,00		0,00
WC FEM SALÃO DE FESTAS		2,45			0,00
WC ZELADOR		2,40	1,00		0,00
TOTAL					308,60
SALDO MEDIÇÃO ANTERIOR					1.866,20
FOTOS/FIGURAS			OBSERVAÇÕES		
			SEM IMAGEM		
			MEDIDO POR METRO LINEAR APLICADO, CONFORME MEMORIA DE CÁLCULO ACIMA		



15	PISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS								
15.1	REVESTIMENTO CERÂMICO								
15.1.1	ADPT 2 SINAPI 87246	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES ATÉ 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014			TOTAL	8,80	m²	
Local				ÁREAS (m²)	Repetição	MEDIDO		m²	
DESPENSA HALL P/A SF				1,10	8,00	8,80			
				2,37		0,00			
						0,00			
						0,00			
						TOTAL	8,80		
						SALDO MEDIÇÃO ANTERIOR		149,03	
FOTOS/FIGURAS							OBSERVAÇÕES		
		SEM IMAGEM			MEDIDO POR METRO LINEAR APLICADO, CONFORME MEMORIA DE CÁLCULO ACIMA				

15.1.2		ADPT SINAPI 87247	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES ATÉ 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	ÁREAS (m²)		Repetição		MEDIDO	m²	
						9,93	10,00	99,32			m²
						5,96	10,00	59,60			
						5,86		0,00			
								0,00			
								0,00			
						TOTAL		158,93		399,87	
						SALDO MEDIÇÃO ANTERIOR					

