


**MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA**

TERMO DE ABERTURA DO VOLUME X

Aos quatorze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três, procedemos a abertura deste volume X, do Processo nº 64278.019366/2022-07, que se inicia com a folha nº 1.824 (mil, oitocentos e vinte e quatro) que, para constar, eu HERMANO DINIZ NEGILDO – Cap R1, Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos do Escritório Regional da Operação Carro Pipa, subscrevo e assino.


ER-Op-C Pipa/ 1º Gpt E

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA



TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS

Aos vinte e um dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três, faço a juntada dos documentos abaixo relacionados, referente ao Processo NUP **64278.019366/2022-07**, decorrente do processo licitatório Tomada de Preços nº 6/2022:

ORD	DOCUMENTOS	FL Nº
1	2ª medição da obra, de 10/08/2023	1826
2	Cadastro de inscrição e de situação cadastral	1835
3	Alvará de licença	1837
4	Certidão municipal	1839
5	Certidão negativa trabalhista	1840
6	Certidão estadual	1841
7	Certidão municipal	1842
8	Certidão negativa de falência/ recuperação judicial	1843
10	Certidão FGTS	1844
11	Nota Fiscal de serviço nº 287, de 10/08/2023.	1845



Adj ER C Pipa 1º Gpt E



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
(1º Grupamento de Engenharia/1955)
GRUPAMENTO GENERAL LYRA TAVARES



2ª MEDIÇÃO

Contratada Razão Social / CNPJ		Endereço completo - Dados de contato	
PLANENG ENGENHARIA LTDA. CNPJ 27.700.986/0001-69		Rua Jornalista Laurenio Firmeza, 82 - Centro, São José do Rio Peixe/PB	
Modalidade	Nº/Ano	NUP	
Tomada de Preços	6/2022	64278. 019366/2022-07	
Objeto		OM Beneficiária - Endereço - Localidade - UF	
Adequação da Subtenência para receber o Escritório Regional da Operação Carro Pipa no Cmdo 1ª Gpt E		Cmdo 1ª Gpt E - Av. Epitácio Pessoa, 2205 - Tambauzinho, João Pessoa/PB	
Contrato nº / Ano / Data	Execução (120 dias) Conforme Ordem de Serviço nº 1/2023	Vigência (225 dias)	
566/2023	25/05/2023 até 21/09/2023	10/05/2023 até 21/12/2023	
Aditivo nº / Ano / Data	Prazo / Valor	Aditivo nº / Ano / Data	Prazo / Valor
-	-	-	-

2. DADOS DO PAGAMENTO

a) VALOR CONTRATADO: R\$	R\$ 503.615,94		
VALOR EMPENHADO: R\$	R\$ 403.615,94		
b) NOTA DE EMPENHO:	2022NE843	DATA	09/05/2023
c) VALOR ADITIVO: R\$	-		
d) VALOR EMPENHADO: R\$	-		
e) NOTA DE EMPENHO ADITIVO:	-		
e) NOTA FISCAL Nº 287	DATA DA EMISSÃO:	10/08/2023	
f) VALOR: R\$	93.657,86		

3. DADOS BANCÁRIOS

BANCO: 001	AGÊNCIA: 3165-8	C/C No: 25990-x
VALOR DA ETAPA: R\$93.657,86	ACUMULADO: R\$128.726,64	SALDO CONTRATADO: R\$274.889,30



Aprovado - SOM/Cmdo 1º Gpt E

Chefe da Seção de Obras Militares do Comando do 1º Grupamento de Engenharia

Autorizo o pagamento:

10 de agosto de 2023.

Ordenador de Despesas do Escritório Op Carro Pipa do 1º GPT E



87X

MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO Comando da 7ª Região Militar	
1º Grupamento de Engenharia	
OBRA:	ADEQUAÇÃO DA SUBTENÊNCIA PARA RECEBER O ESCRITÓRIO REGIONAL DA OPERAÇÃO CARRO PIPA NO COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA.
LOCAL:	1º Grupamento de Engenharia, João Pessoa – PB
CONTRATO:	Contrato nº 566/2023
CONTRATANTE:	1º Grupamento de Engenharia
CONTRATADA:	PLANENG ENGENHARIA LTDA - ME
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	




Piso

Piso Porcelanato e Janelas Instaladas


PLANENG
ENGENHARIA

LTDA:27700986000169

Assinado de forma digital por
 PLANENG ENGENHARIA
 LTDA:27700986000169
 Dados: 2023.03.09 11:50:23 -03'00'

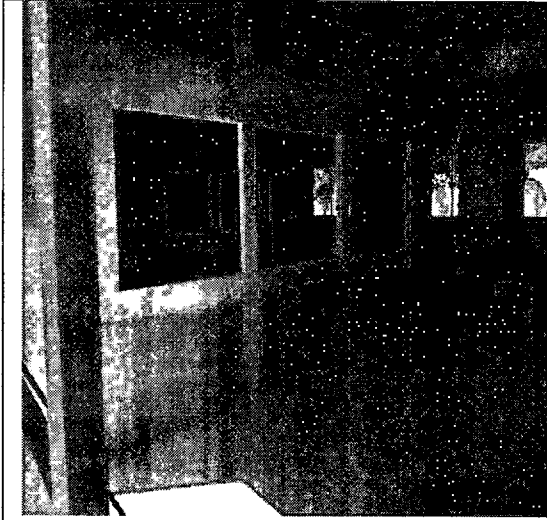

Parede Drywall

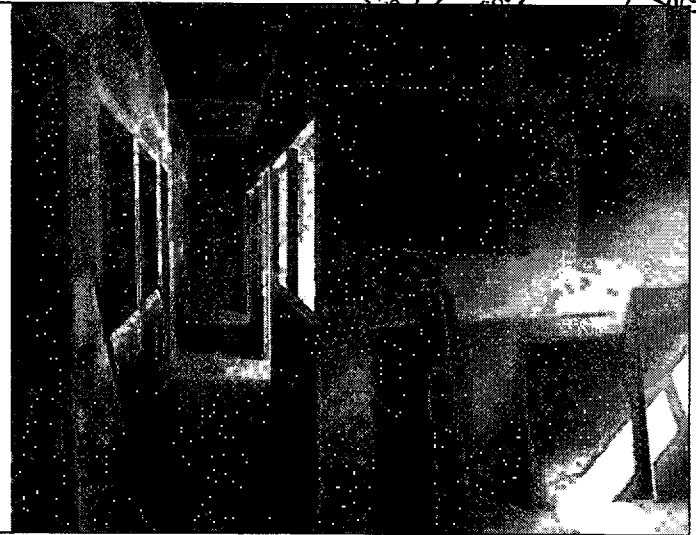

Parede Drywall

CNPJ: 27.700.986/0001-69

PLANENG ENGENHARIA
LTDA:27700986000169

Assinado de forma digital por PLANENG
ENGENHARIA LTDA:27700986000169
Dados: 2023.03.09 11:50:43 -03'00'



Item	Descrição	Und	Quant.	Memória de Cálculo
2.2	PESSOAL			
2.2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	COTA	20	proporcional a medição
4	SERVIÇOS PRELIMINARES			
4.1	DEMOLIÇÕES/ RETIRADAS			
4.1.2	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 12/2017	M	100	= estimado da rede existente
4.1.3	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 12/2017	m²	0,3	= 0,3 x 1,0 = 0,3m²
5	SERVIÇOS DIVERSOS			
5.1	CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE DE MATERIAIS			
5.1.1	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF. 07/2020	m³	10,87	alvenarias = 10,87
5.1.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMF ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF. 07/2020	M3XKM	100,44	10,87x9,24
9.2	ÁGUA FRIA			
9.2.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2021	UN	1	= conforme projeto
9.2.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2022	UN	7	= conforme projeto
9.2.8	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2022	UN	1	= conforme projeto
9.2.9	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2022	M	41,23	= conforme projeto
9.2.11	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2022	UN	3	= conforme projeto
9.2.23	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	= conforme projeto
9.2.24	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0	= conforme projeto
12	PAREDES E PAINÉIS			



1729



12.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	14,5	área final das janelas
12.3	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	M	40	área final das janelas
12.6	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF 06/2017 P	m ²	148,82	49,60x3 = 148,82 m ²
15	ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS			
15.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m ²	30,45	= 1,50 x 1,10 x 13 = 21,45 1,00 x 0,5 x 7 = 3,5 1,00 x 1,1 x 5 = 5,5
17	PISOS/SOLEIRAS/RODAPÉS			
17.4	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 14, esp. média = 2,5cm	m ²	395,94	área total do porcelanato vezes 2, correspondente ao piso com espessura de 5 cm
17.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 70X70 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M ² AF 08/2014	m ²	218	área retirada em projeto
17.6	RODAPÉ CERÂMICO DE 10CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO 70X70CM	M	170	área retirada em projeto



6.1	93307 SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2018	m²	6	6	740,19	192,70	748,30	941,00	1.156,20	4.489,80	5.846,00	0,00		
6.2	93210 SINAPI	EXECUÇÃO DE REFETÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2018	m²	6	6	421,52	116,83	418,04	535,67	718,98	2.498,24	3.215,22	0,00	R\$0,00	R\$0,00
6.3	74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6	6	409,86	48,60	472,45	521,05	291,80	2.834,70	3.126,30	0,00	R\$0,00	R\$0,00
7		MOVIMENTO DE TERRA										1.374,83	0,00		
7.1	93356 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	17,96	10,3	59,88	59,96	15,08	72,05	1.023,00	271,01	1.294,01	0,00	R\$0,00	R\$0,00
7.2	96995 SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_19/2017	m³	-1,65	-0,85	34,37	34,53	9,16	43,68	63,08	18,94	80,62	0,00	R\$0,00	R\$0,00
8		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS										11.658,80	0,00		
8.1		SAPATAS										1.267,96	0,00		
8.1.1	96819 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORTAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	2,16		21,86	10,13	17,40	27,53	22,69	57,93	60,01	0,00		
8.1.2	96541 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	m²	2,9		137,87	97,28	78,02	175,27	282,02	226,28	508,28	0,00	R\$0,00	R\$0,00
8.1.3	96566 SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	m²	0,52		522,55	197,79	466,52	664,31	102,85	242,59	345,44	0,00	R\$0,00	R\$0,00
8.1.4	96544 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM. AF_09/2017	KG	9,3		12,54	4,23	11,71	15,94	39,33	108,91	148,24	0,00	R\$0,00	R\$0,00
8.1.5	96545 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_09/2017	KG	6,5		11,67	3,08	11,75	14,53	20,02	78,37	98,39	0,00	R\$0,00	R\$0,00
8.1.6	96548 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_09/2017	KG	7,5		10,42	2,28	10,85	13,24	17,17	62,19	99,30	0,00	R\$0,00	R\$0,00
8.2		PILARES										2.104,79	0,00		
8.2.1	92283 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	9,6		113,79	32,38	112,28	144,66	310,84	1.077,89	1.388,73	0,00		
8.2.2	103689 SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	0,45		585,52	201,12	543,25	744,37	90,50	244,48	334,96	0,00	R\$0,00	R\$0,00
8.2.3	92762 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	KG	32,8		9,20	1,01	10,69	11,68	32,92	348,17	381,09	0,00	R\$0,00	R\$0,00
8.3		VIGAS										4.056,63	0,00		
8.3.1	92265 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	19,34		74,69	25,91	69,03	94,84	501,09	1.335,04	1.836,13	0,00	R\$0,00	R\$0,00
8.3.2	92761 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	KG	48,37		10,19	1,53	11,42	12,95	74,00	552,39	628,36	0,00	R\$0,00	R\$0,00
8.3.3	106982 SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERRELA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	2,1		597,11	213,09	548,01	759,10	447,48	1.148,63	1.594,11	0,00	R\$0,00	R\$0,00
8.4		LAJES										4.438,83	0,00		
8.4.1	101984 SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (6+3). AF_11/2020	m²	20,61		112,96	23,45	120,15	143,60	483,30	2.476,29	2.959,59	0,00		
8.4.2	103682 SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERRELA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	1,85		597,11	215,09	546,01	759,10	415,52	1.084,72	1.480,24	0,00	R\$0,00	R\$0,00
9		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS										21.026,89	0,00		
9.1		ESGOTO										4.711,48	0,00		
9.1.1	97906 SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA, RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60x0,60 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	3	3	294,16	169,56	204,41	373,96	598,85	818,23	1.121,88	0,00	R\$0,00	R\$0,00
9.1.2	98104 SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,20x0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,5 M. AF_12/2020	UN	1	1	241,16	148,05	160,53	306,58	148,05	160,53	306,58	0,00	R\$0,00	R\$0,00
9.1.3	104328 SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM ORELHA QUADRADA, PVC, DN 180 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4	4	46,50	14,22	47,43	61,65	56,88	189,72	245,98	0,00	R\$0,00	R\$0,00
9.1.4	86683 SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1,42 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	5	17,18	2,00	19,84	21,84	10,00	99,20	109,20	0,00	R\$0,00	R\$0,00

9.1.26	89739 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	1	16,51	5,55	16,43	20,96	5,55	16,43	20,96	0,00			
9.1.27	89795 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	1	28,31	7,40	28,59	35,99	7,40	28,59	35,99	0,00	R\$0,00	R\$0,00	
9.1.28	89546 SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_08/2022	UN	1	12,79	1,72	14,33	16,25	1,72	14,33	16,25	0,00	R\$0,00	R\$0,00	
9.1.29	104346 SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	UN	2	8,84	0,37	8,07	8,44	0,74	16,14	18,89	0,00	R\$0,00	R\$0,00	
9.1.30	104351 SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	UN	1	12,27	1,40	14,16	15,56	1,40	14,19	15,56	0,00	R\$0,00	R\$0,00	
9.1.31	89719 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	M	7,16	4,55	23,73	12,82	19,89	32,71	91,79	142,41	234,20	0,00	R\$0,00	R\$0,00
9.1.32	89784 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 90 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	6	16,91	6,17	16,32	21,49	37,02	91,82	128,84	0,00	R\$0,00	R\$0,00	
9.1.33	89788 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	1	28,55	7,40	26,11	33,51	7,40	26,11	33,51	0,00	R\$0,00	R\$0,00	
9.2		ÁGUA FRIA										18.316,63	0,00		
9.2.1	11150 ORSE	Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm	m²	5,43	438,38	33,77	523,54	557,31	163,37	2.842,82	3.026,19	0,00	R\$0,00	R\$0,00	
9.2.2	102615 SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2021	UN	2	942,29	8,31	1.189,81	1.107,02	16,82	2.378,22	2.985,84	0,00	R\$0,00	R\$0,00	
9.2.3	84792 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	4	86,53	8,71	101,29	110,00	34,84	405,16	440,00	110,00	R\$9,71	R\$101,29	
9.2.4	89446 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	M	0,28	4,37	0,83	4,92	5,58	0,17	1,38	1,55	0,00	R\$0,00	R\$0,00	
9.2.5	89553 SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	UN	2	4,13	1,75	3,50	5,25	3,50	7,00	10,50	0,00	R\$0,00	R\$0,00	
9.2.6	89408 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	UN	20	3,85	4,56	2,92	7,16	91,20	52,40	143,00	50,26	R\$31,82	R\$18,34	
9.2.7	89413 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	UN	6	8,09	5,44	4,84	10,28	32,64	29,04	91,88	0,00	R\$0,00	R\$0,00	
9.2.8	89378 SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	UN	2	4,62	3,40	2,47	5,87	6,80	4,94	11,74	5,87	R\$3,40	R\$2,47	
9.2.9	89356 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	M	77,49	41,23	15,05	12,77	7,51	20,28	899,03	581,65	1.570,65	836,14	R\$26,51	R\$209,84
9.2.10	89357 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	M	8,59	22,98	16,23	13,99	29,22	127,77	117,39	245,15	0,00	R\$0,00	R\$0,00	
9.2.11	89395 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	UN	10	8,59	6,81	4,11	10,82	68,10	41,10	109,20	32,76	R\$20,45	R\$12,39	
9.2.12	9502 ORSE	Ducha higiênica com registro, linha Link tel. 1984.C.ACF. LNK da DECA ou similar	un	5	168,07	8,86	228,90	238,55	48,25	1.134,50	1.182,75	0,00	R\$0,00	R\$0,00	
9.2.13	100858 SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	2	487,02	24,00	569,56	593,72	48,12	1.139,32	1.187,44	0,00	R\$0,00	R\$0,00	
9.2.14	89801 SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	4	98,13	20,12	104,83	124,75	60,48	416,52	469,00	0,00	R\$0,00	R\$0,00	
9.2.15	89890 SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 48 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	1	140,87	11,35	167,73	179,06	11,35	167,73	179,06	0,00	R\$0,00	R\$0,00	
9.2.16	89915 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	5	92,36	2,26	115,13	117,41	11,40	575,65	587,05	0,00	R\$0,00	R\$0,00	
9.2.17	89889 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	5	324,10	21,35	380,57	412,02	106,75	1.583,35	2.050,10	0,00	R\$0,00	R\$0,00	
9.2.18	84794 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	1	125,74	12,56	147,27	159,85	12,56	147,27	159,85	0,00	R\$0,00	R\$0,00	


10.4	ADAP Própria SETOP (ELE-CON195)	CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" COM DUAS (2) TOMADAS PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V) E PLACA DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE	UN	110	20,18	8,56	17,09	25,65	841,00	1.879,90	2.821,50	0,00			
10.5	ADAP Própria SETOP (ELE-CON196)	CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" COM DOIS (2) INTERRUPTORES PADRAO, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V) E PLACA DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE	UN	10	16,04	8,56	14,37	22,93	85,60	143,70	229,30	0,00	R\$0,00	R\$0,00	
10.6	ADAP Própria SETOP (ELE-CON197)	CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" COM TRES (3) INTERRUPTORES PADRAO, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V) E PLACA DE TRES (3) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE	UN	4	18,76	8,56	15,28	23,64	34,24	61,12	95,36	0,00	R\$0,00	R\$0,00	
10.7	ADAP Própria SETOP (ELE-CON198)	Cópia - CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" COM UM (1) INTERRUPTORES PADRAO, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE	UN	6	13,37	8,56	8,43	16,99	31,38	50,58	101,94	0,00	R\$0,00	R\$0,00	
10.8	ADAP Própria SETOP (ELE-CON199)	CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" COM UM (1) INTERRUPTOR E 1 (UMA) TOMADA PADRAO, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V) E PLACA DE UM (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE	UN	2	20,39	8,56	17,38	25,92	17,12	34,72	51,84	0,00	R\$0,00	R\$0,00	
10.9	ADAP Própria SETOP (ELE-CON200)	CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" COM UM (1) INTERRUPTOR PARALELO PADRAO, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V) E PLACA DE UM (1) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE	UN	4	16,48	8,56	12,38	20,95	34,24	48,56	83,80	0,00	R\$0,00	R\$0,00	
10.10	ADAP Própria SETOP (ELE-CON201)	CONJUNTO PARA CONDULETE DE 3/4" COM DOIS (2) INTERRUPTORES PARALELO PADRAO, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V) E PLACA DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE	UN	2	21,29	8,56	18,50	27,08	17,12	37,00	54,12	0,00	R\$0,00	R\$0,00	
10.11	12368 ORSE	Luminária de sobressol, (tecnologia ref.FLP-8478/2x20) Tubo de corpo refletor e abajur fabricadas em chapa de aço tratada e pintada em epoxi branco, para uso de 2 lampadas tubled de 20w	un	86	182,31	32,81	173,43	208,34	2.830,28	14.914,88	17.745,24	0,00	R\$0,00	R\$0,00	
10.12	9725 ORSE	QFAC II - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrolitica e pd poliester na cor bege; grau de protecao IP 54, com barramento, sem disjuntores - 1000x800x220mm	un	2	1.722,26	103,98	2.086,12	2.189,50	208,76	4.172,24	4.979,90	0,00	R\$0,00	R\$0,00	
10.13	93653 SINAB	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_10/2020	UN	7	7,82	4,18	8,75	9,94	8,33	61,25	69,58	0,00	R\$0,00	R\$0,00	
10.14	93661 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_10/2020	UN	8	39,48	5,25	46,94	50,19	28,00	375,52	401,82	0,00	R\$0,00	R\$0,00	
10.15	93650 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_10/2020	UN	14	9,01	2,25	9,20	11,45	31,50	128,80	160,30	0,00	R\$0,00	R\$0,00	
10.16	93673 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_10/2020	UN	2	65,08	19,40	63,34	82,74	38,80	126,68	165,48	0,00	R\$0,00	R\$0,00	
10.17	101894 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 80 ATE 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_10/2020	UN	1	105,82	28,75	107,52	134,27	28,75	107,52	134,27	0,00	R\$0,00	R\$0,00	
10.18	91872 SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM, (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015	M	11	11,02	6,02	8,53	15,15	6,92	8,53	15,15	0,00	R\$0,00	R\$0,00	
10.19	84168 SINAPI	BUCHA 7 ARRUELA ALUMINIO 1"	CJ	2	1,50	0,33	1,69	2,02	0,88	3,38	4,04	0,00	R\$0,00	R\$0,00	
10.20	91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015	M	2500	2,89	1,01	2,88	3,67	2.825,00	8.850,00	9.175,00	0,00	R\$0,00	R\$0,00	
10.21	91824 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015	M	1600	1,96	0,61	1,71	2,52	1.298,00	2.738,00	4.032,00	0,00	R\$0,00	R\$0,00	
10.22	91828 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015	M	1500	4,73	1,35	4,86	6,01	2.025,00	8.980,00	9.015,00	0,00	R\$0,00	R\$0,00	
10.23	92980 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,9/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015	M	12	7,03	0,29	6,79	10,08	3,48	117,48	120,96	0,00	R\$0,00	R\$0,00	
10.24	92982 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 18 MM², ANTI-CHAMA 0,9/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015	M	180	12,12	0,43	14,07	15,40	66,80	2.395,20	2.464,00	0,00	R\$0,00	R\$0,00	
10.25	7879 ORSE	Suporte vertical 100 x 50 mm para fixacao de eletroduto metalico (ref.: Mopa ou similar)	un	24	11,64	6,80	7,88	14,79	163,20	191,76	354,96	0,00	R\$0,00	R\$0,00	
10.26	762 ORSE	Fornecimento e instalacao de eletroduto perfurado 100 x 50 x 3000 mm (ref.: mopa ou similar)	m	35	33,55	13,61	28,04	42,85	478,35	1.018,40	1.492,75	0,00	R\$0,00	R\$0,00	
11		INSTALACOES ESPECIAIS										83.581,74	0,00	R\$83.581,74	
11.1		AR CONDICIONADO											82.214,48	0,00	R\$82.214,48

1833
Comando do Exército
BRASILIA

11.1.1	103247 SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2021_R	UN	7	1713,54	79,88	2.098,54	2.178,42	556,16	14.889,78	15.248,94	0,00			
11.1.2	13274 ORSE	Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), de 12000 btu/h até 18000 btu/h	un	9	278,42	79,88	271,53	351,41	718,82	2.243,77	3.162,96	0,00			
11.1.3	103250 SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2021_R	UN	2	2.486,85	96,37	3.075,16	3.161,53	172,74	-0.160,32	6.323,06	0,00			
11.1.4	103282 SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2021_P	UN	4	4.875,11	149,33	6.175,52	6.324,85	597,32	24.702,08	25.299,40	0,00			
11.1.5	13310 ORSE	Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), (piso-teto), de 36000 btu/h	un	4	426,19	149,33	395,02	544,35	597,32	1.580,08	2.177,40	0,00			
11.2		REDE DE LÓGICA									41.388,26	0,00			
11.2.1	91872 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	M	400	11,82	6,62	8,53	15,15	2.648,00	3.412,00	8.080,00	0,00			
11.2.2	95816 SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2018	UN	100	25,53	16,53	15,63	32,43	1.603,00	1.585,00	3.248,00	0,00			
11.2.3	91885 SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	40	6,84	6,21	2,48	8,89	248,40	99,20	347,60	0,00			
11.2.4	38.13.010 CPOS	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN=30 mm, com acessórios	M	150	8,98	1,35	7,52	8,87	202,50	1.128,00	1.330,50	0,00			
11.2.5	42791 ORSE	Fornecimento e instalação de Switch 24 portas Gerenciável POE 10/100/1000 ASFP	un	4	2.521,58	26,35	3.179,33	3.205,88	105,40	12.717,32	12.822,72	0,00			
11.2.6	8438 ORSE	Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 8u x 450mm	un	3	553,85	85,02	638,83	703,85	195,00	1.816,49	2.111,55	0,00			
11.2.7	12140 ORSE	Abracadura metálica tipo "D" de 1"	un	400	4,48	3,36	2,93	5,69	1.844,00	932,00	2.278,00	0,00			
11.2.8	ED-17983 SETOP	CONJUNTO PARA CONDULETE DE 1" (25MM) COM UMA (1) TOMADA DE DADOS OU TELEFONIA (CONECTOR RJ45 CAT.6E OU RJ11) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE	un	40	27,52	9,85	25,13	34,96	394,00	1.005,20	1.399,20	0,00			
11.2.9	ED-17985 SETOP	CONJUNTO PARA CONDULETE DE 1" (25MM) COM DUAS (2) TOMADA DE DADOS OU TELEFONIA (CONECTOR RJ45 CAT.6E OU RJ11) E PLACA DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE	un	25	41,59	11,59	41,28	52,87	289,75	1.032,00	1.321,75	0,00			
11.2.10	98285 SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2019	M	1300	2,97	0,09	2,92	3,01	117,00	3.798,00	3.913,00	0,00			
11.2.11	98301 SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2019	UN	4	464,34	211,93	378,38	590,31	847,72	1.513,52	2.361,24	0,00			
11.2.12	9534 ORSE	Fornecimento e instalação de patch cord cat 6e, conector RJ-45 macho, C/1,50m Rev 01	un	100	14,87	6,49	12,15	18,64	649,00	1.215,00	1.864,00	0,00			
11.2.13	C3753 SEINFRA	CABO DE FIBRA ÓPTICA, 04 PARES	M	270	8,78	2,72	5,89	8,81	734,40	1.580,30	2.324,70	0,00			
12		PAREDES E PAINÉIS									31.588,36	0,00			
12.1	103329 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL, DE 8X19X19 CM (ESPESSURA 3 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF_12/2021	m²	39,38	39,38	59,42	44,22	51,32	75,54	1.741,38	1.233,38	2.974,78	0,00		
12.2	93162 SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF_03/2018	M	40	25,6	14,5	32,40	8,38	32,84	41,19	334,00	1.313,80	1.847,50	597,26	
12.3	93194 SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 4,5 M DE COMPRIMENTO, AF_03/2018	M	40	31,79	8,21	32,19	40,37	328,40	1.286,40	1.614,80	1.614,80	0,00		
12.4	102253 SINAPI	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINÉ, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS, AF_01/2021	m²	10,38	321,21	49,11	358,24	408,35	509,78	3.728,91	4.238,97	0,00			
12.5	90437 SINAPI	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, AF_03/2015	UN	14	24,07	25,85	4,75	30,80	361,80	68,50	428,40	0,00			
12.6	96359 SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P	m²	214,49	148,82	76,85	11,83	84,58	96,42	2.537,41	18.145,71	20.681,12	14.349,22		
13		COBERTURA									6.628,60	0,00			
13.1	2324 ORSE	Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Fenox ou similar	m²	395,94	279,51	13,02	10,62	5,93	16,55	4.204,88	2.347,92	6.552,80	0,00		
13.2	1100330 SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO, AF_07/2019	m²	20	20	10,69	7,83	5,98	13,79	156,60	119,20	275,80	0,00		
14		IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÕES DIVERSAS									1.795,61	0,00			
14.1	98560 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM, AF_09/2018	m²	16,16	33,54	23,47	19,18	42,83	379,27	309,83	688,90	0,00			

COPIE

1831



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.700.986/0001-69 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/05/2017
NOME EMPRESARIAL PLANENG ENGENHARIA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PLANENG ENGENHARIA	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.91-6-00 - Obras de fundações		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R JORNALISTA LAURENIO FIRMEZA	NÚMERO 82	COMPLEMENTO *****
CEP 58.910-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO JOAO DO RIO DO PEIXE
UF PB		
ENDERECO ELETRÔNICO [REDACTED]	TELEFONE [REDACTED]	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/05/2017	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.


Emitido no dia 03/07/2023 às 15:26:22 (data e hora de Brasília).

 <p>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</p> <p>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</p>		 <p>Ministério da Defesa - Comando do Exército Fl. nº 1836 PÚBLICA Comando do Exército</p>	 <p>Ministério da Defesa - Exército Brasileiro Fl. nº 1836 PÚBLICA Comando do Exército</p>
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.700.986/0001-69 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 10/05/2017
NOME EMPRESARIAL PLANENG ENGENHARIA LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R JORNALISTA LAURENIO FIRMEZA	NÚMERO 82	COMPLEMENTO *****	
CEP 58.910-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO JOAO DO RIO DO PEIXE	UF PB
ENDERECO ELETRÔNICO [REDACTED]		TELEFONE [REDACTED]	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/05/2017	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	


Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 03/07/2023 às 15:26:22 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - PB
**ALVARÁ DE LICENÇA PARA
 LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**



Alvará **62/2023** Situação **Ativo** Liberado em **11/04/2023** Validade até **18/03/2024**

Na forma das disposições legais vigentes, a administração pública municipal em função do Poder de Polícia pelo controle e fiscalização da atividade econômica desenvolvida no município, fica concedida essa licença para a Unidade Econômica abaixo identificada para funcionar em âmbito municipal.

Nome / Nome empresarial **PLANENG ENGENHARIA LTDA - ME**

Título do estabelecimento (Nome de fantasia) **PLANENG ENGENHARIA**

Nome no cadastro Econômico municipal **PLANENG ENGENHARIA**

CPF/CNPJ **27.700.986/0001-69** Inscrição municipal **4266**

Endereço de funcionamento **Rua Jornalista Laurenio Firmeza, nº 82
 Centro - São João Do Rio Do Peixe/Paraíba - CEP 58910-000**

CNAE principal das informações empresariais **Construção de edifícios** Horário de Funcionamento **Regular**


Área utilizada ou instalação **32,68** Tipo para tributação do funcionamento **Área utilizada**

Atividade econômica municipal **4.45 - Construtoras, imobiliárias e escritórios de firmas jurídicas em geral** Classificação **Principal**

CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas)	Classificação
41.2.0-4.00 - Construção de edifícios	Principal
42.9.9-5.99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente	Secundária
42.9.2-8.01 - Montagem de estruturas metálicas	Secundária
42.1.2-0.00 - Construção de obras de arte especiais	Secundária
42.1.1-1.01 - Construção de rodovias e ferrovias	Secundária
81.2.9-0.00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente	Secundária
42.1.1-1.02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos	Secundária
77.3.2-2.02 - Aluguel de andaimes	Secundária
77.1.9-5.99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor	Secundária
43.2.9-1.04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos	Secundária
71.1.9-7.01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia	Secundária
42.9.1-0.00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais	Secundária
42.2.1-9.01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica	Secundária
43.9.9-1.05 - Perfuração e construção de poços de água	Secundária
43.1.3-4.00 - Obras de terraplenagem	Secundária



Autenticidade deste documento poderá ser confirmada na internet com QRcode ou no endereço:
<https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sjrp/#autenticidade>
 Tipo de documento: Alvará
 Código do documento: 1063991396



1830


42.22-7.01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação	Secundária
42.13-8.00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	Secundária
42.99-5.01 - Construção de instalações esportivas e recreativas	Secundária
77.32-2.01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	Secundária
71.12-0.00 - Serviços de engenharia	Secundária
43.91-6.00 - Obras de fundações	Secundária

Observação

Licença de Funcionamento - 2023

ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER AFIXADO EM LUGAR VISÍVEL EM CASO DE ATIVIDADE ESTABELECIDADA OU APRESENTADO QUANDO REQUERIDO E RENOVADO ANUALMENTE.

Este documento refere-se exclusivamente a entidade supracitada, afim de concessão de alvará, de situação e de regularização cadastral, e sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade e qualquer rasura ou emenda o invalidará.




Autenticidade deste documento poderá ser confirmada na internet com QRcode ou no endereço:
<https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sjrp/#autenticidade>
 Tipo de documento: Alvará
 Código do documento: 1063991396



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

CNPJ 08.924.029/0001-71

Rua José Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - CEP 58.910-000 - São João do Rio do Peixe - PB
(83) 9678-7922 cuvidoria@sjrp.pb.gov.br www.sjrp.pb.gov.br



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 6764/2023

Liberada: 03/07/2023

Validade: 01/09/2023

Processo: Não informado

Dados do contribuinte:

Nome: PLANENG ENGENHARIA LTDA - ME

CPF/CNPJ: 27.700.986/0001-69

Endereço: Rua Jornalista Laurenio Firmeza, nº 82 Centro - São João Do Rio Do Peixe - Paraíba - CEP 58910-000

Na forma dos dispositivos regulamentares vigentes, certificamos para que produza os jurídicos e legais efeitos, por NÃO constar lançamentos pendentes de baixa em nossos registros, de natureza tributária ou não tributária, inscritos ou não na Dívida ativa do município.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Municipal constituir novos créditos tributários provenientes de impostos, taxas, contribuições, tarifas, infrações, encargos e outras importâncias que venham a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos períodos abrangidos nesta certidão.

Este documento refere-se exclusivamente ao sujeito passivo supracitado, a fim de prova de situação e regularidade fiscal, e sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade e qualquer rasura ou emenda o invalidará.



A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na internet com QRcode ou no endereço:
<https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sjrp/#autenticidade>
Tipo de documento: Certidão
Código do documento: 1182674417



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PLANENG ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.700.986/0001-69
Certidão n°: 8854656/2023
Expedição: 01/03/2023, às 07:59:56
Validade: 28/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PLANENG ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **27.700.986/0001-69**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.


No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ



CERTIDÃO



CÓDIGO: 4349.E2A4.72E1.2781

Emitida no dia 20/07/2023 às 07:38:25

Identificação do requerente:

CNPJ/CPF: 27.700.986/0001-69

R.G. :

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o requerente supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, **com relação a débitos fiscais administrativos e inscritos em Dívida Ativa**. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado da Paraíba.

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida **por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página www.sefaz.pb.gov.br.

OBS: Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado no estado da Paraíba, ressalvada quando a licitação se referir à prestação de serviço de transporte entre municípios com características urbanas no âmbito das regiões metropolitanas no estado da Paraíba, reconhecida por Lei específica.


Válida com a apresentação conjunta do cartão de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
Certidão de Débito emitida via 'Internet'.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

CNPJ 08.924.029/0001-71

Rua José Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - CEP 58.910-000 - São João do Rio do Peixe - PB
(83) 9678-7922 ouvidoria@sjrp.pb.gov.br www.sjrp.pb.gov.br



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 6766/2023

Liberada: 03/07/2023

Validade: 01/09/2023

Processo: Não informado

Dados do econômico:

Inscrição municipal: 4266

Nome Econômico: PLANENG ENGENHARIA LTDA -ME

Atividade principal: 4.45 - Construtoras, imobiliárias e escritórios de firmas jurídicas em geral


Endereço: Rua Jornalista Laurenio Firmeza, nº 82

Centro - São João Do Rio Do Peixe - Paraíba - CEP 58910-000

Informação empresarial:

Nome Empresarial: PLANENG ENGENHARIA LTDA - ME

CPF/CNPJ: 27.700.986/0001-69



Na forma dos dispositivos regulamentares vigentes, certificamos para que produza os jurídicos e legais efeitos, por NÃO constar lançamentos pendentes de baixa em nossos registros, de natureza tributária ou não tributária, inscritos ou não na Dívida ativa do município.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Municipal de constituir novos créditos tributários provenientes de impostos, taxas, contribuições, tarifas, infrações, encargos e outras importâncias que venham a serem apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos períodos abrangidos nesta certidão.

Este documento refere-se exclusivamente ao sujeito passivo supracitado, afim de prova de situação e regularidade fiscal, e sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade e qualquer rasura ou emenda o invalidará.




Autenticidade deste documento poderá ser confirmada na internet com QRcode ou no endereço:


<https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sjrp/#autenticidade>

Tipo de documento: Certidão

Código do documento: 47767467



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)
Telefone: (83) 3216-1440



CERTIDÃO NEGATIVA FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 27.700.986/0001-69

Razão Social: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME

Nome Fantasia: PLANENG ENGENHARIA

Certidão emitida às 19:13 de 07/08/2023.

Validade 30 dias

-
1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
 2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
 3. Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais, exceto ANTECEDENTES CRIMINAIS.
 4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
 5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: PJE1G, SISCOMW.
-

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: **Nh+HB8FI**. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.700.986/0001-69
Razão Social: PLANENG ENGENHARIA LTDA ME
Endereço: RUA JORNALISTA LAURENIO FIRMEZA 82 / CENTRO / SAO JOAO DO RIO DO PEIXE / PB / 58910-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/07/2023 a 27/08/2023

Certificação Número: 2023072902040971664247

Informação obtida em 10/08/2023 07:55:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
