

G2 CONSTRUÇÃO
2016

CONTRATO Nº 25/2022 Processo n.º 64361.009625/2021-53	 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO COMANDO MILITAR DO NORDESTE BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO "Base Mestre-de-Campo Antônio Curado Vidal"	ASSUNTO CONTRATO G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA - EPP

SEÇÃO: DIVALC **ANO: 2022**

INTERESSADO: BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO							
ASSUNTO: Termo de Contrato – 7ª RM (DIVALC)							
FISCAL DE CONTRATO:							
MOVIMENTO DO PROCESSO							
DESTINO	DATA			DESTINO	DATA		
1-				13			
2				14			
3				15			
4				16			
5				17			
6				18			
7				19			
8				20			
9				21			
10				22			
11				23			
12				24			



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR
BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO
"Base Mestre-de-Campo Antônio Curado Vidal"**



**TERMO DE CONTRATO
(NUP 64361.009625/2021-53)**

TERMO DE CONTRATO DE OBRA DE ENGENHARIA Nº 25/2022 PARA ADEQUAÇÃO DO PAVILHÃO MULTIUSO DO COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR (7ª RM) DESTINADO A INSTALAÇÃO DA DIVISÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS (DIVALC), QUE FAZEM ENTRE SI A BASE ADM DO CURADO E A EMPRESA G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA

A União, por intermédio da Base Administrativa do Curado, Órgão integrante do Ministério da Defesa, CNPJ nº 31.543.958/0002-33, sediado na Av. Professor Luiz Freire, nº 198 Curado, Recife- PE, CEP: 50.740-437, neste ato representado por seu Ordenador de Despesas de Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial da Base Administrativa do Curado, o Senhor Coronel FELIPE GLASNER DE MAIA CHAGAS, inscrito no CPF N° portador da Carteira de Identidade nº ue teve a função de Ordenador de Despesas de Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial da Base Administrativa do Curado delegada através do Boletim Interno nº 145, de 02 de agosto de 2022 por determinação do Senhor Coronel FRANCISCO JOSÉ DE MOURA, nomeado pela portaria nº 608, de 21 de julho de 2021, publicada no DOU N° 137 de 22 de julho de 2021, inscrito no CPF nº portador da Carteira de Identidade nº n conformidade com as atribuições que lhe foram delegadas pela citada portaria, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA – EPP inscrito(a) no CNPJ/MF sob o N° 09.145.367/0001-78, sediado(a) na Rua Antônio Farias, 664, Bairro Piedade em Jaboatão dos Guararapes doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) CRISTIANNE DAYSE MACIEL SOARES, portador(a) da Carteira de Identidade nº 1883120, expedida em 11 de julho de 2016 pela (o) SSP-PE, e CPF nº 300.359.704-30, tendo em vista o que consta no Processo nº NUP: 64361.009625/2021-53 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente e do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da **Tomada de Preços nº 04/2021** (NUP: 64361.009625/2021-53), mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.



1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 O objeto do presente instrumento é a contratação do serviço de **Adequação do Pavilhão Multiuso do Comando da 7ª Região Militar (7ª RM) destinado à instalação da Divisão de Aquisição, Licitações e Contratos (DIVALC)**, que será prestado nas condições estabelecidas no Projeto Básico e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Instrumento Convocatório do certame que deu origem a este instrumento contratual.

1.2 Este Termo de Contrato vincula-se ao Instrumento Convocatório da **Tomada de Preços nº 04/2021** (NUP 64361.009625/2021-53) e seus anexos, identificado no preâmbulo acima, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1 O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Instrumento Convocatório, com início na data de assinatura, contemplando o período de **01/09/2022** e encerramento em **25/08/2023**

2.1.1 A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU nº 39, de 13/12/2011.

2.2 O prazo de execução do objeto é de **150 (cento e cinquenta) dias** e será iniciada a partir da emissão da Ordem de Serviço, contemplando o período de **01/09/2022** e encerramento em **27/01/2023**, cujas etapas observarão o cronograma fixado no Projeto Básico.

2.3 O prazo de vigência da contratação é de 360 (trezentos e sessenta) dias, a contar da assinatura do Termo de Contrato.

2.4 A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da correspondente adequação do cronograma físico-financeiro, bem como de justificativa e autorização da autoridade competente para a celebração do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

3.1 O valor total da contratação é de R\$ 435.315,82 (quatrocentos e trinta e cinco mil trezentos e quinze reais e oitenta e dois centavos).

3.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3.3 O valor acima citado é o valor homologado da proposta de preços adjudicada, todavia mediante a medição aferida no cronograma físico-financeiro, serão efetuados os pagamentos devidos à CONTRATADA, conforme os quantitativos de serviços efetivamente prestados.

X

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2021, na classificação abaixo:

- 45.1.1 Gestão/Unidade: 00001 / 160225
- 4.1.2 Programa de Trabalho (PTRES): 171460
- 4.1.3 Fonte: 0100000000
- 4.1.2 Plano Interno: I3FPPREDEGE
- 4.1.3 Natureza de Despesa: 3.3.90.39 e 4.4.90.52

4.2 Nota de Empenho emitida em 26 de agosto de 2022, (2022NE1755).

5. CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1 O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Projeto Básico.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO

6.1 As regras acerca do reajustamento de preços em sentido amplo do valor contratual (reajuste em sentido estrito e/ou repactuação) são as estabelecidas no Projeto Básico, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1 Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do Projeto Básico (item 19), anexo do Edital.

8. CLÁUSULA OITAVA – MODELO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

8.1 O modelo de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Projeto Básico, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1 As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Projeto Básico, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO

10.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1 As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Projeto Básico, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

12.1 O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

12.1.1 nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Projeto Básico, anexo do Instrumento Convocatório;

12.1.2 amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4 O termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar:

12.4.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos em relação ao cronograma físico-financeiro, atualizado;

12.4.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3 Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS VEDAÇÕES E PERMISSÕES

13.1 É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13.2 É permitido à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020.

13.2.1 A cessão de crédito, a ser feita mediante celebração de termo aditivo, dependerá de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da cessionária, bem como da certificação de que a cessionária não se encontra impedida de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

13.2.2 A crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratada) pela execução do objeto contratual, com o desconto de eventuais multas, glosas e prejuízos causados à Administração, sem prejuízo da utilização de institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto previstos na IN SEGES/ME nº 5, de 2017, caso aplicáveis.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E DAS ALTERAÇÕES



14.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, bem como do ANEXO X da IN SEGES/MP nº 05, de 2017, no que couber.

14.1.1 A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

14.1.2 As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder os limites estabelecidos no subitem anterior.

14.2 A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária.

14.3 Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos serviços, o preço desses serviços será calculado considerando o custo de referência e a taxa de BDI de referência especificada no orçamento-base da licitação, subtraindo desse preço de referência a diferença percentual entre o valor do orçamento-base e o valor global do contrato obtido na licitação, com vistas a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e aos arts. 14 e 15 do Decreto n. 7.983/2013.

14.4 Para o objeto ou parte do objeto contratual sujeita ao regime de empreitada por preço unitário, a diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência poderá ser reduzida para a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato em casos excepcionais e justificados, desde que os custos unitários dos aditivos contratuais não excedam os custos unitários do sistema de referência utilizado na forma do Decreto nº 7.983/2013, assegurada a manutenção da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada na licitação.

14.5 O serviço adicionado ao contrato ou que sofra alteração em seu quantitativo ou preço deverá apresentar preço unitário inferior ao preço de referência da administração pública divulgado por ocasião da licitação, mantida a proporcionalidade entre o preço global contratado e o preço de referência, ressalvada a exceção prevista no subitem anterior e respeitados os limites do previstos no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS

15.1 Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1 Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.



17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

17.1 O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Seção Judiciária de Pernambuco - Justiça Federal,.


Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contratantes.

Recife-PE, 01 de setembro de 2022.



FELIPE GLASNER DE MAIA CHAGAS – Cel
CPI

Ordenador de Despesas de Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial da Base Administrativa do Curado




CRISTIANNE DAYSE MACIEL SOARES
CPF Nº

Representante da Empresa G2 Construção e Manutenção Industrial LTDA

TESTEMUNHAS:



NOME: RAFAEL CAPISTRANO DE QUEIROZ COSTA
CPF:



NOME: DOUGLAS DA SILVA XAVIER
CPF: :

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 13/09/2022 | Edição: 174 | Seção: 3 | Página: 24

Órgão: Ministério da Defesa/Comando do Exército/Comando Militar do Nordeste/7ª Região Militar/Base Administrativa do Curado

EXTRATO DE CONTRATO Nº 25/2022 - UASG 160225

Nº Processo: 64361.009625/2021-53.

Tomada de Preços Nº 4/2021. Contratante: BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO.

Contratado: 09.145.367/0001-78 - G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA.
Objeto: O objeto do presente instrumento é a contratação do serviço de adequação do pavilhão multiuso do comando da 7ª região militar. Destinado à instalação da divisão de aquisição, licitações e contratos (divalc).

Fundamento Legal: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 23 - Inciso: I. Vigência: 01/09/2022 a 25/08/2023. Valor Total: R\$ 435.315,82. Data de Assinatura: 01/09/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 12/09/2022).

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.



BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 25/2022 - UASG 160225

Nº Processo: 64361.009625/2021-53.
Tomada de Preços Nº 4/2021. Contratante: BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO. Contrato: 09.145.367/0001.78 - G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA. Objeto: O objeto do presente instrumento é a contratação do serviço de adequação do pavilhão multiuso do comando da 7ª região militar. Destinado à instalação da divisão de aquisição, licitações e contratos (divic). Fundamento Legal: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 23 - Inciso: I. Vigência: 01/09/2022 a 25/08/2023. Valor Total: R\$ 435.315,82. Data de Assinatura: 01/09/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 24/10/2022).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2022 - UASG 160225

Número do Contrato: 20004/2022.
Nº Processo: 64304.001635/2022-14.
Pregão. Nº 3/2021. Contratante: BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO. Contrato: 07.857.759/0001-34 - R T COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE DE. Objeto: O presente termo tem por objeto prorrogar por 60 (sessenta) dias o prazo de vigência do contrato nº 04/2022. Vigência: 10/10/2022 a 08/12/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 77.236,58. Data de Assinatura: 07/10/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 07/10/2022).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2022 - UASG 160225

Número do Contrato: 10/2018.
Nº Processo: 64193.003901/2018-53.
Inexigibilidade Nº 2/2018. Contratante: BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO. Contrato: 09.095.183/0001-40 - ENERGIS PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Objeto: O presente termo tem por objeto prorrogar por 12 (doze) meses o prazo de vigência do contrato nº 10/2018. Vigência: 04/10/2022 a 03/10/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 20.639,88. Data de Assinatura: 14/09/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 14/09/2022).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2022 - UASG 160225

Número do Contrato: 20002/2022.
Nº Processo: 64304.001633/2022-17.
Pregão. Nº 3/2021. Contratante: BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO. Contrato: 07.998.307/0001-72 - EDS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP. Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar por 60 (sessenta) dias o prazo de vigência do contrato nº 02/2022. Vigência: 09/10/2022 a 07/12/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 107.919,45. Data de Assinatura: 07/10/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 07/10/2022).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2022 - UASG 160225

Número do Contrato: 20003/2022.
Nº Processo: 64304.001634/2022-61.
Pregão. Nº 3/2021. Contratante: BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO. Contrato: 07.857.759/0001-34 - R T COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E TRANSPORTE DE. Objeto: O presente termo tem por objeto prorrogar por 60 (sessenta) dias o prazo de vigência do contrato nº 03/2022. Vigência: 10/10/2022 a 08/12/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 170.059,83. Data de Assinatura: 07/10/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 07/10/2022).

10ª REGIÃO MILITAR

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2022 - UASG 160047. NÚMERO DO CONTRATO: 46/2020

Nº Processo: 64305.020499/2020-81. Inexigibilidade. Nº 11/2020. Contratante: COMANDO 10ª REGIÃO MILITAR. Contrato: 69.629.756/0001-09 - S L AGUIAR DE OLIVEIRA. Objeto: Prorrogação de vigência por mais 12 (doze) meses e o reajuste contratual do termo de contrato nº 046/2020 - Cmdo 109RM. Vigência: 05/11/2022 a 05/11/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 301.917,57. Data de Assinatura: 01/11/2022.

BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE FORTALEZA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2022 - UASG 160045

Número do Contrato: 17/2021.
Nº Processo: 64242.000189/2021-15.
Pregão. Nº 4/2021. Contratante: BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE FORTALEZA. Contrato: 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.. Objeto: Prorrogação do prazo da vigência do contrato nr 17/2021 por 12 (doze) meses.. Vigência: 01/11/2022 a 31/10/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 3.360,00. Data de Assinatura: 24/10/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 24/10/2022).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2022 - UASG 160045

Número do Contrato: 20/2021.
Nº Processo: 64242.000189/2021-15.
Pregão. Nº 4/2021. Contratante: BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE FORTALEZA. Contrato: 07.870.094/0001-07 - MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo da vigência do contrato nr 20/2021 por 12 (doze) meses.. Vigência: 01/11/2022 a 31/10/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 2.880,00. Data de Assinatura: 24/10/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 24/10/2022).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2022 - UASG 160045

Número do Contrato: 16/2021.
Nº Processo: 64242.000189/2021-15.
Pregão. Nº 4/2021. Contratante: BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE FORTALEZA. Contrato: 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.. Objeto: Prorrogação do prazo da vigência do contrato nr 16/2021 por 12 (doze) meses.. Vigência: 01/11/2022 a 31/10/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 3.480,00. Data de Assinatura: 24/10/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 24/10/2022).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2022 - UASG 160045

Número do Contrato: 19/2021.
Nº Processo: 64242.000189/2021-15.
Pregão. Nº 4/2021. Contratante: BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE FORTALEZA. Contrato: 07.870.094/0001-07 - MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo da vigência do contrato nr 19/2021 por 12 (doze) meses.. Vigência: 01/11/2022 a 31/10/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 2.880,00. Data de Assinatura: 24/10/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 24/10/2022).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2022 - UASG 160045

Número do Contrato: 21/2021.
Nº Processo: 64242.000189/2021-15.
Pregão. Nº 4/2021. Contratante: BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE FORTALEZA. Contrato: 07.870.094/0001-07 - MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo da vigência do contrato nr 21/2021 por 12 (doze) meses.. Vigência: 01/11/2022 a 31/10/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 9.780,00. Data de Assinatura: 24/10/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 24/10/2022).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2022 - UASG 160045

Número do Contrato: 23/2021.
Nº Processo: 64242.000189/2021-15.
Pregão. Nº 4/2021. Contratante: BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE FORTALEZA. Contrato: 07.870.094/0001-07 - MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo da vigência do contrato nr 23/2021 por 12 (doze) meses.. Vigência: 01/11/2022 a 31/10/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 2.880,00. Data de Assinatura: 24/10/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 24/10/2022).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2022 - UASG 160045

Número do Contrato: 15/2021.
Nº Processo: 64242.000189/2021-15.
Pregão. Nº 4/2021. Contratante: BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE FORTALEZA. Contrato: 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.. Objeto: Prorrogação do prazo da vigência do contrato nr 15/2021 por 12 (doze) meses.. Vigência: 01/11/2022 a 31/10/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 3.480,00. Data de Assinatura: 24/10/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 24/10/2022).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2022 - UASG 160045

Número do Contrato: 13/2021.
Nº Processo: 64242.000189/2021-15.
Pregão. Nº 4/2021. Contratante: BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE FORTALEZA. Contrato: 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.. Objeto: Prorrogação do prazo da vigência do contrato nr 13/2021 por 12 (doze) meses.. Vigência: 01/11/2022 a 31/10/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 7.188,00. Data de Assinatura: 24/10/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 24/10/2022).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2022 - UASG 160045

Número do Contrato: 14/2021.
Nº Processo: 64242.000189/2021-15.
Pregão. Nº 4/2021. Contratante: BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE FORTALEZA. Contrato: 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.. Objeto: Prorrogação do prazo da vigência do contrato nr 14/2021 por 12 (doze) meses.. Vigência: 01/11/2022 a 31/10/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 4.800,00. Data de Assinatura: 24/10/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 24/10/2022).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2022 - UASG 160045

Número do Contrato: 22/2021.
Nº Processo: 64242.000189/2021-15.
Pregão. Nº 4/2021. Contratante: BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE FORTALEZA. Contrato: 07.870.094/0001-07 - MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo da vigência do contrato nr 22/2021 por 12 (doze) meses.. Vigência: 01/11/2022 a 31/10/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 2.880,00. Data de Assinatura: 24/10/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 24/10/2022).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2022 - UASG 160045

Número do Contrato: 12/2021.
Nº Processo: 64242.000189/2021-15.
Pregão. Nº 4/2021. Contratante: BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE FORTALEZA. Contrato: 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.. Objeto: Prorrogação do prazo da vigência do contrato nr 12/2021 por 12 (doze) meses.. Vigência: 01/11/2022 a 31/10/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 7.800,00. Data de Assinatura: 24/10/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 24/10/2022).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2022 - UASG 160045

Número do Contrato: 18/2021.
Nº Processo: 64242.000189/2021-15.
Pregão. Nº 4/2021. Contratante: BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE FORTALEZA. Contrato: 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.. Objeto: Prorrogação do prazo da vigência do contrato nr 18/2021 por 12 (doze) meses.. Vigência: 01/11/2022 a 31/10/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 3.480,00. Data de Assinatura: 24/10/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 24/10/2022).

HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2022 - UASG 160050

Nº Processo: 64579008475202204. Objeto: Aquisição de Material Farmacológico de Alto Custo, Quimioterápicos e Frasco para Dieta Enteral, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.. Total de Itens Licitados: 58. Edital: 03/11/2022 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 15h30. Endereço: Av. Desembargador Moreira, 1500 - Aldeota, Aldeota - Fortaleza/CE ou <https://www.gov.br/compras/edital/160050-5-00016-2022>. Entrega das Propostas: a partir de 03/11/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 16/11/2022 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Total de geral de itens: 58 (cinquenta e oito). O edital encontra-se disponível através do site <https://www.gov.br/compras/pt-br>.

PEDRO LEOPOLDO ROUQUAYROL
Ordenador de Despesas do Hospital Geral de Fortaleza

(SIA/Gnet - 01/11/2022) 160050-00001-2022NE000001



TR 04 / Jod1

2026-9



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00000057
Data e Hora de Emissão
14/12/2022 14:45:51
Código de Verificação
JBCE-TXUK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.145.367/0001-78** Inscrição Municipal: **751.120-5**
Nome/Razão Social: **G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA**
Endereço: **RUA VISCONDE DE JEQUITINHONHA 3732, LOJA 0002 LOJA 0002 - BOA VIAGEM - CEP: 51130-020**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **g2servi@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO**
CPF/CNPJ: **31.543.958/0001-52** Inscrição Municipal: **743.691-2**
Endereço: **AV PROF LUIZ FREIRE 198 - CURADO - CEP: 60740-437**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO PAVILHÃO MULTIUSO DO COMANDO DA 7ª REGIÃO (7ª RM) DESTINADO A INSTALAÇÃO DA DIVISÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS (DIVALC).REFERENTE AO EMPENHO DE NO.2022NE002016 -- 2º MEDIÇÃO

----VALOR DE RETENÇÃO PARA INSS: R\$ 639,75
BASE DE CALCULO INSS : 50 % MÃO DE OBRA + 50% MATERIAIS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 11.631,87

Código da Atividade Prestada
4321500 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanag...

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	11.631,87	5,00%	581,59	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de NFS-e.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- CEI / Código da Obra: C07REGDIVALC

SERVIÇO PRESTADO

EM 15/02/22

No Município de

Recife

POSTO/GRAD:

3º SGT

ASSINATURA:

Jaqueline Czui

Responsável pela Fiscalização do Serviço

BASE ADM CURADO

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

AUTORIZO O PAGAMENTO

NÃO AUTORIZO O PAGAMENTO

EM, 20/10/22

Felipe Glasner de Mata Chagas - CA
Ordenador de Despesas

DECLARAÇÃO

Declaro que os serviços constantes deste título de crédito foram prestados.

Assinatura:

**Wellington Edwin Corrêa- TC Fiscal
Administrativo- Base ADM Curado**

CPF:

RG:

NS: 10781

OB: 805475



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
C M NE - 7ª RM / 7ª DE
BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO

PAGAMENTO DE FATURA

Para efeito de pagamento, informo-vos o seguinte:

1. DADOS DA OBRA

a) PLANO: 2022 OBRA: DIVALC OM Base Adm Curado

b) DISCRIMINAÇÃO: Serviços De Adequação Do Pavilhão Multiuso Do Comando Da 7ª Região Militar – Divisão De Aquisições, Licitações E Contratos (Divalc)

Contrato: nº 04/2021.

2. DADOS DO PAGAMENTO

a) FIRMA INTERESSADA: G2 Construção e Manutenção Industrial LTDA

b) VALOR CONTRATADO: R\$ 435.315,82 – Contrato 04/2021 - 2ª Medição

c) EMPENHO Nº 2022NE2016 DATA 14/12/2022

d) VALOR EMPENHADO: R\$ 435.315,82

e) NOTA FISCAL No 00000057 DATA DA EMISSÃO: 14/12/2022

f) VALOR: R\$ 11.634,87 (onze mil, seiscentos e trinta e quatro reais e oitenta e sete centavos).

3. DADOS BANCÁRIOS

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 1245-9 C/C.: 44116-3

VALOR DA ETAPA:
R\$ 11.631,87

ACUMULADO:
R\$ 37.559,89

SALDO:
R\$ 397.755,93

15 de dezembro de 2022

Jaqueline dos Santos Cezario
JAQUELINE DOS SANTOS CEZARIO – 3º SGT STT
Fiscal Técnico do contrato da Base Administrativa do Curado

16 de dezembro de 2022

Wellington Edwin Corrêa
WELLINGTON EDWIN CORRÊA – TC
Chefe da Fiscalização Administrativa da Base Administrativa do curado

Autorizo o pagamento:

de _____ de 2022

Felipe Glasner de Maia Chagas
FELIPE GLASNER DE MAIA CHAGAS – CEL
Ordenador de Despesas e Comandante da Base Administrativa do Curado



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 31.543.958/0001-52	Razão Social BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO		
Período de Apuração Dezembro/2022	Data de Vencimento 20/01/2023	Número do Documento 07.16.22363.1403302-0	Pagar este documento até 20/01/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000102841643			Valor Total do Documento 14.054,26

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	148,14			148,14
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
	CNPJ Prestador:07.857.759/0001-34				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.364,95			3.364,95
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
	CNPJ Prestador:07.998.307/0001-72				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	8.043,58			8.043,58
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
	CNPJ Prestador:09.145.367/0001-78				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	484,55			484,55
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
	CNPJ Prestador:11.897.590/0001-13				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	7,34			7,34
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
	CNPJ Prestador:19.299.794/0001-64				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.005,70			2.005,70
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
	CNPJ Prestador:40.900.106/0001-66				
	Totais	14.054,26			14.054,26

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

29/12/2022 12:59:15

85880000140 3 54260385230 8 20071622363 8 14033020729 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000140 3 54260385230 8 20071622363 8 14033020729 1



CNPJ: 31.543.958/0001-52
 Número: 07.16.22363.1403302-0
 Pagar até: 20/01/2023
 Valor: 14.054,26

Pague com o PIX





PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota

00000067

Data e Hora de Emissão

02/02/2023 16:04:47

Código de Verificação

PYGL-Y9JS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.145.367/0001-78**

Inscrição Municipal: **751.120-5**

Nome/Razão Social: **G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA**

Endereço: **RUA VISCONDE DE JEQUITINHONHA 3732, LOJA 0002 LOJA 0002 - BOA VIAGEM - CEP: 51130-020**

Município: **Recife**

UF: **PE**

E-mail: **g2servi@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO**

CPF/CNPJ: **31.543.958/0001-52**

Inscrição Municipal: **743.691-2**

Endereço: **AV PROF LUIZ FREIRE 198 - CURADO - CEP: 50740-437**

Município: **Recife**

UF: **PE**

E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADEQUACAO DO PAVILHAO MULTIUSO DO COMANDO DA 7ª REGIAO (7ª RM) DESTINADO A INSTALACAO DA DIVISAO DE AQUISICOES, LICITACOES E CONTRATOS (DIVALC). EMPENHO 2022NE002016

-----VALOR DE RETENÇÃO PARA INSS R\$ 970,68-----
BASE DE CÁLCULO INSS : 50 % MÃO DE OBRA+ 50% MATERIAIS

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 17.648,89

Código da Atividade Prestada

4321500 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanag...

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	17.648,89	5,00%	882,44	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- **O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de NFS-e.**
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- CEI / Código da Obra: C07REGDIVALC

SERVIÇO PRESTADO

EM : 10 / 02 / 2023

No Município de : **RECIFE / PE**

POSTO/GRAD: **3º SGT**

NOME DE GUERRA: **JACQUELINE**

ASSINATURA: Jaqueline Bezerra
Responsável pela Fiscalização do
Serviço

BASE ADM CURADO	
DESPACHO DE EMPLACAMENTO	
<input checked="" type="checkbox"/>	AUTORIZO O PAGAMENTO
<input type="checkbox"/>	NÃO AUTORIZO O PAGAMENTO
<input type="checkbox"/>	
EM: <u>10</u> / <u>02</u> / <u>2023</u>	

Felipe Glauber de Moraes Chagas - Cel
Ordenador de Despesas

DECLARAÇÃO

Declaro que os serviços constantes deste titulo de credito foram prestados.

Assinatura: _____

Wellington **Edwin** Corrêa- TC
Fiscal Administrativo- Base ADM Curado
CPF:
RG:

0 B: 800 29.5 - 13/02/23



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
C M NE - 7ª RM / 7ª DE
BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO

PAGAMENTO DE FATURA

Para efeito de pagamento, informo-vos o seguinte:

1. DADOS DA OBRA

a) PLANO: 2022 OBRA: DIVALC OM Base Adm Curado

b) DISCRIMINAÇÃO: Serviços De Adequação Do Pavilhão Multiuso Do Comando Da 7ª Região Militar –
Divisão De Aquisições, Licitações E Contratos (Divalc)

Contrato: nº 04/2021.

2. DADOS DO PAGAMENTO

a) FIRMA INTERESSADA: **G2 Construção e Manutenção Industrial LTDA**

b) VALOR CONTRATADO: R\$ 435.315,82 – Contrato 04/2021 - 3ª Medição

c) EMPENHO Nº 2022NE2016 DATA 14/12/2022

d) VALOR EMPENHADO: R\$ 435.315,82

e) NOTA FISCAL No **00000067** DATA DA EMISSÃO: **02/02/2023**

f) VALOR: R\$ **17.648,89** (dezesete mil, seiscentos e quarenta e oito reais e oitenta e nove centavos).

3. DADOS BANCÁRIOS

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 1245-9 C/C.: 44116-3

VALOR DA ETAPA:	ACUMULADO:	SALDO:
R\$ 17.648,89	R\$ 55.208,78	R\$ 380.107,04

10 de FEVEREIRO de 2023
Jaqueline dos Santos Cezario
JAQUELINE DOS SANTOS CEZARIO – 3º SGT STT
Fiscal Técnico do contrato da Base Administrativa do Curado

10 de FEV de 2023
Wellington Edwin Corrêa
WELLINGTON EDWIN CORRÊA – TC
Chefe da Fiscalização Administrativa da Base Administrativa do curado

Autorizo o pagamento:

10 de FEVEREIRO de 2023
Felipe Glasner de Maia Chagas
FELIPE GLASNER DE MAIA CHAGAS – CEL
Ordenador de Despesas e Comandante da Base Administrativa do Curado



PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota

0000067

Data e Hora de Emissão

02/02/2023 16:04:47

Código de Verificação

PYGL-Y9JS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.145.367/0001-78**

Inscrição Municipal: **751.120-6**

Nome/Razão Social: **G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA**

Endereço: **RUA VISCONDE DE JEQUITINHONHA 3732, LOJA 0002 LOJA 0002 - BOA VIAGEM - CEP: 51130-020**

Município: **Recife**

UF: **PE**

E-mail: **g2servi@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO**

CPF/CNPJ: **31.643.958/0001-62**

Inscrição Municipal: **743.691-2**

Endereço: **AV PROF LUIZ FREIRE 198 - CURADO - CEP: 50740-437**

Município: **Recife**

UF: **PE**

E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADEQUACAO DO PAVILHAO MULTIUSO DO COMANDO DA 7ª REGIAO (7ª RM) DESTINADO A INSTALACAO DA DIVISAO DE AQUISICOES, LICITACOES E CONTRATOS (DIVALC). EMPENHO 2022NE002016

-----VALOR DE RETENÇÃO PARA INSS R\$ 970,68-----

BASE DE CÁLCULO INSS : 50 % MÃO DE OBRA+ 50% MATERIAIS

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 17.648,89

Código da Atividade Prestada

4321500 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanag...

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	17.648,89	5,00%	882,44	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de NFS-e.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- CEI / Código da Obra: CO7REGDIVALC

SERVIÇO PRESTADO

EM : 10 / 02 / 2023

No Município de : **RECIFE / PE**

POSTO/GRAD: **3º SGT**

NOME DE GUERRA: **JAQUELINE**

ASSINATURA: Jaqueline Lezano
Responsável pela Fiscalização do
Serviço

BASE ADM CURADO

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

AUTORIZO O PAGAMENTO

NÃO AUTORIZO O PAGAMENTO

EM: 10/02/2023

Felipe
Felipe Glasner de Mota Chagas - Cel
Ordenador de Despesas

DECLARAÇÃO

**Declaro que os serviços constantes
deste titulo de credito foram
prestados.**

Assinatura: _____

Wellington **Edwin** Corrêa- TC
Fiscal Administrativo- Base ADM Curado

CPF:

RG:



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
C M NE - 7ª RM / 7ª DE
BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO

PAGAMENTO DE FATURA

Para efeito de pagamento, informo-vos o seguinte:

1. DADOS DA OBRA

a) PLANO: 2022 OBRA: DIVALC OM : Base Adm Curado

b) DISCRIMINAÇÃO: Serviços De Adequação Do Pavilhão Multiuso Do Comando Da 7ª Região Militar –
Divisão De Aquisições, Licitações E Contratos (Divalc)

Contrato: nº 04/2021.

2. DADOS DO PAGAMENTO

a) FIRMA INTERESSADA: **G2 Construção e Manutenção Industrial LTDA**

b) VALOR CONTRATADO: R\$ 435.315,82 – Contrato 04/2021 - 3ª Medição

c) EMPENHO Nº 2022NE2016 DATA 14/12/2022

d) VALOR EMPENHADO: R\$ 435.315,82

e) NOTA FISCAL No **00000067** DATA DA EMISSÃO: **02/02/2023**

f) VALOR: R\$ **17.648,89** (dezesete mil, seiscentos e quarenta e oito reais e oitenta e nove centavos).

3. DADOS BANCÁRIOS

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 1245-9 C/C.: 44116-3

VALOR DA ETAPA:	ACUMULADO:	SALDO:
R\$ 17.648,89	R\$ 55.208,78	R\$ 380.107,04

10 de fevereiro de 2023

Jaqueline Cezario

JAQUELINE DOS SANTOS CEZARIO – 3º SGT STT
Fiscal Técnico do contrato da Base Administrativa do Curado

10 de fevereiro de 2023

Wellington Edwin Corrêa
WELLINGTON EDWIN CORRÊA – TC
Chefe da Fiscalização Administrativa da Base Administrativa do curado

Autorizo o pagamento:

10 de fevereiro de 2023

Felipe Glasner de Maia Chagas
FELIPE GLASNER DE MAIA CHAGAS – CEL
Ordenador de Despesas e Comandante da Base Administrativa do Curado



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
C M NE - 7ª RM / 7ª DE
BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO

PAGAMENTO DE FATURA

Para efeito de pagamento, informo-vos o seguinte:

1. DADOS DA OBRA

a) PLANO: 2022 OBRA: DIVALC OM : Base Adm Curado

b) DISCRIMINAÇÃO: Serviços De Adequação Do Pavilhão Multiuso Do Comando Da 7ª Região Militar –
Divisão De Aquisições, Licitações E Contratos (Divalc)

Contrato: nº 04/2021.

2. DADOS DO PAGAMENTO

a) FIRMA INTERESSADA: **G2 Construção e Manutenção Industrial LTDA**

b) VALOR CONTRATADO: R\$ 435.315,82 – Contrato 04/2021 - 3ª Medição

c) EMPENHO Nº 2022NE2016 DATA 14/12/2022

d) VALOR EMPENHADO: R\$ 435.315,82

e) NOTA FISCAL No **00000067** DATA DA EMISSÃO: **02/02/2023**

f) VALOR: R\$ **17.648,89** (dezesete mil, seiscentos e quarenta e oito reais e oitenta e nove centavos).

3. DADOS BANCÁRIOS

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 1245-9 C/C.: 44116-3

VALOR DA ETAPA: R\$ 17.648,89 ACUMULADO: R\$ 55.208,78 SALDO: R\$ 380.107,04

10 de fevereiro de 2023

Jaqueline dos Santos Ceزارio
JAQUELINE DOS SANTOS CEZARIO – 3º SGT STT
Fiscal Técnico do contrato da Base Administrativa do Curado

10 de fevereiro de 2023

Wellington Edwin Corrêa
WELLINGTON EDWIN CORRÊA – TC
Chefe da Fiscalização Administrativa da Base Administrativa do curado

Autorizo o pagamento:

10 de fevereiro de 2023

Felipe Glasner de Maia Chagas
FELIPE GLASNER DE MAIA CHAGAS – CEL
Ordenador de Despesas e Comandante da Base Administrativa do Curado




**Relatório Técnico de
Medição
nº 03**







**SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO PAVILÃO MULTIUSO DO COMANDO DA 7ª
REGIÃO MILITAR – DIVISÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS
(DIVALC) - Contrato: nº 04/2021.**


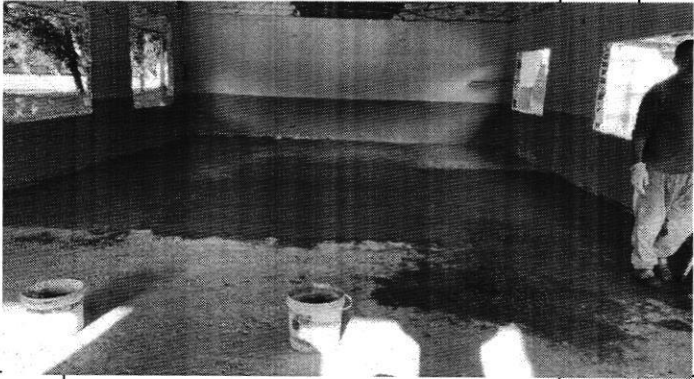
Anexo 3

(Planilha de Memória de Cálculo – G2)

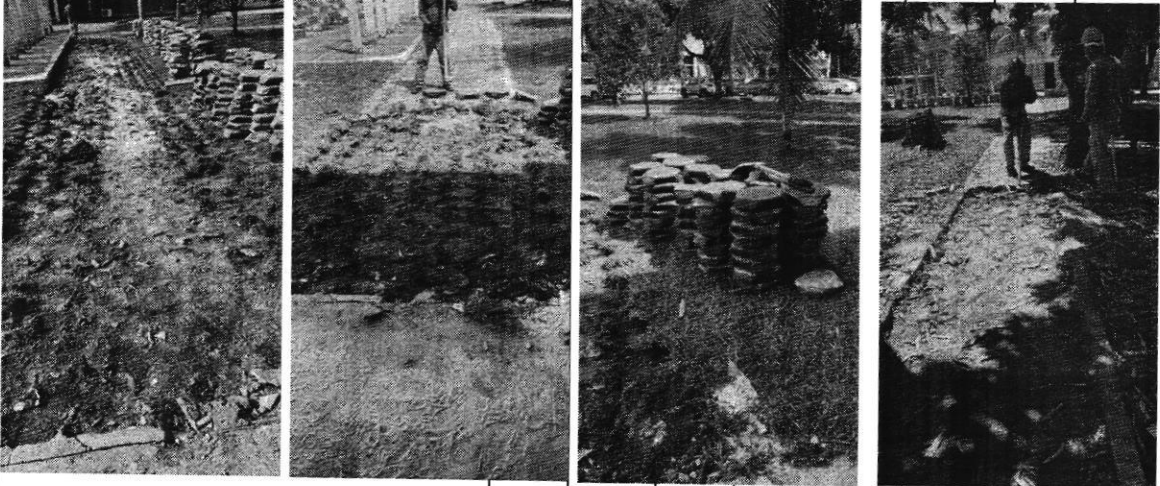BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 03								
MEMÓRIA DE CÁLCULO								
OBJETO: ADEQUAÇÃO DO PAVILHÃO MULTIUSO DO CMDO 7ª RM - DIVALC								
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	COMP.	LARG.	ALT.	TAXA	
1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
1.1	ESTUDOS E PROJETOS							
1.1.1	PROJETOS EXECUTIVOS							
1.1.1.1	(ADAP SCO SE 24.70.0400) - Projeto executivo de instalação elétrica aprovado pela concessionária, em prédios administrativos de 500 a 3000m2 de área	M²	514,6					
1.1.1.2	(ADAP SCO SE 25.70.1000) - Projeto executivo de rede lógica (computadores), em prédios com área de 500m2 a 3000m2.	M²	514,6					
2	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS							
2.1	PESSOAL							
2.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	COTA	6,60					
3	TAXAS, IMPOSTOS E LICENÇAS							
3.1	ART							
3.1.2	ART PARA CONTRATO DE OBRA OU SERVIÇO COM VALORES ATÉ R\$ 8.000,00 (CONTRATO, FISCALIZAÇÃO E PROJETOS).	UND	4,00					
4	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES							
4.1	DEMOLIÇÕES		QUANT.	COMP.	LARG.	ALT.	TAXA	
4.1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³						
	* abertura de vão de janela		0,33	2,00	0,15	1,10		
	* abertura de vão de porta			1,00	0,15	2,10		
4.1.2	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²						
			72,01	32,73	2,20			
			54,75	39,11	1,40			
			1,10					
	TOTAL		139,44					
								

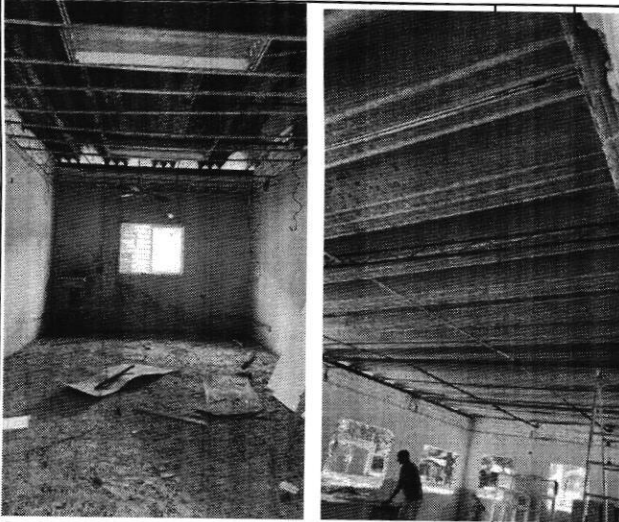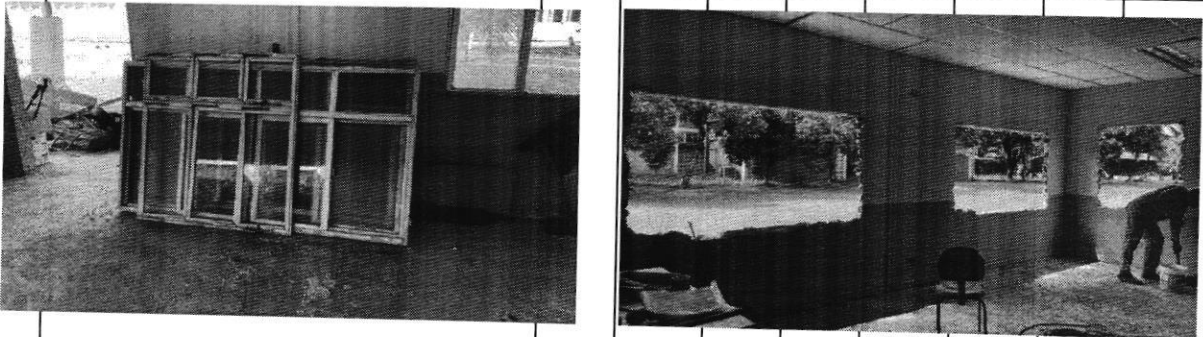									
4.2.4	ESQUADRIAS		QUANT.		COMP.	LARG.	ALT.	TAXA	
4.2.4.1	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ²							
			21,00		2,50		1,20	7,00	
			9,00		2,00		1,50	3,00	
		TOTAL	30,00						
	* Obs. Saldo de planilha já utilizado 100%								
									
4.2.4.2	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ²							
			2,625		1,25		2,10		
			2,604		1,24		2,10		
		TOTAL	5,23						
4.2.5	CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS DE DEMOLIÇÃO								
4.2.5.1	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m ³	12						
	* equivalente a 2 caçambas removidas								
4.2.5.2	ALUGUEL DE CACAMBA 48 HORAS COM RETIRADA	UN	2						

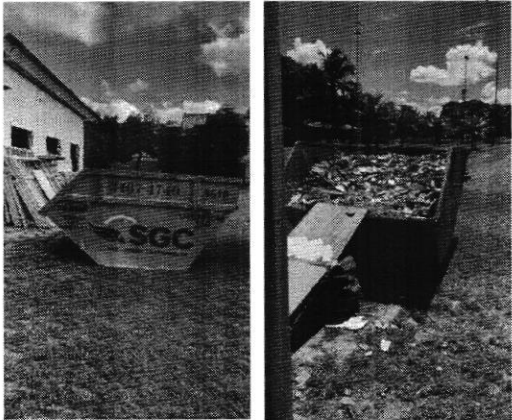										
5.1.3	PLACA DE OBRA									
5.1.3.1	(ADAP SINAPI 74209/001) - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m ²	6			3,00	2,00			
										
7	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS									
7.1	ESGOTO									
7.1.2	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS									
7.1.2.1	CX DE INSPEÇÃO									
7.1.2.1.1	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	und	2,00							
7.1.3	ESCAVAÇÕES E RASGOS									
7.1.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m ³	2,00							

									
7.1.5	ATERRO E REATERROS								
7.1.5.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m ³	2,00						
	* equivalente a área escavada								
7.2	VENTILAÇÃO								
7.2.2	ESCAVAÇÕES E RASGOS								
7.2.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m ³	1,00						
14	PISO/SOLEIRAS/RODAPÉS/DEGRAUS								
14.1	CONTRAPISOS E REVESTIMENTOS					COMP.	LARG.	ALT.	TAXA
14.1.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE, E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m ²							
			52,90			7,70	6,87		
									
<p>Polianne Soares Engenheira Civil - CREA 181587846-0</p> <p>POLIANNE KARINE SOARES SANTANA:05160252444</p> <p>Assinado de forma digital por POLIANNE KARINE SOARES SANTANA:05160252444 Dados: 2023.01.26 14:10:24 -03'00'</p>									



**Relatório Técnico de
Medição
nº 03**



**SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO PAVILÃO MULTIUSO DO COMANDO DA 7ª
REGIÃO MILITAR – DIVISÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS
(DIVALC) - Contrato: nº 04/2021.**

Apêndice 1

(Planilha de Medição de Serviços 7RM)

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ADM CURADO	BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 01	CONTRATO N° 06/2021	CONCEDENTE: BASE ADM	MEDIÇÃO N° 01
RATADA: GZ CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA – EPP			DATA DE INÍCIO DA OBRA:	
SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO PAVILHÃO MULTIUSO DO COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR – DIVISÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS (DIVALC).	CONTRATO 04/2022	ORDEM DE SERVIÇO: N° 04 /2021 - BASE ADM CURADO	PERÍODO DA MEDIÇÃO: OUT E NOV 2022	
VALOR CONTRATO: R\$ 435.315,82			SALDO ANT:	ESTA MEDIÇÃO:
			409.387,80	R\$ 17.648,89

ID	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	CONTRATO			BM 01		BM 02		BM 03		ACUMULADO	
			QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL		
	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS												
	ESTUDOS E PROJETOS												
	PROJETOS EXECUTIVOS												
	(ADAP SCO SE 24.70.0400) - Projeto executivo de instalação elétrica aprovada pela concessionária, em prédios administrativos de 500	M²	514,6	7,75	3.988,15					514,6	3.988,15	514,60	3.988,15
1	COMPON 3000m2 de área												
1	CRO7 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	COTA	100	324,07	32.407,00	5,54	1795,34	3,42	1.108,31	6,60	2.138,85	8,96	2.903,67
	TAXAS, IMPOSTOS E LICENÇAS												
	ART												
2	ART PARA CONTRATO DE OBRA OU SERVIÇO COM VALORES ATÉ R\$ 8.000,00 (CONTRATO, FISCALIZAÇÃO E PROJETOS).	UN	4	88,78	355,12					4,00	355,12	4,00	355,12
	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES												
	DEMOLIÇÕES												
1	97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	5.7045	40,56	231,37					0,65	26,36	0,65	26,36
2	97635 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	229,78	11,26	2.587,32					139,43	1.569,98	139,43	1.569,98
3	97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	145,83	16,10	2.347,86					145,83	2.347,86	145,83	2.347,86
1	97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	70,21	2,36	165,70					70,21	165,70	70,21	165,70
	REMOÇÕES												
	REDES EMBUTIDAS												
1	97661 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	300	0,59	177,00					300,00	177,00	300,00	177,00
1	97660 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	10	0,59	5,90					10,00	5,90	10,00	5,90
2	97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	10	1,16	11,60					10,00	11,60	10,00	11,60
3	APARELHOS / ACESSÓRIOS												
2	97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	2	11,13	22,26					1,00	11,13	1,00	11,13
1	FORRO / ESTRUTURAS												
1	97640 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	127,3	1,85	235,51					127,30	235,51	127,30	235,51
1	ESQUADRIAS												
1	97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	14,71	29,50	433,95					14,71	433,95	14,71	433,95
1	97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	18,27	8,40	153,47					5,22	43,85	5,22	43,85
2	CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS DE DEMOLIÇÃO												
1	100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	42,71	7,81	333,57					12,00	93,72	12,00	93,72
1	CRO7 - (ADAP SBC 210500) - ALUGUEL DE CAÇAMBA 48 HORAS COM RETIRADA	UN	9	428,12	3.853,08					2,00	856,24	2,00	856,24
2	CRO7 - (ADAP SINAPI 74209/001) - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6	278,48	1.670,88					6,00	1.670,88	6,00	1.670,88
1	97802 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2	515,15	1.030,30					2,00	1.030,30	2,00	1.030,30
1	93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	14,1	78,33	1.104,45					2,00	156,66	2,00	156,66
	ESCAVAÇÕES E RASGOS												
1	93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	1	78,33	78,33					1,00	78,33	1,00	78,33
3	94439 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L. ESPESSURA 4 CM ÁREAS SECAS E ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE E 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO.	m²	143,63	39,66	5.696,37					52,90	2.098,01	52,90	2.098,01
	TOTAL:						R\$ 25.928,02		R\$ 11.631,87		R\$ 17.648,89		



**Relatório Técnico de
Medição
nº 03**



**SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO PAVILÃO MULTIUSO DO COMANDO DA 7ª
REGIÃO MILITAR – DIVISÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS
(DIVALC) - Contrato: nº 04/2021.**

Anexo 1

(Cronograma Físico Financeiro – G2)

G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA
CNPJ: 09.145.367/0001-78



Obra
ADEQUAÇÃO DO PAVILHÃO MULTIUSO DO CMDO 7º RM - DIVALC

Bancos
SINAPI - 03/2022 - Pernambuco
SBC - 03/2022 - Pernambuco
ORSE - 02/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará
CPOS - 02/2022 - São Paulo

B.D.I.
22,32%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,77%
Mensalista: 69,42%

14/09/2022

Cronograma Físico e		14/09/2022												
Item	Descrição	Total Por Etapa	14/10/2022 30 DIAS	15/11/2022 60 DIAS	19/12/2022 90 DIAS	12/01/2023 120 DIAS	11/02/2023 150 DIAS	19/03/2023 180 DIAS	12/04/2023 210 DIAS	12/05/2023 240 DIAS	11/06/2023 270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	100,00%		100,00%										
2	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	42.501,62		42.501,62										
3	TAXAS, IMPORTOS E LICENÇAS	100,00%	100,00%											
4	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	744,34	744,34											
5	QUANTIDADE DE OBRAS	10,553,54					10,553,54							
6	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	100,00%					100,00%							
7	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	100,00%					100,00%							
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%					100,00%							
9	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS/LÓGICA/ORTV	40.849,07												
10	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	100,00%												
11	ALVENARIAS E PAINÉIS DE FIBRAMENTO	100,00%												
12	DIVISÓRIAS	6.932,17												
13	REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS	24.390,20												
14	PISO SOL/EIRAS/LOÇAPES/DEGRAU	68.281,44												
15	ESQUADRIAS/FERRAGENS/ARMANÇOS EMBUTIDOS	100,00%												
16	BANCADA / LOÇAPAS / FIAS / TANQUES / METAIS E ACESSÓRIOS	30.627,68												
17	PINTURAS (PISOS, PAREDES E TETOS)	7.766,11												
18	URBANIZAÇÃO/CERCAMENTO	100,00%												
19	LIMPEZAS	11.202,11												
Porcentagem		729,93	0,17%	9,76%	0,0%	0,0%	8,71%	4,8%	26,53%	36,01%	14,01%	0,0%	0,0%	0,0%
Custo		744,34	744,34	42.501,62	0,00	0,00	37.913,17	20.913,98	115.506,99	156.755,04	60.980,68	0,00	0,00	0,00
Porcentagem Acumulado			0,17%	9,93%	9,93%	18,64%	23,45%	49,99%	85,99%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Custo Acumulado			744,34	43.245,96	43.245,96	43.245,96	81.159,12	102.073,10	217.580,09	374.335,13	435.315,82	435.315,82	435.315,82	435.315,82


Recife, 12 de Julho de 2022.

Valor total Proposta : R\$ 435.315,82 (Quatrocentos e trinta e Cinco Mil, Trezentos e Quinze reais e Oitenta e dois centavos)

Validade Proposta : 60 (Sessenta) Dias

Poliane Soares

Poliane Soares
Sócia / Engenheira Civil
CREA 181587846-0



**Relatório Técnico de
Medição
nº 03**

**SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO PAVILÃO MULTIUSO DO COMANDO DA 7ª
REGIÃO MILITAR – DIVISÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS
(DIVALC) - Contrato: nº 04/2021.**

Anexo 2

(Planilha de Medição de Serviços – G2)

G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA
CNPJ: 09.145.367/0001-78



Obra

Cópia de: Cópia de: ADEQUAÇÃO DO PAVILHÃO MULTIUSO DO CMDO 7ª RM - DIVALC

Planinha de Levantamento para Medição

Item	Descrição	Quant. Orçada	Quant. Executada	% Executada	Valor Executado	3ª Medição 23/01/2023
1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					R\$ 3.988,15 9,38%
1.1	ESTUDOS E PROJETOS					R\$ 3.988,15 9,38%
1.1.1	PROJETOS EXECUTIVOS					R\$ 3.988,15 9,38%
1.1.1.1	(ADAP SCO SE 24.70.0400) - Projeto executivo de instalação elétrica aprovado pela concessionária, em prédios administrativos de 500 a 3000m2 de área	514,6	514,6	100,0%	3.988,15	514,6 R\$ 3.988,15 100,00%
1.1.1.2	(ADAP SCO SE 25.70.1000) - Projeto executivo de rede lógica (computadores), em prédios com área de 500m2 a 3000m2.	514,6	0,0	0,0%	0,00	
1.1.1.3	(ADAP SCO SE 24.65.0400 (A)) - Fornecimento de projeto executivo de instalações hidráulicas, aprovado na concessionária em habitações/edifícios, com 500 a 3000m2 de área.	514,6	514,6	100,0%	6.319,28	
1.1.1.4	(ADAP SCO SE 24.60.0100 (A)) - Projeto Executivo de instalação de esgoto sanitário e águas pluviais aprovado pela concessionária, em prédios escolares e administrativos com 500 a 3000m2.	514,6	514,6	100,0%	4.204,28	
1.1.1.5	(ADAP SCO SE 25.25.0250) - Projeto executivo de arquitetura para prédios administrativos de 501 até 3000m2	742,2	742,2	100,0%	23.898,84	
2	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS					R\$ 2.138,86 6,59%
2.1	PESSOAL					R\$ 2.138,86 6,59%
2.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,0	15,56	15,56%	5.042,51	6,6 R\$ 2.138,86 6,60%

G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA
CNPJ: 09.145.367/0001-78

3	TAXAS,IMPOSTOS E LICENÇAS						R\$ 355,12
3.1	ART						47.70% R\$ 355,12 47.70%
3.1.1	ART PARA CONTRATO DE OBRA OU SERVIÇO COM VALORES ACIMA DE R\$ 15.000,00 (CONTRATO, FISCALIZAÇÃO E PROJETOS).	1,0	1,0	100,0%	233,84		
3.1.2	ART PARA CONTRATO DE OBRA OU SERVIÇO COM VALORES ATÉ R\$ 8.000,00 (CONTRATO, FISCALIZAÇÃO E PROJETOS).	4,0	4,0	100,0%	355,12	4,0	R\$ 355,12 100,00%
3.1.3	ART PARA CONTRATO DE OBRA OU SERVIÇO COM VALORES DE R\$ 8.000,01 ATÉ R\$ 15.000,00 (CONTRATO, FISCALIZAÇÃO E PROJETOS).	1,0	0,0	0,0%	0,00		
4	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES						R\$ 5.978,76 56.62% R\$ 4.109,89 77.07%
4.1	DEMOLIÇÕES						0,65 R\$ 26,36 11,39%
4.1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	5,7045	0,65	11,39%	26,36		
4.1.2	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	229,78	139,43	60,68%	1.569,98	139,43	R\$ 1.569,98 60,68%
4.1.3	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	145,83	145,83	100,0%	2.347,86	145,83	R\$ 2.347,86 100,00%
4.1.4	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	70,21	70,21	100,0%	165,69	70,21	R\$ 165,69 100,00%
4.2	REMOÇÕES						R\$ 1.868,87 35.75% R\$ 194,50 100,00%
4.2.1	REDES EMBUTIDAS						300,0 R\$ 177,00 100,00%
4.2.1.1	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	300,0	300,0	100,0%	177,00	300,0	R\$ 177,00 100,00%

G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA
CNPJ: 09.145.367/0001-78

4.2.1.2	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	10,0	10,0	100,0%	5,90	10,0	R\$ 5,90	100,00%
4.2.1.3	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	10,0	10,0	100,0%	11,60	10,0	R\$ 11,60	100,00%
4.2.2	APARELHOS / ACESSÓRIOS						R\$ 246,63	95,68%
4.2.2.1	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	2,0	1,0	50,0%	11,13	1,0	R\$ 11,13	50,00%
4.2.2.2	FORRO / ESTRUTURAS						R\$ 235,50	100,00%
4.2.2.2.1	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	127,3	127,3	100,0%	235,50	127,3	R\$ 235,50	100,00%
4.2.4	ESQUADRIAS						R\$ 477,78	81,33%
4.2.4.1	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	14,71	14,71	100,0%	433,94	14,71	R\$ 433,94	100,00%
4.2.4.2	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	18,27	5,22	28,57%	43,84	5,22	R\$ 43,84	28,57%
4.2.5	CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS DE DEMOLIÇÃO						R\$ 949,96	22,69%
4.2.5.1	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	42,71	12,0	28,1%	93,72	12,0	R\$ 93,72	28,10%
4.2.5.2	ALUGUEL DE CACAMBA 48 HORAS COM RETIRADA	9,0	2,0	22,22%	856,24	2,0	R\$ 856,24	22,22%
5	CANTEIRO DE OBRAS						R\$ 1.670,88	16,86%
5.1	CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS						R\$ 1.670,88	16,86%

G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA
CNPJ: 09.145.367/0001-78

5.1.1.1	(ADAP SINAPI 10776) - LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ALMOXARIFADO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	5,0	0,0	0,0%	0,00	
5.1.2	ESCRITORIO					R\$ 0,00 0.00%
5.1.2.1	(ADAP SINAPI 10775) LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	5,0	0,0	0,0%	0,00	
5.1.3	PLACA DE OBRA					R\$ 1.670,88 100.00%
5.1.3.1	(ADAP SINAPI 74209/001) - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	6,0	6,0	100,0%	1.670,88	6,0 R\$ 1.670,88 100,00%
6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					R\$ 0,00 0.00%
6.1	ÁGUA FRIA					R\$ 0,00 0.00%
6.1.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES					R\$ 0,00 0.00%
6.1.1.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA	7,0	0,0	0,0%	0,00	
6.1.1.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE	21,0	0,0	0,0%	0,00	
6.1.2	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS					R\$ 0,00 0.00%
6.1.2.1	REGISTROS					R\$ 0,00 0.00%
6.1.2.1.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	3,0	0,0	0,0%	0,00	
6.2	DRENAGEM PLUVIAL					R\$ 0,00 0.00%
6.2.1	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	109,8	0,0	0,0%	0,00	

G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA
CNPJ: 09.145.367/0001-78

6.2.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE	7,0	0,0	0,0%	0,00	
7	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					R\$ 1.419,11 10.39%
7.1	ESGOTO					R\$ 1.340,78 12.01%
7.1.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES					R\$ 0,00 0.00%
7.1.1.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR	65,0	0,0	0,0%	0,00	
7.1.1.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE	10,0	0,0	0,0%	0,00	
7.1.1.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE	10,0	0,0	0,0%	0,00	
7.1.2	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS					R\$ 1.030,30 88.92%
7.1.2.1	CX DE INSPEÇÃO					R\$ 1.030,30 100.00%
7.1.2.1.1	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	2,0	2,0	100,0%	1.030,30	2,0 R\$ 1.030,30 100,00%
7.1.2.2	RALOS SIFONADOS					R\$ 0,00 0.00%
7.1.2.2.1	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	4,0	0,0	0,0%	0,00	
7.1.3	ESCAVAÇÕES E RASGOS					R\$ 156,66 14.18%
7.1.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	14,1	2,0	14,18%	156,66	2,0 R\$ 156,66 14,18%
7.1.4	LASTRO					R\$ 0,00 0.00%

G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA
CNPJ: 09.145.367/0001-78

7.1.4.1	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	2,35	0,0	0,0%	0,00	
7.1.5	ATERRO E REATERROS					R\$ 153,82
						17,02%
7.1.5.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	11,75	2,0	17,02%	153,82	2,0 R\$ 153,82 17,02%
7.1.6	CARGA, TRANS DES ESPAL DE MAT PRO D FUN(MATERIAL DAS VALAS)					R\$ 0,00
						0,00%
7.1.6.1	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).	28,2	0,0	0,0%	0,00	
7.1.6.2	LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS COM 5M³ PARA DEPÓSITO E RETIRADA DE RESÍDUOS CLASSE A POR 5(CINCO) DIAS	6,0	0,0	0,0%	0,00	
7.2	VENTILAÇÃO					R\$ 78,33
						3,14%
7.2.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES					R\$ 0,00
						0,00%
7.2.1.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE	25,0	0,0	0,0%	0,00	
7.2.2	ESCAVAÇÕES E RASGOS					R\$ 78,33
						100,00%
7.2.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	1,0	1,0	100,0%	78,33	1,0 R\$ 78,33 100,00%
7.2.3	ATERRO E REATERROS					R\$ 0,00
						0,00%
7.2.3.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	1,0	0,0	0,0%	0,00	
7.2.4	CARGA, TRANS DES ESPAL DE MAT PRO D FUN(MATERIAL DAS VALAS)					R\$ 0,00
						0,00%
7.2.4.1	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).	1,0	0,0	0,0%	0,00	

G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA
CNPJ: 09.145.367/0001-78

7.2.4.2	LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS COM 5M³ PARA DEPÓSITO E RETIRADA DE RESÍDUOS CLASSE A POR 5(CINCO) DIAS	1,0	0,0	0,0%	0,00	
8	INTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 0,00
8.1	REDES EM MÉDIA E BAIXA TENSÃO					0,00% R\$ 0,00
8.1.1	QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO					0,00% R\$ 0,00 0,00%
8.1.1.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,0	0,0	0,0%	0,00	
8.1.2	ELETRODUTOS					R\$ 0,00 0,00%
8.1.2.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	255,9	0,0	0,0%	0,00	
8.1.2.2	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	13,0	0,0	0,0%	0,00	
8.1.2.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	4,0	0,0	0,0%	0,00	
8.1.2.4	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	37,4	0,0	0,0%	0,00	
8.1.2.5	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	152,94	0,0	0,0%	0,00	
8.1.3	CABOS E FIOS (CONDUTORES)					R\$ 0,00 0,00%
8.1.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	1.219,4	0,0	0,0%	0,00	
8.1.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	58,3	0,0	0,0%	0,00	

G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA
 CNPJ: 09.145.367/0001-78

8.1.3.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	183,1	0,0	0,0%	0,00
8.1.3.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	187,0	0,0	0,0%	0,00
8.1.4	CAIXAS DE PASSAGEM				R\$ 0,00 0.00%
8.1.4.1	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	46,0	0,0	0,0%	0,00
8.1.4.2	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	27,0	0,0	0,0%	0,00
8.1.4.3	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	32,0	0,0	0,0%	0,00
8.1.4.4	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	3,0	0,0	0,0%	0,00
8.1.4.5	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	3,0	0,0	0,0%	0,00
8.1.4.6	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	3,0	0,0	0,0%	0,00
8.1.4.7	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	9,0	0,0	0,0%	0,00
8.1.4.8	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	1,0	0,0	0,0%	0,00
8.1.4.9	CAIXA DE PASSAGEM PISO COM TAMPA APARAFUSADA 100X100X60MM - ADAP SBC(61427_0321)	1,0	0,0	0,0%	0,00

G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA
CNPJ: 09.145.367/0001-78

8.1.4.10	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	6,0	0,0	0,0%	0,00
8.1.4.11	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	4,0	0,0	0,0%	0,00
8.1.4.12	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	4,0	0,0	0,0%	0,00
8.1.4.13	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	2,0	0,0	0,0%	0,00
8.1.4.14	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	5,0	0,0	0,0%	0,00
8.1.4.15	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	4,0	0,0	0,0%	0,00
8.1.5	DISJUNTORES				R\$ 0,00
					0.00%
8.1.5.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	19,0	0,0	0,0%	0,00
8.1.5.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,0	0,0	0,0%	0,00
8.1.5.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	4,0	0,0	0,0%	0,00
8.1.5.4	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,0	0,0	0,0%	0,00
8.1.5.5	ADAP ORSE (7996) - DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A	2,0	0,0	0,0%	0,00

G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA
CNPJ: 09.145.367/0001-78

8.1.5.6	ADAP ORSE (9041) - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO DPS 90kA - 275v	4,0	0,0	0,0%	0,00	
8.1.6	LEITOS					R\$ 0,00 0.00%
8.1.6.1	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE	26,8	0,0	0,0%	0,00	
8.1.6.2	ADAP ORSE (762) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 x 50 x 3000 mm	26,8	0,0	0,0%	0,00	
8.2	ILUMINAÇÃO E TOMADAS					R\$ 0,00 0.00%
8.2.1	LUMINÁRIAS					R\$ 0,00 0.00%
8.2.1.1	ADAP SINAPI (97605) - PAINEL LED 60X60 48W	46,0	0,0	0,0%	0,00	
8.2.1.2	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	8,0	0,0	0,0%	0,00	
8.2.1.3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	4,0	0,0	0,0%	0,00	
8.2.2	INTERRUPTORES					R\$ 0,00 0.00%
8.2.2.1	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	8,0	0,0	0,0%	0,00	
8.2.2.2	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	4,0	0,0	0,0%	0,00	
8.2.3	TOMADAS					R\$ 0,00 0.00%
8.2.3.1	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	6,0	0,0	0,0%	0,00	

G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA
CNPJ: 09.145.367/0001-78

8.2.3.2	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	8,0	0,0	0,0%	0,00	
8.2.3.3	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	5,0	0,0	0,0%	0,00	
8.2.3.4	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	24,0	0,0	0,0%	0,00	
8.2.3.5	ADAP ORSE (780) - TOMADA 2P+t, ABNT, 10 A, PISO, PLACA EM METAL E CAIXA PVC	27,0	0,0	0,0%	0,00	
8.3	ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS					R\$ 0,00
						0,00%
8.3.1	CABOS DE DESCIDA E MALHA DE ATERRAMENTO					R\$ 0,00
						0,00%
8.3.1.1	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	7,7	0,0	0,0%	0,00	
8.3.1.2	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	9,6	0,0	0,0%	0,00	
8.3.1.3	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	2,0	0,0	0,0%	0,00	
8.3.1.4	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	4,0	0,0	0,0%	0,00	
8.3.2	ELETRODUTO DE TERRA					R\$ 0,00
						0,00%
8.3.2.1	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	7,7	0,0	0,0%	0,00	
9	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS/LÓGICA /CFTV					R\$ 0,00
						0,00%
9.1	SERVIÇOS E MATERIAIS					R\$ 0,00
						0,00%

G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA
CNPJ: 09.145.367/0001-78

9.1.1	ABERTURA MANUAL VALA DE DUTOS SOLO 1a CATEGORIA 60X50X100CM	27,0	0,0	0,0%	0,00
9.1.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	1,1	0,0	0,0%	0,00
9.1.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	38,0	0,0	0,0%	0,00
9.1.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	35,0	0,0	0,0%	0,00
9.1.5	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	40,67	0,0	0,0%	0,00
9.1.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	4,0	0,0	0,0%	0,00
9.1.7	ADAP SBC (61551) - ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1"	7,0	0,0	0,0%	0,00
9.1.8	ADAP SBC (61553) - ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 2"	2,0	0,0	0,0%	0,00
9.1.9	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	1,0	0,0	0,0%	0,00
9.1.10	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	1.920,0	0,0	0,0%	0,00
9.1.11	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	3,0	0,0	0,0%	0,00
9.1.12	ADAP ORSE (10727) - Fornecimento e instalação de voice panel 24 portas cat 6	1,0	0,0	0,0%	0,00

G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA
CNPJ: 09.145.367/0001-78

9.1.13	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	66,0	0,0	0,0%	0,00
9.1.14	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	55,0	0,0	0,0%	0,00
9.1.15	CRIMPAGEM, CERTIFICACAO E IDENTIFICACAO DOS CABOS UTP	132,0	0,0	0,0%	0,00
9.1.16	ADAP ORSE (11230) - Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/1,50m - Rev 01	110,0	0,0	0,0%	0,00
9.1.17	ADAP ORSE (10268) - Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02	66,0	0,0	0,0%	0,00
9.1.18	ADAP SBC (59448) - GUIA DE CABOS 1U PADRAO 19"	8,0	0,0	0,0%	0,00
9.1.19	ADAP SBC (59448) - GUIA DE CABOS 2U PADRAO 19"	1,0	0,0	0,0%	0,00
9.1.20	ADAP SETOP (CAB-RACK-025) - TAMPA CEGA DE 1U PARA RACK 19"	5,0	0,0	0,0%	0,00
9.1.21	ADAP ORSE (11417) - Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade	1,0	0,0	0,0%	0,00
9.1.22	ADAP AGETOP CIVIL (072291) - REGUA COM 8 TOMADAS	1,0	0,0	0,0%	0,00
9.1.23	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSA, DIMENSOES 200 X 200 X *100* MM - ADAP SBC (61446)	1,0	0,0	0,0%	0,00
9.1.24	CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	130,0	0,0	0,0%	0,00

G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA
 CNPJ: 09.145.367/0001-78

9.1.25	LANCAMENTO DE CABO FAST-CIT 50X20 DE 20 PARES - ADAP SINAPI (98401)	15,0	0,0	0,0%	0,00
9.1.26	COTAÇÃO - INSTALAÇÃO DE BASTIDORES PARA 5 BLOCOS M10A OU M10B	4,0	0,0	0,0%	0,00
9.1.27	ADAP SBC 59622 -ENGATE RAPIDO CONEXAO M10 PARA TELEFONIA	8,0	0,0	0,0%	0,00
9.1.28	MODULO PROTETOR	40,0	0,0	0,0%	0,00
9.1.29	INSTALAÇÃO DE BARRA DE ATERRAMENTO MPEI	4,0	0,0	0,0%	0,00
9.1.30	CABO TELEFONICO JUMPER FDG 500M	1,0	0,0	0,0%	0,00
9.1.31	CRIMPAGEM EM CABO TELEFONICO CONEXAO IDC	200,0	0,0	0,0%	0,00
9.1.32	CAIXA DE PASSAGEM N 3, DE SOBREPOR, PADRAO TELEBRAS , 40x40x12cm - ADAP SINAPI (100557)	1,0	0,0	0,0%	0,00
9.1.33	CONECTOR OPTICO SIMPLEX SM-9 SC-APC	6,0	0,0	0,0%	0,00
9.1.34	EXTENSAO OPTICA CONECTORIZADA 02F MM (50.0) OM3 10GIGABIT 1.5M	6,0	0,0	0,0%	0,00
9.1.35	ADAP ORSE (8690) - Cabo de fibra ótica de 6 vias	130,0	0,0	0,0%	0,00
9.1.36	SERVICOS DE FUSAO EM FIBRA OPTICA SM E MM	12,0	0,0	0,0%	0,00

G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA
CNPJ: 09.145.367/0001-78

9.1.37	CORDAO OPTICO DUPLEX SINGLE MODE 2,5m SC/SC UPC	3,0	0,0	0,0%	0,00	
9.1.38	IDENTIFICAÇÃO DE CABO OPTICO EM PLAQUETAS	7,0	0,0	0,0%	0,00	
9.1.39	CERTIFICACAO DE CABEAMENTO DE FIBRA OPTICA NIVEL 1	6,0	0,0	0,0%	0,00	
9.1.40	SERVIÇO DE TREINAMENTO HANDS ON PARA SWITCH	1,0	0,0	0,0%	0,00	
9.1.41	ADAP ORSE 8684 - Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	101,2	0,0	0,0%	0,00	
9.2	MATERIAL PERMANENTE					R\$ 0,00
9.2.1	DISTRIBUIDO INTERNO OPTICO (DIO) PARA 06 FIBRAS	1,0	0,0	0,0%	0,00	0.00%
9.2.2	ADAP CPOS (66.08.115) - Rack fechado de piso padrão metálico, 19 x 44 Us x 770 mm	1,0	0,0	0,0%	0,00	
9.2.3	ADAP ORSE (12791) - Fornecimento e instalação de Switch 24 portas Gerenciável POE 10/100 /1000 + 4SFP	1,0	0,0	0,0%	0,00	
9.2.4	ADAP ORSE (12791) - Fornecimento e instalação de Switch 48 portas	1,0	0,0	0,0%	0,00	
9.2.5	CONVERSOR DE MÍDIA MONOMODO	1,0	0,0	0,0%	0,00	
9.2.6	NOBREAK 1800VA BIVOLT	1,0	0,0	0,0%	0,00	
10	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO					R\$ 0,00 0.00%

G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA
CNPJ: 09.145.367/0001-78

10.1	EXTINTORES						R\$ 0,00
10.1.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	2,0	0,0	0,0%	0,00		0.00%
10.2	DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO						R\$ 0,00
10.2.1	ILUMINAÇÃO/PLACA DE EMERGÊNCIA						0.00%
10.2.1.1	(ADAP ORSE 12888) - Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	2,0	0,0	0,0%	0,00		R\$ 0,00
10.2.1.2	(ADAP ORSE 12884) - Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	15,0	0,0	0,0%	0,00		0.00%
11	ALVENARIAS E PAINÉIS DE FECHAMENTO						R\$ 0,00
11.1	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO						0.00%
11.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	91,49	0,0	0,0%	0,00		R\$ 0,00
11.2	ENCUNHAMENTO						0.00%
11.2.1	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016	27,37	0,0	0,0%	0,00		R\$ 0,00
12	DIVISÓRIAS						R\$ 0,00
12.1	DIVISÓRIA DE GRANITO						0.00%
12.1.1	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	12,4	0,0	0,0%	0,00		R\$ 0,00
12.2	DIVISÓRIA DE MADEIRA						0.00%

G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA
CNPJ: 09.145.367/0001-78

12.2.1	(Cópia do SBC 090054) - DIVISORIA PAINEL/VIDRO-PAINEL C/ MSO/COMEIA E=35MM COLOCADA	68,02	0,0	0,0%	0,00	
12.2.2	DIVISORIA (N3) - PAINEL/VIDRO/PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ACO GALVANIZADO PINTADO. AF_01/2021	68,02	0,0	0,0%	0,00	
13	REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS					R\$ 0,00
13.1	REVESTIMENTOS DE FORRO					0.00%
13.1	REVESTIMENTOS DE FORRO					R\$ 0,00
13.1.1	REVESTIMENTOS DE FORRO					0.00%
13.1.1	ADAP SINAPI 96115) - FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	233,81	0,0	0,0%	0,00	
13.2	CHAPISCO					R\$ 0,00
13.2	CHAPISCO					0.00%
13.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	182,98	0,0	0,0%	0,00	
13.3	EMBOÇO					R\$ 0,00
13.3	EMBOÇO					0.00%
13.3.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO	182,98	0,0	0,0%	0,00	
13.4	REVESTIMENTO DE PAREDE					R\$ 0,00
13.4	REVESTIMENTO DE PAREDE					0.00%
13.4.1	(ADAP AGETOP 200503) - REVESTIMENTO C/LITOCERAMICA PARA PAREDES	107,01	0,0	0,0%	0,00	
13.4.2	(ADAP ORSE 11808) - Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, linha pietra di firenze, grigio, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização	67,81	0,0	0,0%	0,00	
14	PISO/SOLEIRAS/RODAPÉS/DEGRAUS					R\$ 2.098,01
14.1	CONTRAPISOS E REVESTIMENTOS					3.13%
14.1	CONTRAPISOS E REVESTIMENTOS					R\$ 2.098,01
14.1.1	CONTRAPISOS E REVESTIMENTOS					14.93%
14.1.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO	233,3	0,0	0,0%	0,00	

G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA
CNPJ: 09.145.367/0001-78

14.1.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	1,8	0,0	0,0%	0,00	
14.1.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE	143,63	52,9	36,83%	2.098,01	52,9 R\$ 2.098,01 36,83%
14.2	PISOS					R\$ 0,00 0.00%
14.2.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	233,3	0,0	0,0%	0,00	
14.2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	172,37	0,0	0,0%	0,00	
14.2.3	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	132,36	0,0	0,0%	0,00	
15	ESQUADRIAS/FERRAGENS/ARMÁRIOS EMBUTIDOS					R\$ 0,00 0.00%
15.1	VEGAS E CONTRAVERGAS					R\$ 0,00 0.00%
15.1.1	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	36,2	0,0	0,0%	0,00	
15.1.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	3,0	0,0	0,0%	0,00	
15.1.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	4,8	0,0	0,0%	0,00	
15.1.4	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	7,3	0,0	0,0%	0,00	
15.1.5	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	3,0	0,0	0,0%	0,00	

G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA
CNPJ: 09.145.367/0001-78

15.1.6	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	36,2	0,0	0,0%	0,00	
15.2	PORTAS E JANELAS DE FERRO					R\$ 0,00 0.00%
15.2.1	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	3,15	0,0	0,0%	0,00	
15.2.2	PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018	3,15	0,0	0,0%	0,00	
15.3	PORTAS E JANELAS DE ALUMÍNIO					R\$ 0,00 0.00%
15.3.1	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	0,9	0,0	0,0%	0,00	
15.3.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E	34,1	0,0	0,0%	0,00	
15.4	PORTAS E JANELAS DE MADEIRA					R\$ 0,00 0.00%
15.4.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA	1,0	0,0	0,0%	0,00	
15.4.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA	3,0	0,0	0,0%	0,00	
15.4.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA	2,0	0,0	0,0%	0,00	
15.4.4	(ADAP SBC 110236) - PORTA DE MADEIRA 1 FL. M,60X2,10M - P/DIVISÓRIA C/FERRAGENS	4,0	0,0	0,0%	0,00	
15.4.5	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	14,91	0,0	0,0%	0,00	

G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA
CNPJ: 09.145.367/0001-78

15.5	PORTAS E JANELAS DE VIDRO TEMPERADO						R\$ 0,00
15.5.1	PORTA DE VIDRO TEMPERADO - ACESSO						0,00% R\$ 0,00
15.5.1.1	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	2,0	0,0	0,0%	0,00		0,00%
15.5.2	PORTA DE VIDRO TEMPERADO - BANHEIRO						R\$ 0,00
15.5.2.1	(ADAP SBC 150190) - PORTA EM VIDRO TEMPERADO JATEADO 10 MM COM FERRAGENS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4,68	0,0	0,0%	0,00		0,00%
16	BANCADA / LOUÇAS / PIAS / TANQUES / METAIS E ACESSÓRIOS						R\$ 0,00
16.1	LOUÇAS						0,00% R\$ 0,00
16.1.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	5,0	0,0	0,0%	0,00		0,00%
16.1.2	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1,0	0,0	0,0%	0,00		
16.1.3	(ADAP ORSE 7712) - Cuba de semi-encaixe, dim. 49 x 40cm, INCEPA, linha ocean pacific, ref. 63027 ou siimilar, inclusive sifão e válvula	3,0	0,0	0,0%	0,00		
16.2	BANCADAS						R\$ 0,00
16.2.1	(ADAP SBC 190181) BANCADA/TAMPO SECO EM GRANITO BRANCO ITAUNAS 3 CM	2,272	0,0	0,0%	0,00		0,00%
16.3	METAIS E ACESSÓRIOS						R\$ 0,00
16.3.1	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4," PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	4,0	0,0	0,0%	0,00		0,00%
16.3.2	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	4,0	0,0	0,0%	0,00		

G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA
 CNPJ: 09.145.367/0001-78

16.3.3	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	5,0	0,0	0,0%	0,00	
16.3.4	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	5,0	0,0	0,0%	0,00	
16.3.5	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	4,0	0,0	0,0%	0,00	
16.3.6	(ADAP ORSE 9502) - Ducha higiênica com registro, linha Link, ref. 1984.C.ACT. LNK, da DECA ou similar	5,0	0,0	0,0%	0,00	
17	PINTURAS (PISOS, PAREDES E TETOS)					R\$ 0,00
17.1	PAREDES					0,00% R\$ 0,00 0,00%
17.1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	479,99	0,0	0,0%	0,00	
17.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	273,93	0,0	0,0%	0,00	
17.1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	206,06	0,0	0,0%	0,00	
18	URBANIZAÇÃO/CERCAMENTO					R\$ 0,00 0,00%
18.1	VEGETAÇÃO					R\$ 0,00 0,00%
18.1.1	GRAMA					R\$ 0,00 0,00%
18.1.1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	317,49	0,0	0,0%	0,00	
18.1.1.2	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	317,49	0,0	0,0%	0,00	

G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA
CNPJ: 09.145.367/0001-78

18.1.2	ÁRVORES					R\$ 0,00 0.00%
18.1.2.1	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	15,0	0,0	0,0%	0,00	
18.1.2.2	(ADAP SINAPI 985100) - PLANTIO DE AGAVE DRAGÃO ATTENUATA	28,0	0,0	0,0%	0,00	
19	LIMPEZAS					R\$ 0,00 0.00%
19.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	403,281	0,0	0,0%	0,00	

Valor Executado

R\$ 17.648,89



Polianne Soares
Sócia / Engenheira Civil
CREA



**Relatório Técnico de
Medição
nº 02/2022/7RM**



**SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO PAVILÃO MULTIUSO DO COMANDO
DA 7ª REGIÃO MILITAR – DIVISÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E
CONTRATOS (DIVALC) - Contrato: nº 04/2021.**

RELATÓRIO TÉCNICO
nº 03/2022 7RM (3ª medição – janeiro – 2023)

MINISTÉRIO DA DEFESA

EXÉRCITO BRASILEIRO

Comando da 7ª Região Militar

Relatório Técnico

nº 03/2022 – janeiro/23

BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO

OBRA:	SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO PAVILHÃO MULTIUSO DO COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR – DIVISÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS (DIVALC) - Contrato: nº 04/2021.
LOCAL:	7º REGIÃO MILITAR
CONTRATO:	Contrato nº 04/2021 – BASE ADM CURADO
CONTRATANTE:	BASE ADM CURADO
CONTRATADA:	G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA-EPP
RELATÓRIO DE SERVIÇOS EXECUTADOS	

1. INTRODUÇÃO

1.1 Trata-se do Serviço De Adequação Do Pavilhão Multiuso Do Comando Da 7ª Região Militar – Divisão De Aquisições, Licitações E Contratos (Divalc) - Contrato: nº 04/2021.

1.2 Celebrou-se o Termo de Contrato nº 04/2021 – entre a G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA- EPP e a BASE ADM CURADO, cujo objeto é a Adequação Do Pavilhão Multiuso Do Comando Da 7ª Região Militar – Divisão De Aquisições, Licitações E Contratos (DIVALC), cujo valor foi de R\$ 435.315,82 (quatrocentos e trinta e cinco mil, trezentos e quinze mil reais e oitenta e dois centavos).

1.3 30 Ago 22: emitiu-se a ordem de serviço da referida obra, com prazo limite para início da execução em 14/10/2022, prazo de execução de 150 (cento e cinquenta dias), com prazo para entrega de obra em 11 jun 23.

1.4 30 jan 2023: emitiu-se a **3ª medição** do Contrato nº 04/2021 – BASE ADM CURADO no valor de **R\$ 17.648,89** referente aos serviços realizados em Janeiro/2023;

2. SERVIÇOS REALIZADOS NO PERÍODO

Neste período, a contratada executou basicamente os serviços, a saber:

- ADMINISTRAÇÃO LOCAL
- PROJETO EXECUTIVO DE ELÉTRICA.
- DEMOLIÇÕES
- REMOÇÕES
- ESCAVAÇÕES
- CAIXS DE INSPEÇÕES.
- CONTRAPISO.



3. MEDIÇÕES REALIZADAS

3.1 Esta medição totalizou **R\$ 17.648,89 (dezessete mil, seiscentos e quarenta e oito reais e oitenta e nove centavos)**, correspondendo a 4,05% do valor global contratual sem reajustamentos, conforme ilustrado no quadro abaixo em comparação com o novo cronograma físico-financeiro acertado:

Descrição	1ª Medição	2ª Medição	3ª Medição
Valor medio na etapa (R\$)	R\$ 25.928,03	R\$ 11.631,87	R\$ 17.648,89
Valor acumulado na etapa (R\$)	R\$ 409.387,79	R\$ 397.755,92	R\$ 380.107,03
Percentual medido na etapa (%)	5,96	2,67	4,05
Percentual acumulado na etapa (%)	94,04	91,37	87,32

3.2 A medição pormenorizada encontra-se acostada no Apêndice 1 e 4.

3.3 Acompanhamento gráfico

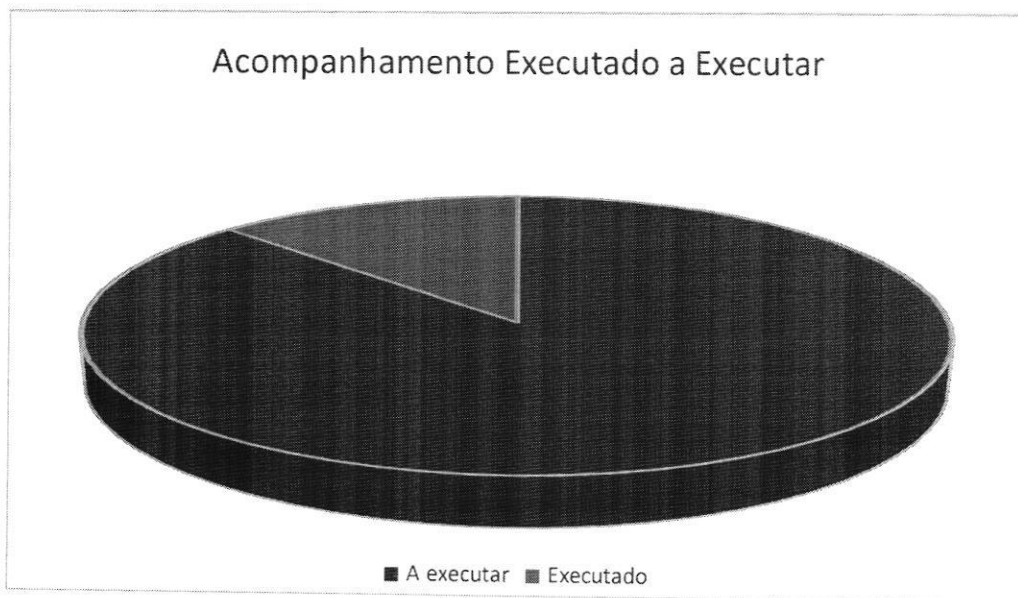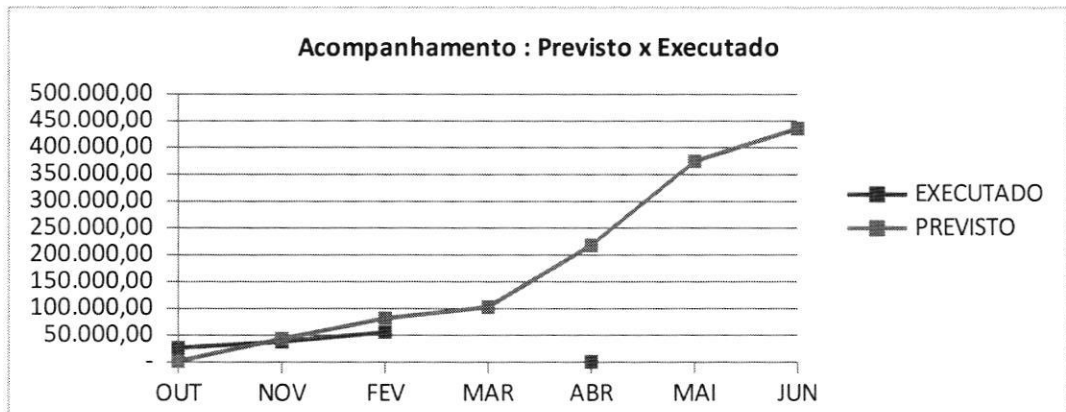

4. CONCLUSÃO

Após a compilação da documentação acostada, salvo erro ou omissão, conclui-se que:

4.1 Em termos monetários, a medição referente a este período totalizou **R\$ 17.648,89** (**dezessete mil, seiscentos e quarenta e oito reais e oitenta e nove centavos**) correspondendo a 4,05% do valor global contratual sem reajustamentos.

4.2 O percentual acumulado da obra ficou em 4,05%, correspondente a um faturamento acumulado até a data atual de **R\$ 17.648,89** restando um saldo **R\$ 380.107,03** que corresponde a 87,31% do valor total.

Recife, 06 de Fevereiro de 2023.

JAQUEINE DOS SANTOS CEZARIO – 3º SGT STT

Aux da Seção Acompanhamento de Obras – 7RM

Técnico em Edificações - CFT:

Fiscal Técnico de Contrato

LEANDRO VANUTT DA SILVA CARVALHO – 3º SGT STT

Aux da Seção Acompanhamento de Obras – 7RM

Técnico em Eletrotécnica - CFT: 07214048477

RAFAEL CAPISTRANO DE QUEIROZ COSTA– 1º TEN

Fiscal administrativo de Contrato

WELLIGTON **EDWIN** CORRÊA – TC INF

Fiscal Administrativo – Base Administrativa do Curado

FELIPE **GLASNER** DE MAIA CHAGAS – CEL

Ordenador de Despesas e Comandante da Base Administrativa do Curado

APÊNDICES

Apêndice 1: Planilha de medição de serviços

ANEXOS

Anexo 1: Cronograma Físico-financeiro (empresa)

Anexo 2: Planilha de medição de serviços (empresa)

Anexo 3: Memória de Cálculos (empresa)



**Relatório Técnico de
Medição
nº 02/2022/7RM**



**SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO PAVILÃO MULTIUSO DO COMANDO
DA 7ª REGIÃO MILITAR – DIVISÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E
CONTRATOS (DIVALC) - Contrato: nº 04/2021.**

RELATÓRIO TÉCNICO
nº 02/2022 7RM (2ª medição – dezembro – 2022)

MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO Comando da 7ª Região Militar		<h1>Relatório Técnico</h1> <h2>nº 02/2022 – dezembro/22</h2>	
BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO			
OBRA:	SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO PAVILHÃO MULTIUSO DO COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR – DIVISÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS (DIVALC) - Contrato: nº 04/2021.		
LOCAL:	7º REGIÃO MILITAR		
CONTRATO:	Contrato nº 04/2021 – BASE ADM CURADO		
CONTRATANTE:	BASE ADM CURADO		
CONTRATADA:	G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA-EPP		
RELATÓRIO DE SERVIÇOS EXECUTADOS			

1. INTRODUÇÃO

1.1 Trata-se do Serviços De Adequação Do Pavilhão Multiuso Do Comando Da 7ª Região Militar – Divisão De Aquisições, Licitações E Contratos (Divalc) - Contrato: nº 04/2021.

1.2 celebrou-se o Termo de Contrato nº 04/2021 – , entre a G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA- EPP e a BASE ADM CURADO, cujo objeto é a Adequação Do Pavilhão Multiuso Do Comando Da 7ª Região Militar – Divisão De Aquisições, Licitações E Contratos (DIVALC), cujo valor foi de R\$ 435.315,82 (quatrocentos e trinta e cinco mil, trezentos e quinze mil reais e oitenta e dois centavos).



1.3 30 Ago 22: emitiu-se a ordem de serviço da referida obra, com prazo limite para início da execução em 14/10/2022, prazo de execução de 150 (cento e cinquenta dias), com prazo para entrega de obra em 11 jun 23.

1.4 14 Dez 2022: emitiu-se a **2ª medição** do Contrato nº 04/2021 – BASE ADM CURADO no valor de **RS 11.631,87** referente aos serviços realizados em Novembro/2022;

2. SERVIÇOS REALIZADOS NO PERÍODO

Neste período, a contratada executou basicamente os serviços, a saber:

- ADMINISTRAÇÃO LOCAL
- PROJETO EXECUTIVO DE HIDRÁULICA.

3. MEDIÇÕES REALIZADAS



3.1 Esta medição totalizou **RS 11.631,87 (onze mil, seiscentos e trinta e um mil reais e oitenta e sete centavos)**, correspondendo a 8,63% do valor global contratual sem reajustamentos, conforme ilustrado no quadro abaixo em comparação com o novo cronograma físico-financeiro acertado:

Descrição	2ª Medição DEZ 2022	
Valor medido na etapa (R\$)	11.631,87	
Percentual medido na etapa (%)	8,63	
Valor acumulado medido na etapa (R\$)	397.755,93	
Percentual acumulado medido na etapa (%)	91,37	
Valor do Reajustamento	S/A	



3.2 A medição pormenorizada encontra-se acostada no Apêndice 1 e 4.

3.3 Acompanhamento gráfico

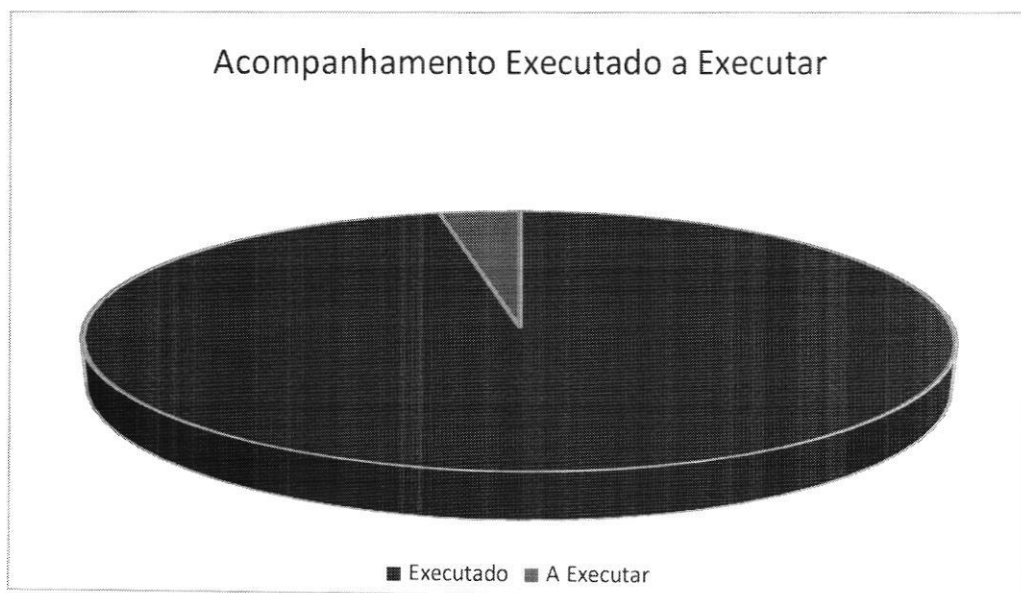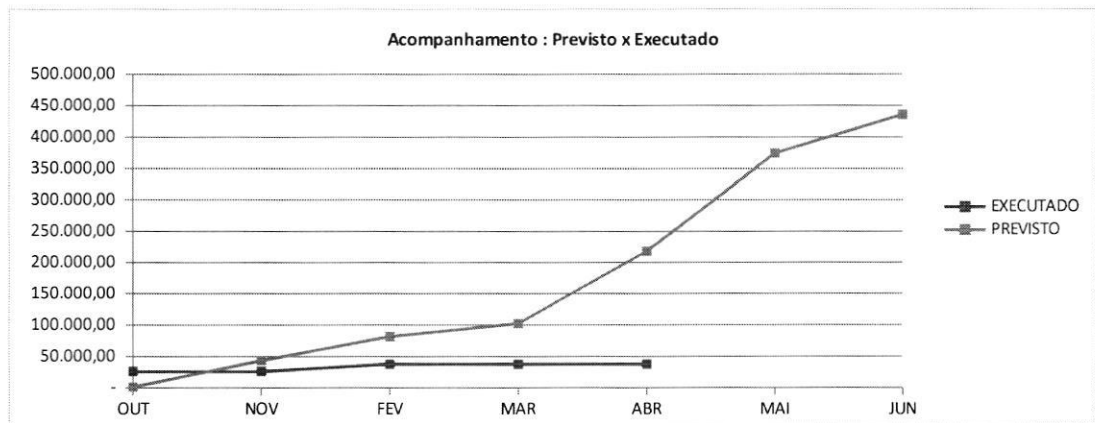

4. CONCLUSÃO

Após a compilação da documentação acostada, salvo erro ou omissão, conclui-se que:

4.1 Em termos monetários, a medição referente a este período totalizou **R\$ 11.631,87 (onze mil, seiscentos e trinta e um mil reais e oitenta e sete centavos)**, correspondendo a 8,63% do valor global contratual sem reajustamentos.

4.2 O percentual acumulado da obra ficou em 8,63%, correspondente a um faturamento acumulado até a data atual de **R\$ 37.559,89** restando um saldo **R\$ 397.755,93** que corresponde a 91,37% do valor total.

Recife, 15 de dezembro de 2022.



JAQUEINE DOS SANTOS CEZARIO – 3º SGT STT

Aux da Seção Acompanhamento de Obras – 7RM

Técnico em Edificações -

Fiscal Técnico de Contrato



RAFAEL CAPISTRANO DE QUEIROZ COSTA – 1º TEN

Fiscal administrativo de Contrato

WELLINGTON EDWIN CORRÊA – TC INF

Fiscal Administrativo – Base Administrativa do Curado


FELIPE GLASNER DE MAIA CHAGAS – CEL

Ordenador de Despesas e Comandante da Base Administrativa do Curado

APÊNDICES

Apêndice 1: Planilha de medição de serviços

ANEXOS

Anexo 1: Cronograma Físico-financeiro (empresa)

Anexo 2: Planilha de medição de serviços (empresa)



**Relatório Técnico de
Medição
nº 02/2022/7RM**



**SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO PAVILÃO MULTIUSO DO COMANDO DA 7ª
REGIÃO MILITAR – DIVISÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS
(DIVALC) - Contrato: nº 04/2021.**

Apêndice 1
(Planilha de Medição de Serviços 7RM)

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ADM CURADO	BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 01	CONTRATO N° 06/2021	CONCEDENTE: BASE ADM	MEDIÇÃO N° 01
TRATADA: G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA – EPP		DATA DE INÍCIO DA OBRA:		
SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO PAVILHÃO MULTIUSO DO COMANDO DA 7ª REGIÃO MILITAR – DIVISÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS (DIVALC).		PERÍODO DA MEDIÇÃO: OUT E NOV 2022		
AMENTO:	CONTRATO 04/2022	ORDEM DE SERVIÇO: N° 04 /2021 - BASE ADM CURADO	VALOR CONTRATO R\$ 435.315,82	SALDO ANT: 409.387,80 ESTA MEDIÇÃO: R\$ 11.631,87 SALDO: 397.755,93

0	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	CONTRATO		BM 01		BM 02		ACUMULADO		%	%
			QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.		
	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS											
	ESTUDOS E PROJETOS											
	PROJETOS EXECUTIVOS											
1. COMP	(ADAP SCO SE 24.70.0400) - Projeto executivo de instalação elétrica aprovado pela concessionária, em prédios administrativos de 500 a 3000m2 de área	M²	514,6		0,00							
2. COMP	(ADAP SCO SE 25.70.1000) - Projeto executivo de rede lógica (computadores), em prédios com área de 500m2 a 3000m2.	M²	514,6		0,00							
3. COMP	(ADAP SCO SE 24.85.0400 (A)) - Fornecimento de projeto executivo de instalações hidráulicas, aprovado na concessionária em habitações/edifícios, com 500 a 3000m2 de área.	M²	514,6	12,28	6.319,29		514,60	6.319,29	514,60	6.319,29	1,45%	
4. COMP	(ADAP SCO SE 24.60.0100 (A)) - Projeto Executivo de instalação de esgoto sanitário e águas pluviais aprovado pela concessionária, em prédios escolares e administrativos com 500 a 3000m2.	M²	514,6	8,17	4.204,28		514,60	4.204,27	514,60	4.204,28	0,97%	
5. COMP	(ADAP SCO SE 25.25.0250) - Projeto executivo de arquitetura para prédios administrativos de 501 até 3000m2	M²	742,2	32,20	23.898,84	742,20	23.898,84		742,20	23.898,84	5,49%	
	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS											
	PESSOAL											
7DSUP 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	COTA	100	324,07	32.407,00	5,54	1795,34	3,42	1.108,31	8,96	2.903,67	0,67%
	TAXAS, IMPOSTOS E LICENÇAS											
	ART											
7DSUP 01	ART PARA CONTRATO DE OBRA OU SERVIÇO COM VALORES ACIMA DE R\$ 15.000,00 (CONTRATO, FISCALIZAÇÃO E PROJETOS).	UN	1	233,84	233,84	1,00	233,84			1,00	233,84	0,05%
2	CONFE	ART PARA CONTRATO DE OBRA OU SERVIÇO COM VALORES ATÉ R\$ 8.000,00 (CONTRATO, FISCALIZAÇÃO E PROJETOS).	UN	4		0,00						
3	CONFE	ART PARA CONTRATO DE OBRA OU SERVIÇO COM VALORES DE R\$ 8.000,01 ATÉ R\$ 15.000,00 (CONTRATO, FISCALIZAÇÃO E PROJETOS).	UN	1		0,00						
						TOTAL:	R\$ 25.928,02		R\$ 11.631,87			5,96%



**Relatório Técnico de
Medição
nº 02/2022/7RM**



**SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO PAVILÃO MULTIUSO DO COMANDO DA 7ª
REGIÃO MILITAR – DIVISÃO DE AQUISIÇÕES, LICITAÇÕES E CONTRATOS
(DIVALC) - Contrato: nº 04/2021.**

Anexo 1

(Cronograma Físico Financeiro – G2)

G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA
CNPJ: 09.145.367/0001-78



Obra
ADEQUAÇÃO DO PAVILHÃO MULTIUSO DO CMDO 7ª RM - DIVALC

Bancos
SINAPI - 03/2022 - Pernambuco
SBC - 03/2022 - Pernambuco
ORSE - 02/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará
CPOS - 02/2022 - São Paulo

B.D.I. 22,32%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,77%
Mensalista: 69,42%

14/09/2022

Cronograma Físico e		14/09/2022												
Item	Descrição	Total Por Etapa	14/10/2022 30 DIAS	15/11/2022 60 DIAS	13/12/2022 90 DIAS	12/01/2023 120 DIAS	11/02/2023 150 DIAS	13/03/2023 180 DIAS	12/04/2023 210 DIAS	12/05/2023 240 DIAS	11/06/2023 270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	100,00%												
2	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	42.501,62		100,00%										
3	TAXAS, IMPOSTOS E LICENÇAS	32.407,00					20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			
4	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	744,34	100,00%											
5	CANTEIRO DE OBRAS	10.558,54					100,00%							
6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	9.988,73					60,00%	60,00%						
7	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	180,00%					50,00%	50,00%						
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	13.847,40					6.823,70	6.823,70			50,00%	50,00%		
9	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS/LÓGICA /CFTV	40.848,07								20.424,54	20.424,54			
10	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	63.445,36								26.722,66	26.722,66			
11	ALVENARIAS E PAINÉIS DE FECHAMENTO	847,45						50,00%	60,00%					
12	DIVISÓRIAS	6.932,17					3.466,09	3.466,09			50,00%			
13	REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS	24.380,20						12.180,10	12.180,10					
14	PISO/SOLEIRAS/RODAPÉS/DEGRAUS	66.221,44						40,00%	50,00%				10,00%	
15	ESQUADRIAS/FERRAGENS/ARMÁRIOS EMBUTIDOS	66.880,83						66.880,83			100,00%			
16	BANCADA / LOUÇAS / PIAS / TANQUES / METAIS E ACESSÓRIOS	30.527,98								30.527,98				
17	PINTURAS (PISOS, PAREDES E TETOS)	7.362,38								7.362,38				
18	URBANIZAÇÃO/CERCAMENTO	7.786,11								7.786,11				
19	LIMPEZAS	11.202,11								11.202,11			100,00%	
Porcentagem		729,93												
Custo			0,17%	9,76%	0,0%	0,0%	8,71%	4,8%	26,53%	36,01%	14,01%	0,0%	0,0%	0,0%
Porcentagem Acumulado			0,17%	9,93%	9,93%	9,93%	18,64%	23,45%	49,98%	85,99%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Custo Acumulado			744,34	43.245,96	43.245,96	43.245,96	81.159,12	102.073,10	217.580,09	374.335,13	435.315,82	435.315,82	435.315,82	435.315,82

Recife, 12 de Julho de 2022.

Valor total Proposta : R\$ 435.315,82 (Quatrocentos e trinta e Cinco Mil, Trezentos e Quinze reais e Oitenta e dois centavos)


Validade Proposta : 60 (Sessenta) Dias

Polianne Soares

Polianne Soares
Sócia / Engenheira Civil
CREA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



**Relatório Técnico de
Medição
nº 02/2021/7RM**

**Serviço de Adequação do Pavilhão Multiuso do Comando da 7ª
Região Militar – Divisão de Aquisições, Licitações e Contratos
(DIVALC) - Contrato: nº 04/2021.**

Anexo 2

(Planilha de Medição de Serviços – G2)



Obra
Cópia de: Cópia de: ADEQUAÇÃO DO PAVILHÃO MULTIUSO DO CMDO 7ª RM - DIVALC

Planilha de Levantamento para Medição

Item	Descrição	Quant. Orçada	Quant. Executada	% Executada	Valor Executado	Saldo Total	2ª Medição 09/12/2022
1	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					42.501,62	R\$ 10.523,56
1.1	ESTUDOS E PROJETOS					42.501,62	R\$ 10.523,56
1.1.1	PROJETOS EXECUTIVOS					42.501,62	R\$ 10.523,56
1.1.1.1	(ADAP SCO SE 24.70.0400) - Projeto executivo de instalação elétrica aprovado pela concessionária, em prédios administrativos de 500 a 3000m2 de área	514,6	0,0	0,0%	0,00	3.988,15	
1.1.1.2	(ADAP SCO SE 25.70.1000) - Projeto executivo de rede lógica (computadores), em prédios com área de 500m2 a 3000m2.	514,6	0,0	0,0%	0,00	4.091,07	
1.1.1.3	(ADAP SCO SE 24.65.0400 (A)) - Fornecimento de projeto executivo de instalações hidráulicas, aprovado na concessionária em habitações/edifícios, com 500 a 3000m2 de área.	514,6	514,6	100,0%	6.319,28	6.319,28	514,6 R\$ 6.319,28 100,00%
1.1.1.4	(ADAP SCO SE 24.60.0100 (A)) - Projeto Executivo de instalação de esgoto sanitário e águas pluviais aprovado pela concessionária, em prédios escolares e administrativos com 500 a 3000m2.	514,6	514,6	100,0%	4.204,28	4.204,28	514,6 R\$ 4.204,28 100,00%
1.1.1.5	(ADAP SCO SE 25.25.0250) - Projeto executivo de arquitetura para prédios administrativos de 501 até 3000m2	742,2	742,2	100,0%	23.898,84	23.898,84	
2	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS					32.407,00	R\$ 1.108,31
2.1	PESSOAL					32.407,00	R\$ 1.108,31
2.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,0	8,96	8,96%	2.903,65	32.407,00	3,41% R\$ 1.108,31 3,42%
3	TAXAS, IMPOSTOS E LICENÇAS					744,34	R\$ 0,00
3.1	ART					744,34	R\$ 0,00
3.1.1	ART PARA CONTRATO DE OBRA OU SERVIÇO COM VALORES ACIMA DE R\$ 15.000,00 (CONTRATO, FISCALIZAÇÃO E PROJETOS).	1,0	1,0	100,0%	233,84	233,84	0,00% R\$ 0,00 0,00%
3.1.2	ART PARA CONTRATO DE OBRA OU SERVIÇO COM VALORES ATÉ R\$ 8.000,00 (CONTRATO, FISCALIZAÇÃO E PROJETOS).	4,0	0,0	0,0%	0,00	355,12	
3.1.3	ART PARA CONTRATO DE OBRA OU SERVIÇO COM VALORES DE R\$ 8.000,01 ATÉ R\$ 15.000,00 (CONTRATO, FISCALIZAÇÃO E PROJETOS).	1,0	0,0	0,0%	0,00	155,38	
4	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES					10.558,54	R\$ 0,00
4.1	DEMOLIÇÕES					5.332,24	R\$ 0,00
4.1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	5,7045	0,0	0,0%	0,00	231,37	0,00% R\$ 0,00 0,00%
4.1.2	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	229,78	0,0	0,0%	0,00	2.587,32	
4.1.3	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	145,83	0,0	0,0%	0,00	2.347,86	
4.1.4	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	70,21	0,0	0,0%	0,00	165,69	
4.2	REMOÇÕES					5.226,30	R\$ 0,00
4.2.1	REDES EMBUTIDAS					194,50	R\$ 0,00
4.2.1.1	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	300,0	0,0	0,0%	0,00	177,00	0,00% R\$ 0,00 0,00%
4.2.1.2	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	10,0	0,0	0,0%	0,00	5,90	
4.2.1.3	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	10,0	0,0	0,0%	0,00	11,60	
4.2.2	APARELHOS / ACESSÓRIOS					257,76	R\$ 0,00
4.2.2.1	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	2,0	0,0	0,0%	0,00	22,26	0,00% R\$ 0,00 0,00%
4.2.2.2	FORRO / ESTRUTURAS					235,50	R\$ 0,00
4.2.2.2.1	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	127,3	0,0	0,0%	0,00	235,50	0,00% R\$ 0,00 0,00%

7.1.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	14,1	0,0	0,0%	0,00	1.104,45	
7.1.4	LASTRO					492,13	R\$ 0,00
7.1.4.1	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M. COM CAMADA DE AREIA. LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	2,35	0,0	0,0%	0,00	492,13	0,00%
7.1.5	ATERRO E REATERROS					903,69	R\$ 0,00
7.1.5.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	11,75	0,0	0,0%	0,00	903,69	0,00%
7.1.6	CARGA, TRANS DES ESPAL DE MAT PRO D FUN(MATERIAL DAS VALAS)					2.052,80	R\$ 0,00
7.1.6.1	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).	28,2	0,0	0,0%	0,00	209,24	
7.1.6.2	LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS COM 5M³ PARA DEPÓSITO E RETIRADA DE RESÍDUOS CLASSE A POR 5(CINCO) DIAS	6,0	0,0	0,0%	0,00	1.843,56	
7.2	VENTILAÇÃO					2.491,87	R\$ 0,00
7.2.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES					2.021,75	R\$ 0,00
7.2.1.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO). INCLUSIVE	25,0	0,0	0,0%	0,00	2.021,75	0,00%
7.2.2	ESCAVAÇÕES E RASGOS					78,33	R\$ 0,00
7.2.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	1,0	0,0	0,0%	0,00	78,33	0,00%
7.2.3	ATERRO E REATERROS					76,91	R\$ 0,00
7.2.3.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	1,0	0,0	0,0%	0,00	76,91	0,00%
7.2.4	CARGA, TRANS DES ESPAL DE MAT PRO D FUN(MATERIAL DAS VALAS)					314,68	R\$ 0,00
7.2.4.1	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).	1,0	0,0	0,0%	0,00	7,42	
7.2.4.2	LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS COM 5M³ PARA DEPÓSITO E RETIRADA DE RESÍDUOS CLASSE A POR 5(CINCO) DIAS	1,0	0,0	0,0%	0,00	307,26	
8	INTALAÇÕES ELÉTRICAS					40.849,07	R\$ 0,00
8.1	REDES EM MÉDIA E BAIXA TENSÃO					22.995,83	R\$ 0,00
8.1.1	QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO					828,38	R\$ 0,00
8.1.1.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,0	0,0	0,0%	0,00	828,38	0,00%
8.1.2	ELETRODUTOS					6.932,19	R\$ 0,00
8.1.2.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	255,9	0,0	0,0%	0,00	3.004,26	0,00%
8.1.2.2	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	13,0	0,0	0,0%	0,00	323,70	
8.1.2.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	4,0	0,0	0,0%	0,00	126,08	
8.1.2.4	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	37,4	0,0	0,0%	0,00	1.630,64	
8.1.2.5	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	152,94	0,0	0,0%	0,00	1.847,51	
8.1.3	CABOS E FIOS (CONDUTORES)					8.749,24	R\$ 0,00
8.1.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	1.219,4	0,0	0,0%	0,00	4.328,87	0,00%
8.1.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	58,3	0,0	0,0%	0,00	334,05	
8.1.3.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	183,1	0,0	0,0%	0,00	2.352,83	
8.1.3.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	187,0	0,0	0,0%	0,00	1.733,49	
8.1.4	CAIXAS DE PASSAGEM					3.711,62	R\$ 0,00

8.1.4.1	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	46,0	0,0	0,0%	0,00	475,18	
8.1.4.2	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	27,0	0,0	0,0%	0,00	223,56	
8.1.4.3	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	32,0	0,0	0,0%	0,00	741,44	
8.1.4.4	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	3,0	0,0	0,0%	0,00	79,65	
8.1.4.5	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	3,0	0,0	0,0%	0,00	74,73	
8.1.4.6	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	3,0	0,0	0,0%	0,00	86,19	
8.1.4.7	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	9,0	0,0	0,0%	0,00	224,01	
8.1.4.8	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)	1,0	0,0	0,0%	0,00	34,20	
8.1.4.9	CAIXA DE PASSAGEM PISO COM TAMPA APARAFUSADA 100X100X60MM - ADAP SBC(61427_0321)	1,0	0,0	0,0%	0,00	82,63	
8.1.4.10	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	6,0	0,0	0,0%	0,00	1.408,26	
8.1.4.11	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	4,0	0,0	0,0%	0,00	17,80	
8.1.4.12	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	4,0	0,0	0,0%	0,00	97,68	
8.1.4.13	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	2,0	0,0	0,0%	0,00	22,22	
8.1.4.14	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	5,0	0,0	0,0%	0,00	40,95	
8.1.4.15	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	4,0	0,0	0,0%	0,00	103,12	
8.1.5	DISJUNTORES					1.348,92	R\$ 0,00
8.1.5.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	19,0	0,0	0,0%	0,00	201,21	0,00%
8.1.5.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,0	0,0	0,0%	0,00	11,13	
8.1.5.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	4,0	0,0	0,0%	0,00	48,80	
8.1.5.4	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,0	0,0	0,0%	0,00	87,88	
8.1.5.5	ADAP ORSE (7996) - DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A	2,0	0,0	0,0%	0,00	286,14	
8.1.5.6	ADAP ORSE (9041) - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO DPS 90kA - 275v	4,0	0,0	0,0%	0,00	713,76	
8.1.6	LEITOS					1.426,48	R\$ 0,00
8.1.6.1	SUORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE	26,8	0,0	0,0%	0,00	426,38	
8.1.6.2	ADAP ORSE (762) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 x 50 x 3000 mm	26,8	0,0	0,0%	0,00	999,10	
8.2	ILUMINAÇÃO E TOMADAS					16.481,48	R\$ 0,00
8.2.1	LUMINÁRIAS					12.353,18	R\$ 0,00
8.2.1.1	ADAP SINAPI (97605) - PAINEL LED 60X60 48W	46,0	0,0	0,0%	0,00	11.698,26	0,00%
8.2.1.2	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	8,0	0,0	0,0%	0,00	561,52	
8.2.1.3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	4,0	0,0	0,0%	0,00	93,40	
8.2.2	INTERRUPTORES					454,68	R\$ 0,00

G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA
CNPJ: 09.145.367/0001-78

8.2.2.1	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	8,0	0,0	0,0%	0,00	312,16	
8.2.2.2	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	4,0	0,0	0,0%	0,00	142,52	
8.2.3	TOMADAS					3.673,62	R\$ 0,00 0,00%
8.2.3.1	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	6,0	0,0	0,0%	0,00	212,64	
8.2.3.2	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	8,0	0,0	0,0%	0,00	298,00	
8.2.3.3	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	5,0	0,0	0,0%	0,00	119,00	
8.2.3.4	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	24,0	0,0	0,0%	0,00	913,68	
8.2.3.5	ADAP ORSE (780) - TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, PISO, PLACA EM METAL E CAIXA PVC	27,0	0,0	0,0%	0,00	2.130,30	
8.3	ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS					1.371,76	R\$ 0,00 0,00%
8.3.1	CABOS DE DESCIDA E MALHA DE ATERRAMENTO					1.180,03	R\$ 0,00 0,00%
8.3.1.1	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	7,7	0,0	0,0%	0,00	224,99	
8.3.1.2	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	9,6	0,0	0,0%	0,00	445,72	
8.3.1.3	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	2,0	0,0	0,0%	0,00	82,16	
8.3.1.4	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	4,0	0,0	0,0%	0,00	427,16	
8.3.2	ELETRODUTO DE TERRA					191,73	R\$ 0,00 0,00%
8.3.2.1	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	7,7	0,0	0,0%	0,00	191,73	
9	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS/LÓGICA /CFTV					53.445,35	R\$ 0,00 0,00%
9.1	SERVIÇOS E MATERIAIS					44.538,40	R\$ 0,00 0,00%
9.1.1	ABERTURA MANUAL VALA DE DUTOS SOLO 1a CATEGORIA 60X50X100CM	27,0	0,0	0,0%	0,00	808,11	
9.1.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	1,1	0,0	0,0%	0,00	52,23	
9.1.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	38,0	0,0	0,0%	0,00	2.212,36	
9.1.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	35,0	0,0	0,0%	0,00	536,20	
9.1.5	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	40,67	0,0	0,0%	0,00	1.187,97	
9.1.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	4,0	0,0	0,0%	0,00	90,60	
9.1.7	ADAP SBC (61551) - ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1"	7,0	0,0	0,0%	0,00	190,12	
9.1.8	ADAP SBC (61553) - ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 2"	2,0	0,0	0,0%	0,00	228,66	
9.1.9	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	1,0	0,0	0,0%	0,00	455,80	
9.1.10	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	1.920,0	0,0	0,0%	0,00	4.819,20	
9.1.11	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	3,0	0,0	0,0%	0,00	2.069,43	
9.1.12	ADAP ORSE (10727) - Fornecimento e instalação de voice panel 24 portas cat 6	1,0	0,0	0,0%	0,00	253,89	
9.1.13	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	66,0	0,0	0,0%	0,00	2.567,40	



G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA
CNPJ: 09.145.367/0001-78

9.1.14	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	55,0	0,0	0,0%	0,00	1.881,00	
9.1.15	CRIMPAGEM, CERTIFICACAO E IDENTIFICACAO DOS CABOS UTP	132,0	0,0	0,0%	0,00	4.561,92	
9.1.16	ADAP ORSE (11230) - Fornecimento e instalação de patch cords cat 6 c/1,50m - Rev 01	110,0	0,0	0,0%	0,00	3.418,80	
9.1.17	ADAP ORSE (10268) - Fornecimento e instalação de patch cords cat 6 c/2,50m - Rev 02	66,0	0,0	0,0%	0,00	2.263,14	
9.1.18	ADAP SBC (59448) - GUIA DE CABOS 1U PADRAO 19"	8,0	0,0	0,0%	0,00	220,80	
9.1.19	ADAP SBC (59448) - GUIA DE CABOS 2U PADRAO 19"	1,0	0,0	0,0%	0,00	27,10	
9.1.20	ADAP SETOP (CAB-RACK-025) - TAMPA CEGA DE 1U PARA RACK 19"	5,0	0,0	0,0%	0,00	45,30	
9.1.21	ADAP ORSE (11417) - Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade	1,0	0,0	0,0%	0,00	126,51	
9.1.22	ADAP AGETOP CIVIL (072291) - REGUA COM 8 TOMADAS	1,0	0,0	0,0%	0,00	38,10	
9.1.23	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSA, DIMENSOES 200 X 200 X *100* MM - ADAP SBC (61446)	1,0	0,0	0,0%	0,00	110,77	
9.1.24	CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	130,0	0,0	0,0%	0,00	2.121,60	
9.1.25	LANCAMENTO DE CABO FAST-CIT 50X20 DE 20 PARES - ADAP SINAPI (98401)	15,0	0,0	0,0%	0,00	235,95	
9.1.26	COTAÇÃO - INSTALAÇÃO DE BASTIDORES PARA 5 BLOCOS M10A OU M10B	4,0	0,0	0,0%	0,00	57,08	
9.1.27	ADAP SBC 59622 -ENGATE RAPIDO CONEXAO M10 PARA TELEFONIA	8,0	0,0	0,0%	0,00	314,16	
9.1.28	MODULO PROTETOR	40,0	0,0	0,0%	0,00	2.100,80	
9.1.29	INSTALAÇÃO DE BARRA DE ATERRAMENTO MPEI	4,0	0,0	0,0%	0,00	91,88	
9.1.30	CABO TELEFONICO JUMPER FDG 500M	1,0	0,0	0,0%	0,00	193,27	
9.1.31	CRIMPAGEM EM CABO TELEFONICO CONEXAO IDC	200,0	0,0	0,0%	0,00	1.164,00	
9.1.32	CAIXA DE PASSAGEM N 3, DE SOBREPOR, PADRAO TELEBRAS , 40x40x12cm - ADAP SINAPI (100557)	1,0	0,0	0,0%	0,00	166,80	
9.1.33	CONECTOR OPTICO SIMPLEX SM-9 SC-APC	6,0	0,0	0,0%	0,00	54,48	
9.1.34	EXTENSAO OPTICA CONECTORIZADA 02F MM (50.0) OM3 10GIGABIT 1.5M	6,0	0,0	0,0%	0,00	471,60	
9.1.35	ADAP ORSE (8690) - Cabo de fibra ótica de 6 vias	130,0	0,0	0,0%	0,00	2.161,90	
9.1.36	SERVICOS DE FUSAO EM FIBRA OPTICA SM E MM	12,0	0,0	0,0%	0,00	1.602,12	
9.1.37	CORDAO OPTICO DUPLEX SINGLE MODE 2,5m SC/SC UPC	3,0	0,0	0,0%	0,00	275,34	
9.1.38	IDENTIFICAÇÃO DE CABO OPTICO EM PLAQUETAS	7,0	0,0	0,0%	0,00	8,47	
9.1.39	CERTIFICACAO DE CABEAMENTO DE FIBRA OPTICA NIVEL 1	6,0	0,0	0,0%	0,00	129,00	
9.1.40	SERVIÇO DE TREINAMENTO HANDS ON PARA SWITCH	1,0	0,0	0,0%	0,00	1.152,26	
9.1.41	ADAP ORSE 8684 - Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	101,2	0,0	0,0%	0,00	4.072,28	
9.2	MATERIAL PERMANENTE					8.906,95	R\$ 0,00 0,00%

9.2.1	DISTRIBUIDO INTERNO OPTICO (DIO) PARA 06 FIBRAS	1,0	0,0	0,0%	0,00	168,39	
9.2.2	ADAP CPOS (66.08.115) - Rack fechado de piso padrão metálico, 19 x 44 Us x 770 mm	1,0	0,0	0,0%	0,00	1.975,03	
9.2.3	ADAP ORSE (12791) - Fornecimento e instalação de Switch 24 portas Gerenciável POE 10/100 /1000 + 4SFP	1,0	0,0	0,0%	0,00	2.428,01	
9.2.4	ADAP ORSE (12791) - Fornecimento e instalação de Switch 48 portas	1,0	0,0	0,0%	0,00	3.075,83	
9.2.5	CONVERSOR DE MÍDIA MONOMODO	1,0	0,0	0,0%	0,00	265,13	
9.2.6	NOBREAK 1800VA BIVOLT	1,0	0,0	0,0%	0,00	994,56	
10	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO					947,45	R\$ 0,00
10.1	EXTINTORES					638,20	R\$ 0,00
10.1.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG. CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	2,0	0,0	0,0%	0,00	638,20	0,00%
10.2	DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO					309,25	R\$ 0,00
10.2.1	ILUMINAÇÃO/PLACA DE EMERGÊNCIA					309,25	R\$ 0,00
10.2.1.1	(ADAP ORSE 12888) - Placa de sinalização, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Extintor de incêndio portátil" - Placa E5	2,0	0,0	0,0%	0,00	27,10	0,00%
10.2.1.2	(ADAP ORSE 12884) - Placa de sinalização, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência - Placa S2	15,0	0,0	0,0%	0,00	282,15	0,00%
11	ALVENARIAS E PAINÉIS DE FECHAMENTO					6.932,17	R\$ 0,00
11.1	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO					6.568,98	R\$ 0,00
11.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	91,49	0,0	0,0%	0,00	6.568,98	0,00%
11.2	ENCUNHAMENTO					363,19	R\$ 0,00
11.2.1	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016	27,37	0,0	0,0%	0,00	363,19	0,00%
12	DIVISÓRIAS					24.380,20	R\$ 0,00
12.1	DIVISÓRIA DE GRANITO					8.265,59	R\$ 0,00
12.1.1	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	12,4	0,0	0,0%	0,00	8.265,59	0,00%
12.2	DIVISÓRIA DE MADEIRA					16.114,61	R\$ 0,00
12.2.1	(Cópia do SBC 090054) - DIVISORIA PAINEL/VIDRO-PAINEL C/ MSO/COMEIA E=35MM COLOCADA	68,02	0,0	0,0%	0,00	10.868,23	0,00%
12.2.2	DIVISORIA (N3) - PAINEL/VIDRO/PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ACO GALVANIZADO PINTADO. AF_01/2021	68,02	0,0	0,0%	0,00	5.246,38	0,00%
13	REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS					66.221,44	R\$ 0,00
13.1	REVESTIMENTOS DE FORRO					46.179,81	R\$ 0,00
13.1.1	ADAP SINAPI 96115) - FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	233,81	0,0	0,0%	0,00	46.179,81	0,00%
13.2	CHAPISCO					1.476,64	R\$ 0,00
13.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1.3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	182,98	0,0	0,0%	0,00	1.476,64	0,00%
13.3	EMBOÇO					6.109,70	R\$ 0,00
13.3.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1.2-8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO	182,98	0,0	0,0%	0,00	6.109,70	0,00%
13.4	REVESTIMENTO DE PAREDE					12.455,29	R\$ 0,00
13.4.1	(ADAP AGETOP 200503) - REVESTIMENTO C/LITOCERAMICA PARA PAREDES	107,01	0,0	0,0%	0,00	6.077,09	0,00%
13.4.2	(ADAP ORSE 11808) - Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, linha pietra di firenze, grigio, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização	67,81	0,0	0,0%	0,00	6.378,20	0,00%
14	PISO/SOLEIRAS/RODAPÉS/DEGRAUS					66.880,83	R\$ 0,00

14.1	CONTRAPISOS E REVESTIMENTOS					14.051,61	R\$ 0,00
14.1.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO	233,3	0,0	0,0%	0,00	8.216,82	0,00%
14.1.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	1,8	0,0	0,0%	0,00	138,43	
14.1.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE, E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE	143,63	0,0	0,0%	0,00	5.696,36	
14.2	PISOS					52.829,22	R\$ 0,00
14.2.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	233,3	0,0	0,0%	0,00	36.212,82	0,00%
14.2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	172,37	0,0	0,0%	0,00	10.993,75	
14.2.3	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	132,36	0,0	0,0%	0,00	5.622,65	
15	ESQUADRIAS/FERRAGENS/ARMÁRIOS EMBUTIDOS					30.527,58	R\$ 0,00
15.1	VEGAS E CONTRAVERGAS					4.118,04	R\$ 0,00
15.1.1	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	36,2	0,0	0,0%	0,00	1.788,64	0,00%
15.1.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	3,0	0,0	0,0%	0,00	116,46	
15.1.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	4,8	0,0	0,0%	0,00	233,37	
15.1.4	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	7,3	0,0	0,0%	0,00	212,50	
15.1.5	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	3,0	0,0	0,0%	0,00	114,18	
15.1.6	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	36,2	0,0	0,0%	0,00	1.652,89	
15.2	PORTAS E JANELAS DE FERRO					1.366,65	R\$ 0,00
15.2.1	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	3,15	0,0	0,0%	0,00	1.333,77	0,00%
15.2.2	PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018	3,15	0,0	0,0%	0,00	32,88	
15.3	PORTAS E JANELAS DE ALUMÍNIO					8.215,09	R\$ 0,00
15.3.1	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	0,9	0,0	0,0%	0,00	406,19	0,00%
15.3.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E	34,1	0,0	0,0%	0,00	7.808,90	
15.4	PORTAS E JANELAS DE MADEIRA					8.838,23	R\$ 0,00
15.4.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA	1,0	0,0	0,0%	0,00	776,38	0,00%
15.4.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA	3,0	0,0	0,0%	0,00	2.227,83	
15.4.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA	2,0	0,0	0,0%	0,00	1.642,82	
15.4.4	(ADAP SBC 110236) - PORTA DE MADEIRA 1 FL. M.80X2,10M - P/DIVISÓRIA C/FERRAGENS	4,0	0,0	0,0%	0,00	3.945,64	
15.4.5	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	14,91	0,0	0,0%	0,00	245,56	
15.5	PORTAS E JANELAS DE VIDRO TEMPERADO					7.989,57	R\$ 0,00
15.5.1	PORTA DE VIDRO TEMPERADO - ACESSO					6.093,10	R\$ 0,00
15.5.1.1	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	2,0	0,0	0,0%	0,00	6.093,10	0,00%
15.5.2	PORTA DE VIDRO TEMPERADO - BANHEIRO					1.896,47	R\$ 0,00
15.5.2.1	(ADAP SBC 150190) - PORTA EM VIDRO TEMPERADO JATEADO 10 MM COM FERRAGENS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4,68	0,0	0,0%	0,00	1.896,47	0,00%

G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA
CNPJ: 09.145.367/0001-78

16	BANCADA / LOUÇAS / PIAS / TANQUES / METAIS E ACESSÓRIOS					7.362,36	R\$ 0,00
16.1	LOUÇAS					4.539,95	R\$ 0,00
16.1.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	5,0	0,0	0,0%	0,00	1.778,45	0,00%
16.1.2	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1,0	0,0	0,0%	0,00	355,53	
16.1.3	(ADAP ORSE 7712) - Cuba de semi-encaixe, dim. 49 x 40cm, INCEPA, linha ocean pacific, ref. 63027 ou similar, inclusive sifão e válvula	3,0	0,0	0,0%	0,00	2.405,97	
16.2	BANCADAS					803,24	R\$ 0,00
16.2.1	(ADAP SBC 190181) BANCADA/TAMPO SECO EM GRANITO BRANCO ITAUNAS 3 CM	2,272	0,0	0,0%	0,00	803,24	0,00%
16.3	METAIS E ACESSÓRIOS					2.019,17	R\$ 0,00
16.3.1	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	4,0	0,0	0,0%	0,00	419,52	0,00%
16.3.2	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	4,0	0,0	0,0%	0,00	31,88	
16.3.3	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	5,0	0,0	0,0%	0,00	136,65	
16.3.4	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	5,0	0,0	0,0%	0,00	242,70	
16.3.5	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	4,0	0,0	0,0%	0,00	190,32	
16.3.6	(ADAP ORSE 9502) - Ducha higiênica com registro, linha Link, ref. 1984.C.ACT. LNK, da DECA ou similar	5,0	0,0	0,0%	0,00	998,10	
17	PINTURAS (PISOS, PAREDES E TETOS)					7.786,11	R\$ 0,00
17.1	PAREDES					7.786,11	R\$ 0,00
17.1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	479,99	0,0	0,0%	0,00	1.161,57	0,00%
17.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	273,93	0,0	0,0%	0,00	3.550,13	
17.1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	206,06	0,0	0,0%	0,00	3.074,41	
18	URBANIZAÇÃO/CERCAMENTO					11.202,11	R\$ 0,00
18.1	VEGETAÇÃO					11.202,11	R\$ 0,00
18.1.1	GRAMA					4.479,77	R\$ 0,00
18.1.1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	317,49	0,0	0,0%	0,00	958,81	0,00%
18.1.1.2	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	317,49	0,0	0,0%	0,00	3.520,96	
18.1.2	ÁRVORES					6.722,34	R\$ 0,00
18.1.2.1	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	15,0	0,0	0,0%	0,00	5.058,30	0,00%
18.1.2.2	(ADAP SINAPI 985100) - PLANTIO DE AGAVE DRAGÃO ATTENUATA	28,0	0,0	0,0%	0,00	1.664,04	
19	LIMPEZAS					729,93	R\$ 0,00
19.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	403,281	0,0	0,0%	0,00	729,93	0,00%

Valor Executado


Valor Executado
Acumulado
Saldo Total

R\$
11.631,87
R\$
37.559,89
397.755,93

POLIANNE KARINE SOARES
SANTANA

Assinado de forma digital por
POLIANNE KARINE SOARES
SANTANA:05160252444
Dados: 2022.12.09 08:53:14 -03'00'

Polianne Soares
Sócia / Engenheira Civil
CREA



2016 - TR 0121



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00000072
Data e Hora de Emissão
09/03/2023 15:56:10
Código de Verificação
3ANM-7B9P

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.145.367/0001-78** Inscrição Municipal: **751.120-5**
Nome/Razão Social: **G2 CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA**
Endereço: **RUA VISCONDE DE JEQUITINHONHA 3732, LOJA 0002 LOJA 0002 - BOA VIAGEM - CEP: 51130-020**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **g2servi@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO**
CPF/CNPJ: **31.543.958/0001-52** Inscrição Municipal: **743.691-2**
Endereço: **AV PROF LUIZ FREIRE 198 - CURADO - CEP: 50740-437**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADEQUACAO DO PAVILHAO MULTIUSO DO COMANDO DA 7ª REGIAO (7ª RM) DESTINADO A INSTALACAO DA DIVISAO DE AQUISICOES, LICITACOES E CONTRATOS (DIVALC). EMPENHO 2022NE002016. 4º MEDIÇÃO

-----VALOR DE RETENÇÃO PARA INSS:R\$ 3.327,21-----
BASE DE CALCULO INSS : 50 % MÃO DE OBRA+ 50% MATERIAIS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 60.494,87

Código da Atividade Prestada
4321500 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanag...

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	60.494,87	5,00%	3.024,74	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através da Guia de NFS-e.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00000070, emitida em 02/03/2023.
- CEI / Código da Obra: CO7REGDIVALC

SERVIÇO PRESTADO

EM: 10 / 03 / 2023

No Município de : RECIFE / PE

POSTO/GRAD: 3º Sgt

NOME DE GUERRA: JAQUELINE CEZARIO

ASSINATURA: Jaqueline Cezario
Responsável pela Fiscalização do Serviço

DECLARAÇÃO

Declaro que os serviços constantes deste título de crédito foram prestados.

Assinatura: 

NIDIVAL FROTA BITENCOURT - Maj

Fiscal Administrativo – Base Adm Curado

CPF: _____

RG: _____


BASE ADM CURADO

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

AUTORIZO O PAGAMENTO

NÃO AUTORIZO O PAGAMENTO

EM 14 / 09 / 23


Felipe Giasfer de Maia Chagas - C
Ordenador de Despesas

202303800695



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
C M NE - 7ª RM / 7ª DE
BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO

PAGAMENTO DE FATURA

Para efeito de pagamento, informo-vos o seguinte:

1. DADOS DA OBRA

a) PLANO: 2022 OBRA: DIVALC OM : Base Adm Curado

b) DISCRIMINAÇÃO: Serviços De Adequação Do Pavilhão Multiuso Do Comando Da 7ª Região Militar – Divisão De Aquisições, Licitações E Contratos (Divalc)

Contrato: nº 04/2021.

2. DADOS DO PAGAMENTO

a) FIRMA INTERESSADA: G2 Construção e Manutenção Industrial LTDA

b) VALOR CONTRATADO: R\$ 435.315,82 – Contrato 04/2021 - 4ª Medição

c) EMPENHO Nº 2022NE2016 DATA 14/12/2022

d) VALOR EMPENHADO: R\$ 435.315,82

e) NOTA FISCAL No 00000072 DATA DA EMISSÃO: 09/03/2023

f) VALOR: R\$ 60.494,87 (dezesete mil, seiscientos e quarenta e oito reais e oitenta e nove centavos).

3. DADOS BANCÁRIOS

BANCO: Banco do Brasil AGÊNCIA: 1245-9 C/C.: 44116-3

VALOR DA ETAPA:	ACUMULADO:	SALDO:
R\$ 60.494,87	R\$ 115.703,66	R\$ 319.612,16

10 de março de 2023

Jaqueline dos Santos Cezar
JAQUELINE DOS SANTOS CEZARIO – 3º SGT STT
Fiscal Técnico do contrato da Base Administrativa do Curado

14 de março de 2023

Nival Frota Bitencourt
NIDIVAL FROTA BITENCOURT – Maj
Chefe da Fiscalização Administrativa da Base Administrativa do curado

Autorizo o pagamento:

___ de ___ de 2023

FELIPE GLASNER DE MAIA CHAGAS – CEL
Ordenador de Despesas e Comandante da Base Administrativa do Curado
